


PROCES-VERBAAL BEZOEK VAN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE LAAGSPANNING

ORIGINEEL EXEMPLAAR

REF. 64/2019/80573/01:1

DATUM VAN CONTROLE 02/12/2019 AGENT Ken Cools
ADRES VAN CONTROLE Terheydenlaan 3 - 3150 Haacht TYPE CONTROLE Periodieke keuring (Art. 271)



> ALGEMENE GEGEVENS

Adres van de installatie Terheydenlaan 3 - 3150 Haacht
Type van lokalen Wooneenheid (huis)
Eigenaar Geens
Verantwoordelijke voor de werken niet gecommuniceerd



> GEGEVENS VAN DE AANSLUITING

Distributienetbeheerder (DNB) IVERLEK
EAN code niet gecommuniceerd
Nummer teller 21380153
Meterstand dag/nacht 053060,2/
Type verbinding ondergronds
Voedingskabel hoofdbord XVB 4 x 10 mm²
Nominale spanning 230V - AC
Nominale stroomsterkte van de bescherming (van de aansluiting) 40A

> CONTROLE

Conformiteit eendraadschema's en situatieschema's OK | Aantal verdeelborden 3 | Aantal stroombanen 15

Beschrijving elektrische borden, zie bijgevoegd plan

Aarding	Staven	Hoofd differentieelstroominrichting	ID - 40A - 300mA - type A - test OK
Aardingsweerstand (Ω)	15,3	Differentieelstroominrichting vochtige ruimtes	ID - 40A - 30mA - type A - test OK
Gelijkvormigheid v/d equipotentiaal en de PE	OK	Dispositief differentieel apparaat	ID - 40A - 30mA - type A - test OK
Aardingscontinuïteit	Besluitende	Dispositief differentieel	300mA 40A 2p 2x
Foutlus controle	Afdoende	Aansluiting	OK
Bescherming tegen onrechtstreekse aanraking	OK	Verlichting/toestellen	OK
		Visuele inspectie v/ vaste &/ mobiele apparaten	OK
		Bescherming tegen rechtstreekse aanraking	OK
		Minimum gemeten isolatieweerstand ($M\Omega$)	23

BESLUIT : CONFORM 

Op de datum 02/12/2019, elektrische installatie Terheydenlaan 3 - 3150 Haacht is conform bij het algemene reglement op Elektrische installaties. De controle uitgevoerd door Certinergie is gebaseerd op de zichtbare en normaal toegankbare delen van de installatie. Een verloding stroomopwaarts en stroomafwaarts de differentieelstroominrichting werd geplaatst zodat de klemmen onbereikbaar zijn. Eén of meerdere eendraadschema's / situatieschema's zijn gecontroleerd geweest en zijn conform met de installatie. Zonder belangrijke wijzigingen van de elektrische installatie moet de volgende controle voor 02/12/2044 gebeuren.

Handtekening agent

PROCES-VERBAAL BEZOEK VAN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE LAAGSPANNING

ORIGINEEL EXEMPLAAR

REF. 64/2019/80573/01:1

› Plichten van de Eigenaar, Beheerder of Huurder van Huishoudelijke Installaties :

Het is verplicht het conformiteits- of keuringsverslag te bewaren in het dossier van de elektrische installatie, de wijzigingen aan de elektrische installatie in het dossier aan te brengen, in geval van personenongeval te wijten aan de elektriciteit moet de Federale Overheidsdienst Energie in zijn hoedanigheid worden ingelicht, het nodige onderhoud te doen of laten doen van de installatie, te voorzien dat de installatie te allen tijde conform blijft, een nieuwe controleonderzoek te laten uitvoeren in geval van inbreuk(en) binnen het jaar en door hetzelfde organisme bij een controlebezoek. In het geval dat na een tweede bezoek de inbreuken of een deel ervan standhouden moet het erkend organisme een afschrift van het keuringsverslag versturen naar de Algemene Directie van Energie die toezicht houdt op de huishoudelijke installaties. De Federale Overheidsdienst Energie in zijn hoedanigheid wordt door het erkend organisme ingelicht als blijkt dat er geen gevolg werd gegeven aan de vastgestelde inbreuken om de installatie in orde te brengen.

Samengevat, welke acties dienen er genomen te worden indien de elektrische installatie conform is?

1	2	3	4
Lees nadrukkelijk dit proces-verbaal	In het geval van uitbreidingen, belangrijke veranderingen aan de installatie, laat de installatie opnieuw controleren	Als het geldigheidstermijn van het rapport is verstreken, laat de installatie opnieuw controleren	Certinergie is tot uw dienst 0800 82 171



PROCES-VERBAAL BEZOEK VAN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE LAAGSPANNING

ORIGINEEL EXEMPLAAR

REF. 64/2019/80573/01:1

BIJLAGEN

Eendraadschema(s) van de installatie

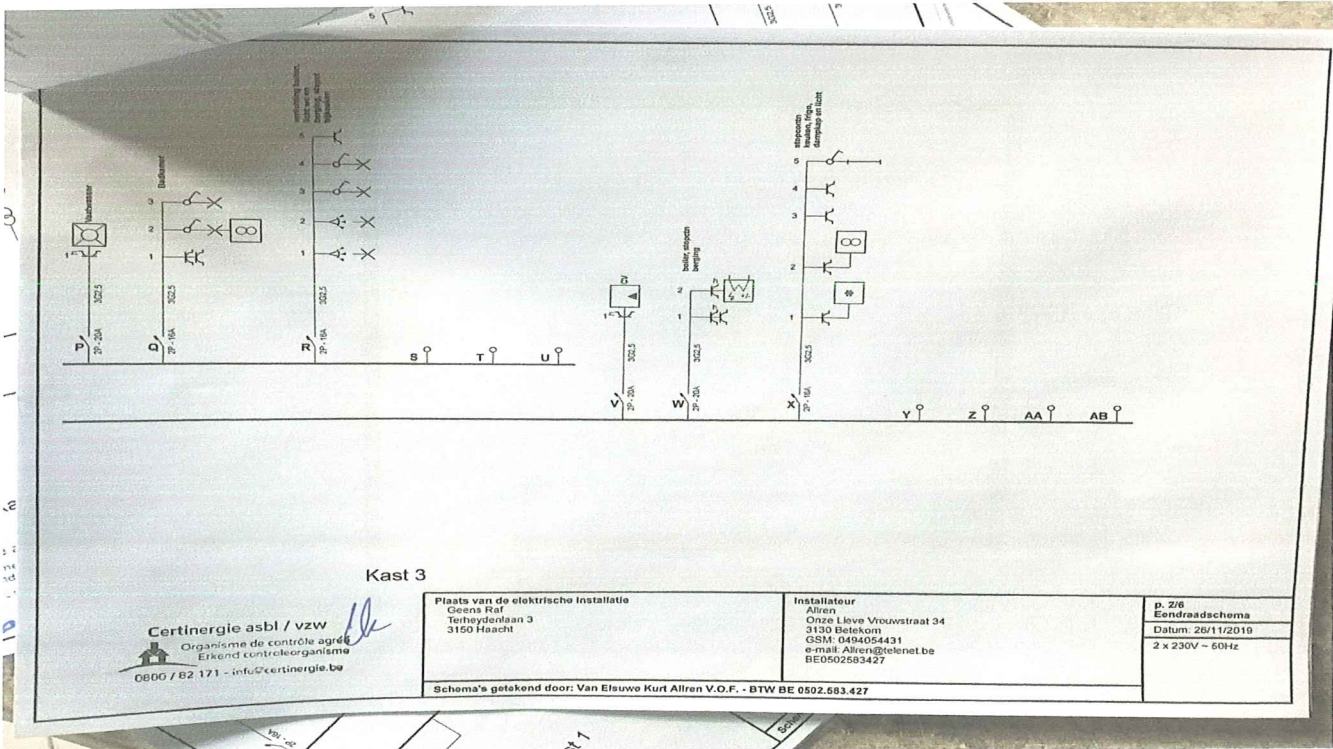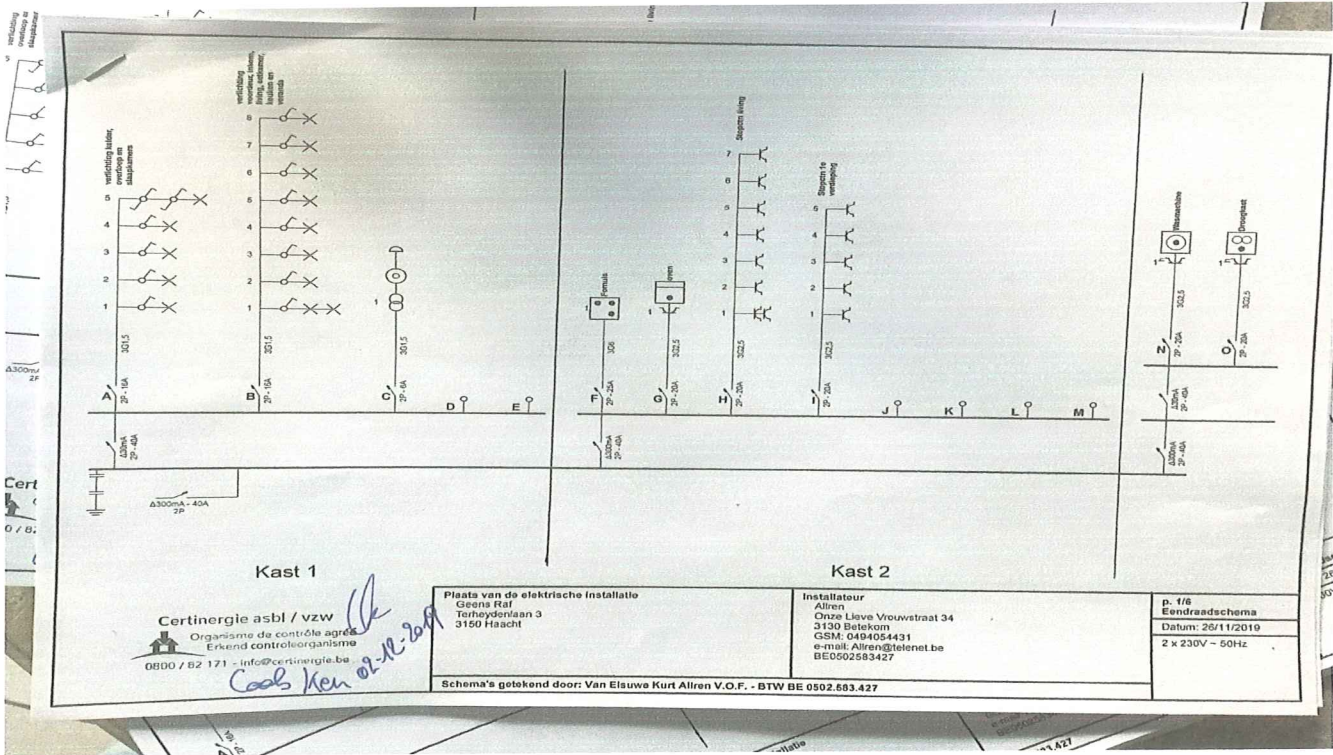



PROCES-VERBAAL BEZOEK VAN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE LAAGSPANNING

ORIGINEEL EXEMPLAAR

REF. 64/2019/80573/01:1

BIJLAGEN

Situatieschema van de installatie

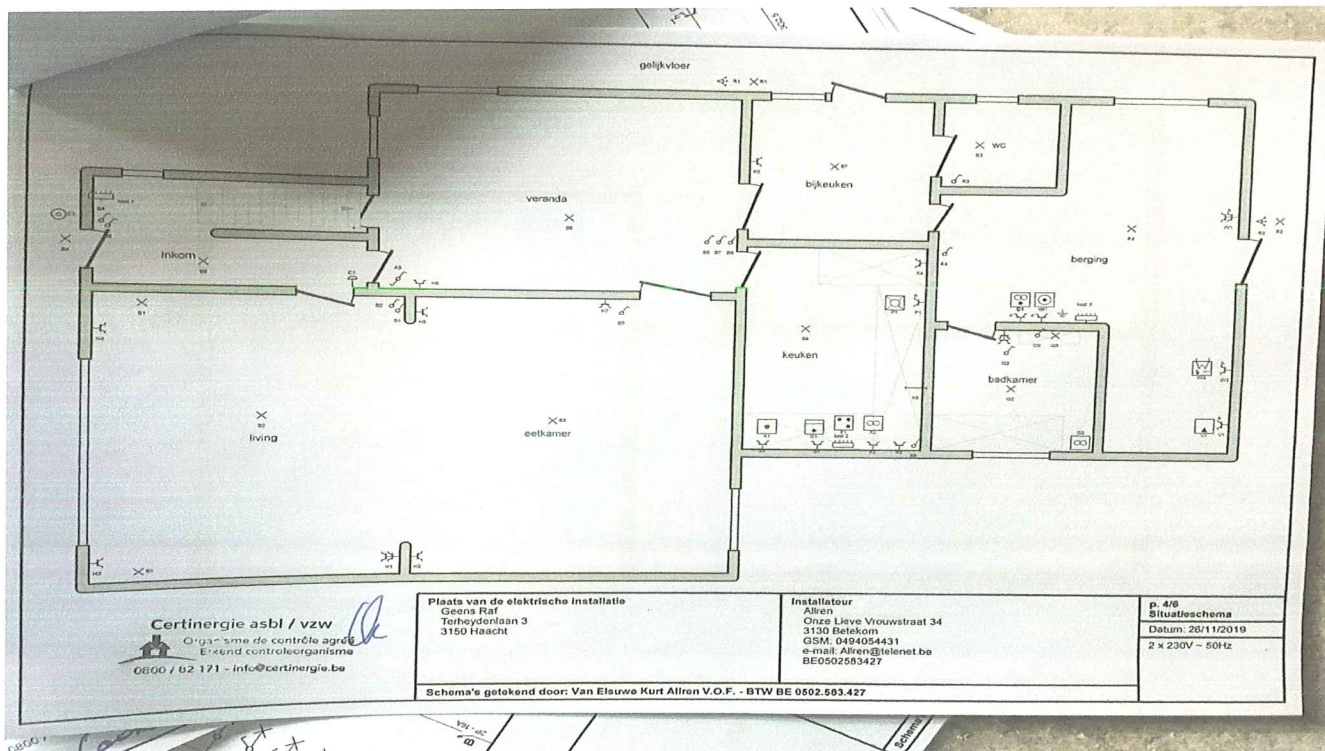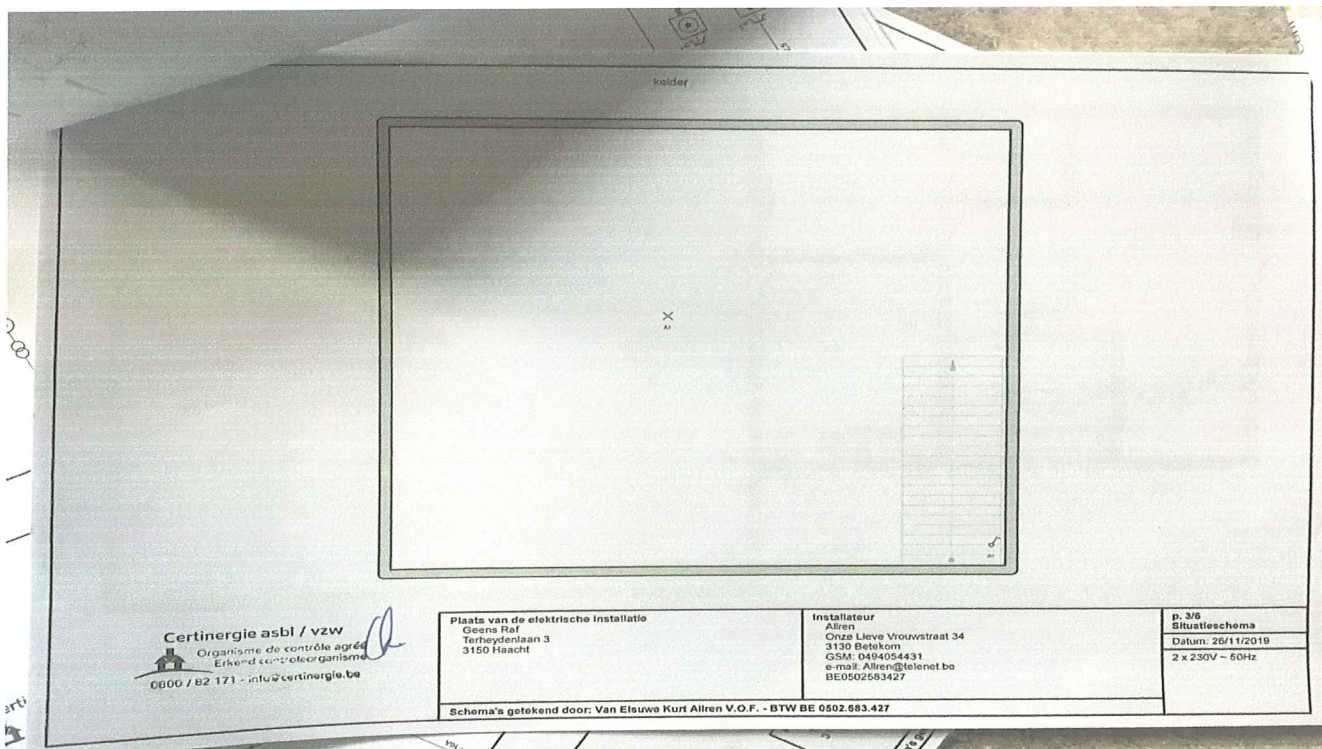


PROCES-VERBAAL BEZOEK VAN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE LAAGSPANNING

ORIGINEEL EXEMPLAAR

REF. 64/2019/80573/01:1

BIJLAGEN

Situatieschema van de installatie

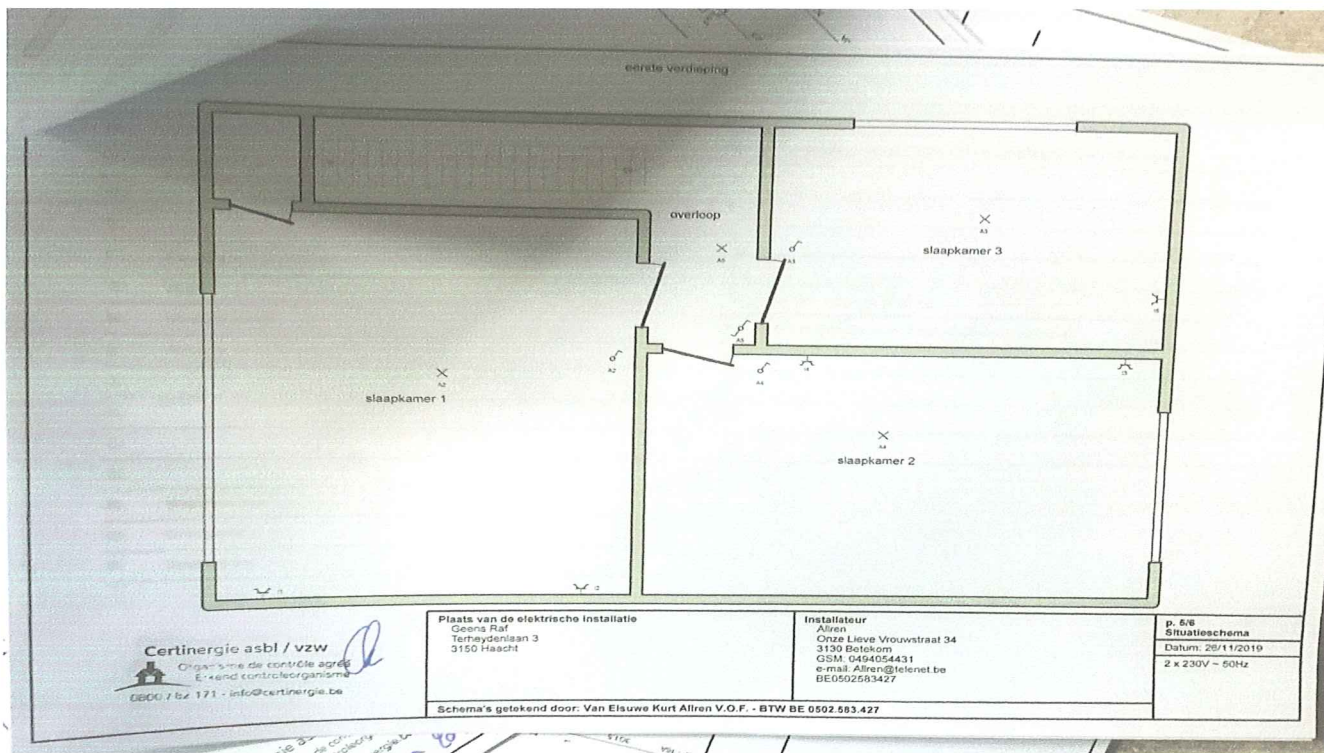

Elementaire situatieschetsen en samenvattende beschrijving van de borden

op basis van wat zichtbaar en toegankelijk is tijdens de inspectie.
Opmerking: Deze schetsen vervangen de ééndraadschema's niet alsook niet het situatieschema

A: verlichting kelder, overloop en slaapkamers	Q: Badkamer
B: verlichting voordeur, inkom, living, eetkamer, keuken en veranda	R: verlichting buiten, licht wc en berging, stopct bijkeuken
C:	S:
D:	T:
E:	U:
F: Fornuis	V: cv
G: oven	W: boiler, stopctn berging
H: Stopctn living	X: stopctn keuken, frigo, dampkap en licht
I: Stopctn 1e verdieping	Y:
J:	Z:
K:	AA:
L:	AB:
M:	
N: Wasmachine	
O: Droogkast	
P: Vaatwasser	

Certinergie asbl / vzw
Orga... de contrôle agréé
Erkend controleorganisme
0800 / b2 171 - info@certinergie.be

Plaats van de elektrische installatie
Geens Raf
Terheydenlaan 3
3150 Haacht

Installateur
Allren
Onze Lieve Vrouwstraat 34
3130 Belsikom
GSM: 0494054431
e-mail: Allren@telenet.be
BE0502583427

p. 6/6
Lijst Kringen
Datum: 28/11/2019
2 x 230V - 50Hz

Schema's getekend door: Van Elsuwe Kurt Allren V.O.F. - BTW BE 0502.583.427
