

Rapport nr.:

3058753

07/01/60/084

Elekt. Mij. Klant Nr.:

Teller nr.:

Stand I:

Stand II:

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



O.C.B.

Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN

~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

volgens: AREI art. 270 ~~AREI art. 271~~ / AREI art. 276 /

Aanvulling verslag nr.:

Aard installatie: Nieuwe / Uitbreiding / Wijziging / ~~Verloop~~ / Bestaande / ~~Verloop / Uitbreiding / Wijziging~~

Type der lokalen: APPARTEMENT (G.V.)

Plaats van onderzoek: PRINSEN BOS 7 1502 LONDEER

Eigendom van:

Opdrachtgever: Mme. VINCX YVES STEENWEG 213 9470 NAMURCEUR

Installateur: idem

BTW BE 0863 201 119 ID-kaart: Uitgereikt te: Datum:

Onderzoeker: JURGEN MOENS Datum van onderzoek: 16/01/2007

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V ~~1 x 230 V~~ ~~3 x 380 V~~ Max. Beveiliging: 2 x 25A Omschakelaar: stand:

Hoofdbeveiliging: Zek.: Schak.: 2/ 00A 60A 300 mA

Meter-bordverbinding: kabeltype: BETANUL aantal geleiders: 2 doorsnede: 4 mm²

Voedingsbekabeling: kabeltype: aantal geleiders: doorsnede: mm²

~~Bovengrondse en ondergrondse op bovengrondse net/bodemgrondse net~~ Wachtloos geplaatst/niet geplaatst Isolatieplaat aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode: Type: in/boren / pennen / ~~horizontale geleiders~~ Sectie: 16 mm² Spreidingswaarde: 18 Ω

Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen: 11 Algemene isolatieweerstand: 15 MΩ

Diff. schak.: algemene: 2/ 60A 300 mA (15k A) mA bijkomende: 2/ 60A 30 mA (15k A) (A.B.) mA

Beschrijving: zie schema's in bijlage

NOTA'S

Hoofdequipotentiale - ~~bijkomende~~ equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.

Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

INBREUKEN

GEEN

BESLUIT

De installatie is conform ~~niet conform~~ met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op: 16/01/2008, zoals voorzien door art. 271 van het AREI,

alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag ~~niet~~ in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde

~~inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.~~

vr. de directeur,
de onderzoeker

MOENS Jurgen
inspecteur OCB
Tel. Fax 02/269 07 07
GSM 0475/45 23 82

erkend controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be


BTW BE 0404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49

NOTA ONDERNEMINGEN: krachtens art. 838 1b v/h ARAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en verfraaiing der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.
NOTA HUURDERS, EIGENAARS: Krachten het AREI bent U verplicht:
1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te melden in het dossier;
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directe elektrische rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

03/005N/09/05/10D

Stroombanen A, B = bestaande installatie

Kelder
 A1

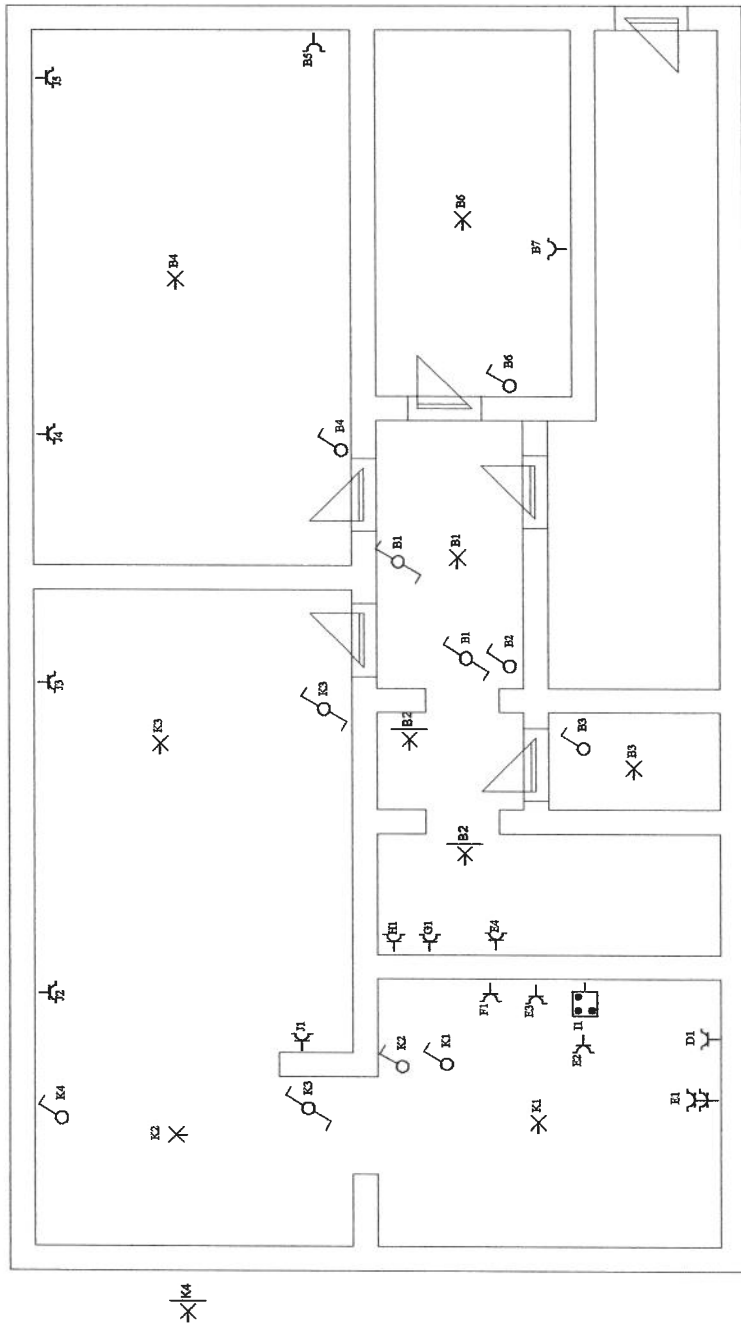


geijkvloers

Situatieschema / Schéma de situation

INSTALLATEUR		KEURING/CONTRÔLE		WERF/CHANTIER		2, 230V~
Naam/Nom BTW / TVA Datum/Date Handtek/Sign	Yves Vinck BE 863.201.119 15-01-2007	Organis. Naam/Nom Datum/Date Handtek/Sign	O.C.B. Moens Jurgien MOENS Jurgien Inspecteur OCB	Naam/Nom Straat/Rue Gemeen/Comm Handtek/Sign	Prinsbos 7 1502 Lembeek	FIX-O-CAD vynckier 02541

GECONTROLEERD 16 JAN 2007

Tel / Fax 021269 07 07
 GSM 0475/45 23 82

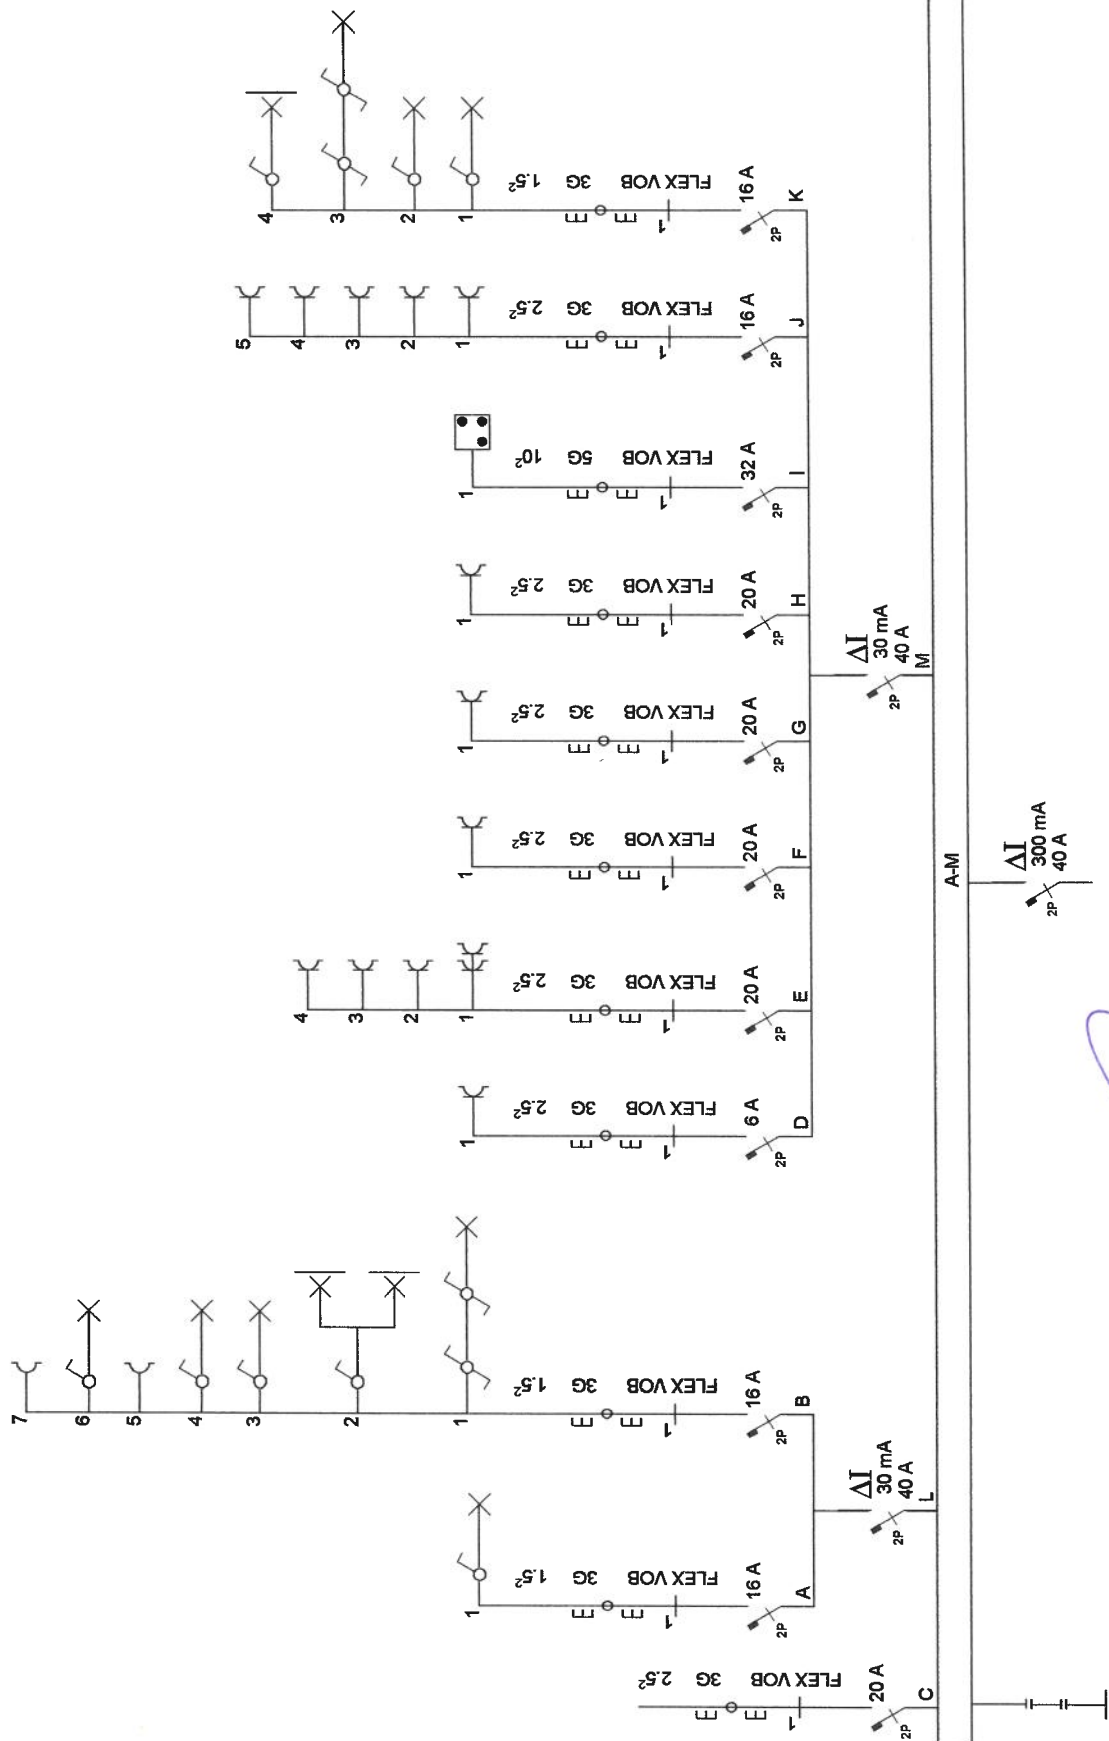

getijkvloers

Eendraadsschema/Schéma unifilaire

INSTALLATEUR

Naam/Nom Yves Vinck
BTW / TVA BE 863.201.119
Datum/Date 15-01-2007
Handtek/Sign

KEURING/CONTROLE

Organis O.C.B.
Naam/Nom Moens Jurgien
Datum/Date
Handtek/Sign
Inspecteur OCB
Tel/Fax 02/269.07.07
GSM 0475/45.23.82

WERF/CHANTIER

Naam/Nom
Straat/Rue Prinsbos 7
Gemeen/Comm 1502 Lembeek
Handtek/Sign

2, 230V~

FIX-O-CAD



vynckier

02541

GECONTROLEERD 16 JAN 2007
