



Brussel : 126, bus 12 – Oorlogskruisenlaan – 1120 Brussel
 Bergen : Parc Initialis – 2 – Avenue Descartes – 7000 Mons
 Luik : 61/63 – Rue Grand-Vinave – 4101 Jemeppe

Tel : 02/245.46.95 Fax : 02/215.12.78
 Tel : 065/32.15.51 Fax : 065/32.15.77
 Tel : 04/234.17.00 Fax : 04/234.17.80

Ba,irele,o,g : 340-0298168-28 B.T.W. BE 406.671.312

-VERTROUWELIJK-

CONTROLEVERSLAG VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNING EN ZEER LAGE SPANNING

INSTALLATIE

(Controle uitgevoerd volgens de interne procedure PRO-INS-E-10)

Verslag nr. 94/11-01-31-108

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk

Datum van onderzoek : 31-01-2011

Naam - Voornaam : CARINOL

Eigenaar Naam - Voornaam : IMACO SA

BTW nr. / R.K. nr. : BE 438007958

Adres : Rue Bana 105 loto

Adres installatie : DIESBEEKSTRAAT, 55

Bruxelles

1654 Huizingen

SOORT CONTROLE :

- A) Controle vóór het onder spanning zetten van een huishoudelijke LS en ZLS-installatie uitgevoerd op basis van de voorschriften van het AREI.
 B) Controlebezoek van een huishoudelijke LS en ZLS installatie voor verzwaring van het vermogen op het openbaar distributienet, uitgevoerd op basis van de voorschriften van het AREI.

INSTALLATIE :

☒ Wooneenheid ☐ Gemeenschappelijke delen ☐ Anderen : volgens het ☒ Art.86 ☐ Art.87 van het AREI.

Verdeler : Aansluiting volgens kablering van het bord : Spanning : 230 V.

Voeding van het hoofdbord : 4 X 16 mm². Beveiliging aansluiting : 63 A. (☐ In max. te voorzien)

Voedingskolom : X mm². Algemeen lastschakelaar : 63 A.

Aantal borden : 4 Aantal eindkringen : 54 R_E = 66 Ω R_{IGEN} = 15 MΩ.

Soort aarding : ☐ lus ☒ piketten -

Differentieel	I _n en A	I _{cc} en kA	I _Δ en A	Beschermde kringen	I _n en A	I _{cc} en kA	I _Δ en A	Beschermde kringen	I _n en A	I _{cc} en kA	I _Δ en A	Beschermde kringen
	<u>63</u>	<u>10</u>	<u>0.03</u>	<u>Alle</u>	<u>40</u>	<u>3</u>	<u>0.03</u>	<u>15</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
	<u>40</u>	<u>3</u>	<u>0.03</u>	<u>9</u>	<u>40</u>	<u>3</u>	<u>0.03</u>	<u>7</u>				

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE :

Kringen	Beveiligingen	Doorsnede	Kringen	Beveiligingen	Doorsnede
<u>2</u>	<u>DII 40A</u>	<u>16/160mm²</u>	<u>1</u>	<u>DII 20A</u>	<u>2.5</u>
<u>28</u>	<u>DII 6A</u>	<u>1.5-2.5</u>	<u>2</u>	<u>DII 20A</u>	<u>4-6</u>
<u>1</u>	<u>DII 60A</u>	<u>2.5</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>

OVERTREDINGEN (INBREUKEN / OPMERKINGEN) :

Nihil

NOTA'S :

- De algemene differentieel : ☐ was reeds verzegeld ☐ mocht niet verzegeld worden ☒ werd verzegeld ☐ is onverzegelbaar ☐ geen differentieel
 - De schema's : ☒ werden ondertekend ☐ werden niet ondertekend ☐ niet aanwezig

BESLUIT :

- ☒ De installatie is conform. Het volgende bezoek is te voorzien vóór : 31.01.2036
☐ De installatie is niet conform. De nodige gevolgen om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen (i/o) moeten zonder uitstel uitgevoerd worden, en moeten er de nodige maatregelen genomen worden, indien de installatie de dienst blijft verzekeren, dat er geen enkel gevaar bestaat voor personen en eigendommen.
☐ Binnen de termijn van één jaar vanaf heden, en indien deze tweede controle geweigerd wordt of in het geval van blijvende inbreuken, zal een kopie van dit verslag conform Art. 276.02 van het AREI aan de Administratie van Energie voor het toezicht op huishoudelijke elektrische installaties verstuurd worden.
☐ De resultaten van de controle laten niet toe de installatie conform te verklaren. Een bijkomend onderzoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór de (her) indienstelling van de installatie.

Inspecteur (Naam en Handtekening)
 In opdracht van BIC vzw

De aanvrager (Naam en handtekening)



Brussel : 126, bus 12 - Oorlogskruisenlaan - 1120 Brussel
 Bergen : Parc Initialis - 2 - Avenue Descartes - 7000 Mons
 Luik : 61/63 - Rue Grand-Vinave - 4101 Jemeppe

Tel : 02/245.46.95 Fax : 02/215.12.78
 Tel : 065/32.15.51 Fax : 065/32.15.77
 Tel : 04/234.17.00 Fax : 04/234.17.80

Ba,lrcl,e,o,g : 340-0298168-28 B.T.W. BE 406.671.312

-VERTROUWELIJK -

CONTROLEVERSLAG VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNING EN ZEER LAGE SPANNING

INSTALLATIE

(Controle uitgevoerd volgens de interne procedure PRO-INS-E-10)

Verslag nr : 24/11-06-2866
 Datum van onderzoek : 28/06/2011
 Eigenaar Naam - Voornaam : PHILIP
 Adres : 55 Diesbeekstraat
1654 Luikweert

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk
 Naam - Voornaam : CAPILEG
 BTW nr. / LK. nr. : 850488007458
 Adres installatie : IDET - ANNEKE 1

SOORT CONTROLE :

- A) Controle vóór het onder spanning zetten van een huishoudelijke LS en ZLS-installatie uitgevoerd op basis van de voorschriften van het AREI.
 B) Controlebezoek van een huishoudelijke LS en ZLS installatie voor verzwaring van het vermogen op het openbaar distributienet, uitgevoerd op basis van de voorschriften van het AREI.

INSTALLATIE :

☐ Woonenheid ☐ Gemeenschappelijke delen ☒ Anderen : ANNEKE 1, volgens het ☒ Art.86 ☐ Art.87 van het AREI.
 Verdelers : Aansluiting volgens kablering van het bord : Spanning : 3N230 V.
 Voeding van het hoofdbord : 5 X 10 mm². Beveiliging aansluiting : 63-40 A. (☐ In max. te voorzien)
 Voedingskolom : 4 X 16 mm². Algemeen lastschakelaar : 40 A.
 Aantal borden : 1 Aantal eindkringen : 13 R_E 6,6 Ω R_{IGEN} 2,8 MΩ.
 Soort aarding : ☐ lus ☒ piketten -

Differentieel	I _n en A	I _{cc} en kA	I _Δ en A	Beschermde kringen	I _n en A	I _{cc} en kA	I _Δ en A	Beschermde kringen	I _n en A	I _{cc} en kA	I _Δ en A	Beschermde kringen
	<u>40</u>	<u>3</u>	<u>0,03</u>	<u>ALB</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE :

Kringen	Beveiligingen	Doorsnede	Kringen	Beveiligingen	Doorsnede
<u>1</u>	<u>DTB 32 A</u>	<u>10</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
<u>12</u>	<u>DTB 16 A</u>	<u>1,5-2,5</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>

OVERTREDINGEN (INBREUKEN / OPMERKINGEN) :

Nihil

NOTA'S :


- De algemene differentieel : ☐ was reeds verzegeld ☐ mocht niet verzegeld worden ☒ werd verzegeld ☐ is onverzegelbaar ☐ geen differentieel
 - De schema's : ☒ werden ondertekend ☐ werden niet ondertekend ☐ niet aanwezig

BESLUIT:

- ☒ De installatie is conform. Het volgende bezoek is te voorzien vóór : 28/06/2036
☐ De installatie is niet conform. De nodige gevolgen om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen (i/o) moeten zonder uitstel uitgevoerd worden, en moeten er de nodige maatregelen genomen worden, indien de installatie de dienst blijft verzekeren, dat er geen enkel gevaar bestaat voor personen en eigendommen
☐ Binnen de termijn van één jaar vanaf heden, en indien deze tweede controle geweigerd wordt of in het geval van blijvende inbreuken, zal een kopie van dit verslag conform Art. 276.02 van het AREI aan de Administratie van Energie voor het toezicht op huishoudelijke elektrische installaties verstuurd worden.
☐ De resultaten van de controle laten niet toe de installatie conform te verklaren. Een bijkomend onderzoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór de (her) indienstelling van de installatie.

Inspecteur (Naam en Handtekening)
 In opdracht van BIC - vzw


De aanvrager (Naam en handtekening))

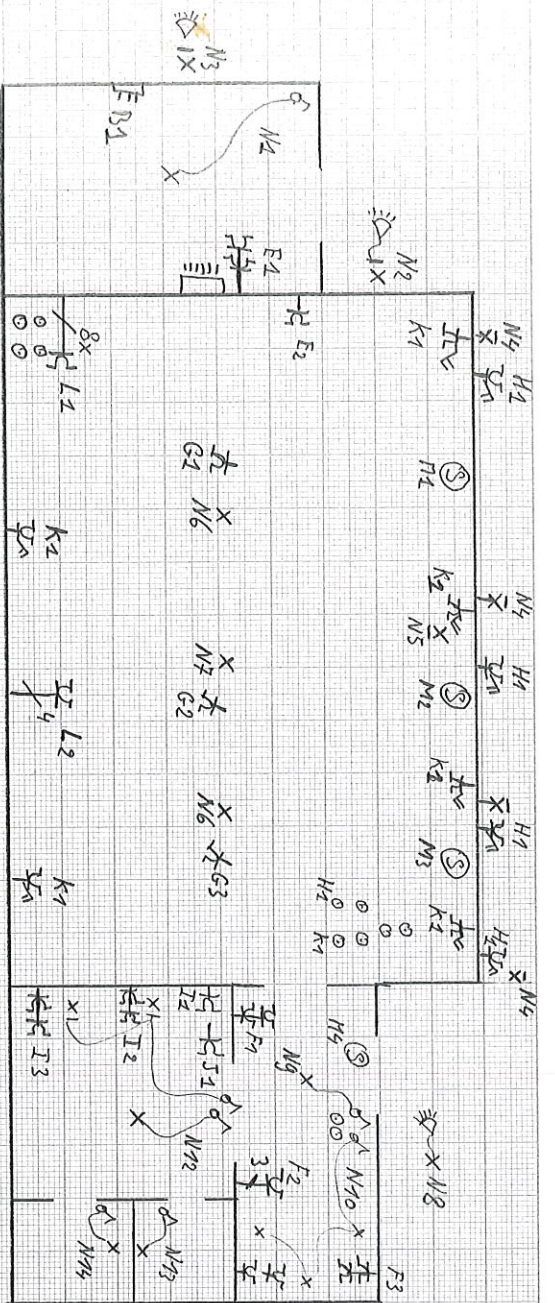

annexe 1

CAPIEC S.R.L.
7 RUE de CHARLEY
4550 COURMAYEUR
Tél 458 007 458

[Handwritten signature]

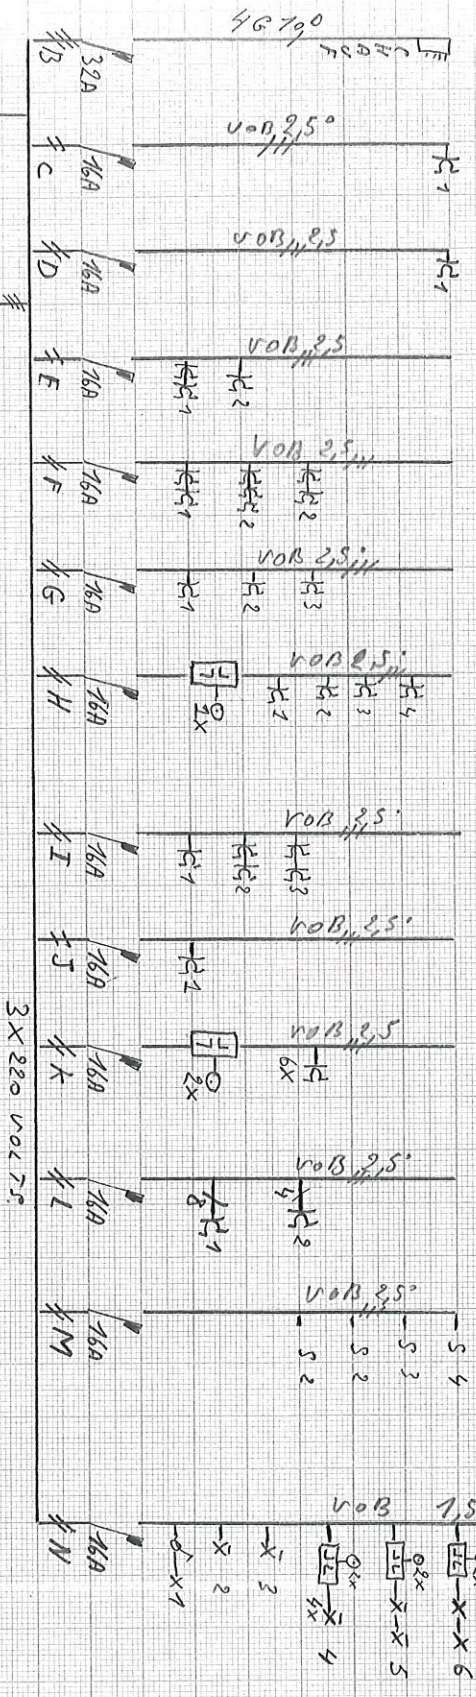

A 40/4/30 kVA
5 G 10° 1 mm

TD 1 (compteur)

3 X 220 Volts

IMPACT SA

55 Diesbeekstraat

1654 HUIZINGEN

TD5

DE GRADT
Gauthier

[Handwritten signature]
