

### Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Belgielei 55 S4, 2018 Antwerpen  
 Naam eigenaar Dhr. Rudy  
 Adres eigenaar niet bekend,  
 Type object appartement  
 EAN-code niet beschikbaar  
 Aard installatie wijziging  
 Doel onderzoek herkeuring



Het onderzoek is verricht op 17/01/2016 volgens artikel 271 en 276bis [van het AREI](#) en onze procedure(s) TP1.

### Installatiegegevens

Spanning (V) 230  
 Type elektrode pen  
 Ø voedingsleiding (mm<sup>2</sup>) 10  
 Waarde hoofdschakelaar (A) 40

Gegevens hoofdbeveiliging (A) 63  
 Waarde differentiële schakelaar(s) (mA) 300 en 30  
 Aantal verdeelborden 2  
 Aantal stroombanen per verdeelbord 2 x 3

### Metingen

RA / ZS (Ω) 9 /  
 Continuïteitsmeting goed

ΔI differentiële schakelaar(s) (mA) goed  
 Isolatieweerstand van de installatie (MΩ) >0,5

### Inbreuken

#### 1. nihil

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc. zijn niet losgemaakt. Indien tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

### Opmerkingen

(Ver)bouwjaar: na 2000

Voor de omschrijving van de installatie zie schema's

### Besluit

De installatie is conform het AREI.

De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.


De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 17/1/2041, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Eerste keuring is gerapporteerd door BTV dd 3/7/2013 nummer 326/ 140731/08

Voor de directeur, op 17/1/2016

Naam agentonderzoeker: Mohamed Rahmouni .....

Handtekening:



### Raadgevingen

1. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.

2. In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.


3. Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.

4. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.



### Adres- en onderzoeksgegevens

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Adres installatie | Belgielei 55 S4, 2018 Antwerpen |
| Naam eigenaar     | Dhr. Rudy                       |
| Adres eigenaar    | niet bekend,                    |
| Type object       | appartement                     |
| EAN-code          | niet beschikbaar                |
| Aard installatie  | wijziging                       |
| Doel onderzoek    | herkeuring                      |

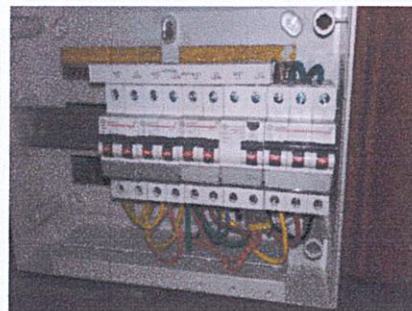

Het onderzoek is verricht op 17/01/2016 volgens artikel 271 en 276bis [van het AREI](#) en onze procedure(s) TP1.

### Installatiegegevens

|                                      |     |                                         |           |
|--------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----------|
| Spanning (V)                         | 230 | Gegevens hoofdbeveiliging (A)           | 63        |
| Type elektrode                       | pen | Waarde differentiële schakelaar(s) (mA) | 300 en 30 |
| Ø voedingsleiding (mm <sup>2</sup> ) | 10  | Aantal verdeelborden                    | 2         |
| Waarde hoofdschakelaar (A)           | 40  | Aantal stroombanen per verdeelbord      | 2 x 3     |

### Metingen

|                     |      |                                           |      |
|---------------------|------|-------------------------------------------|------|
| RA / ZS (Ω)         | 9 /  | ΔI differentiële schakelaar(s) (mA)       | goed |
| Continuïteitsmeting | goed | Isolati weerstand van de installatie (MΩ) | >0,5 |

### Inbreuken

#### 1. nihil

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt. Indien tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

### Opmerkingen

(Ver)bouwjaar: na 2000

Voor de omschrijving van de installatie zie schema's

### Besluit

De installatie is conform het AREI.

De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.


De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 17/1/2041, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Eerste keuring is gerapporteerd door BTV dd 3/7/2013 nummer 326/ 140731/08

Voor de directeur, op 17/1/2016


Naam agentonderzoeker: Mohamed Rahmouni .....

Handtekening:



### Raadgevingen


- Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
- Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

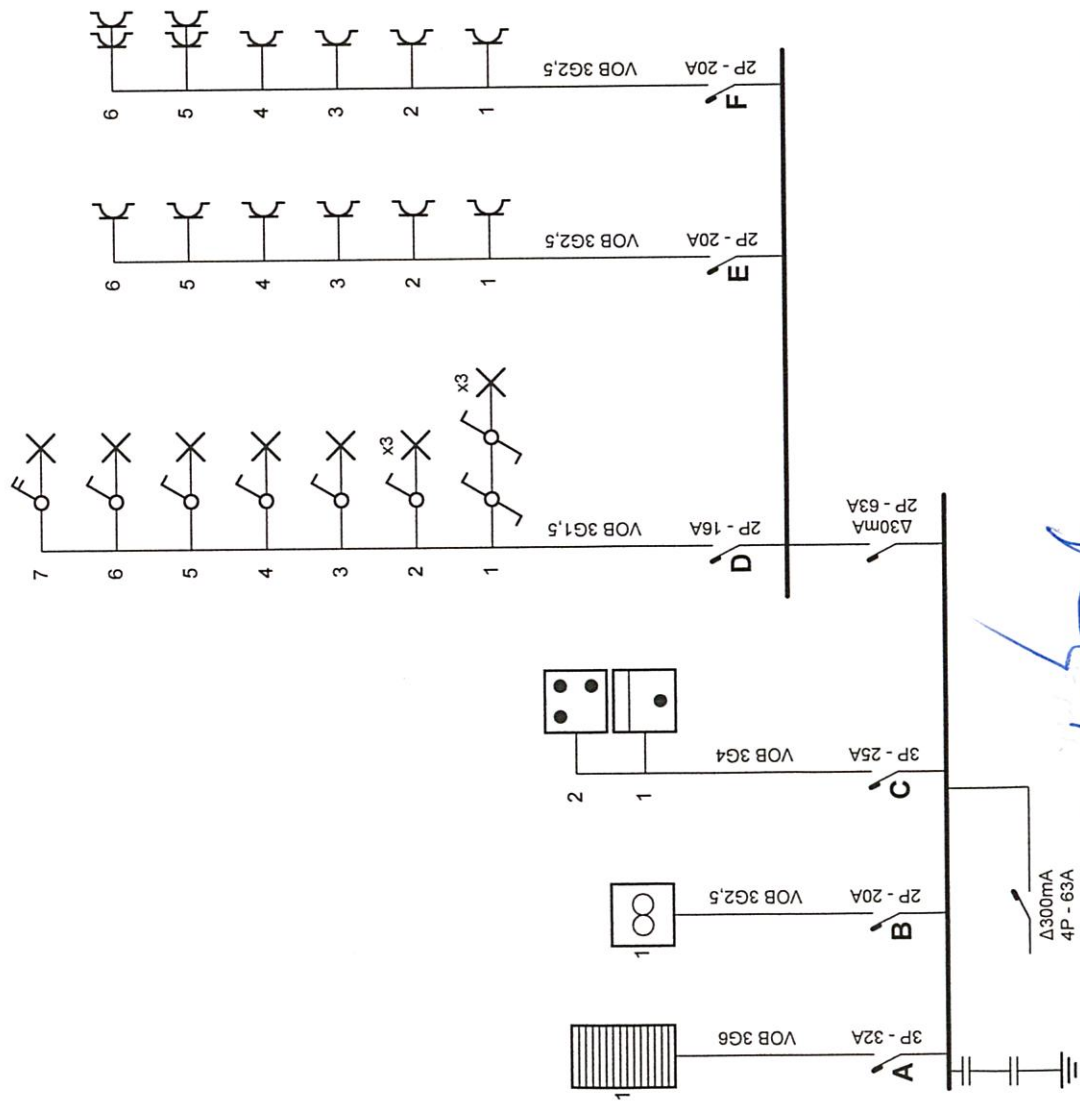

|                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>p. 1/2</div> <div>Eendraadschema</div> <div>Datum: 12-12-2015</div> <div>3 x 400V + N ~ 50Hz</div> | <div>Installateur</div> <div>Tel.: - GSM: -</div> <div>Fax: -</div> <div>e-mail: -</div> | <div>Plaats van de elektrische installatie</div> <div>rudy</div> <div>Belgielei 4de verdiep app. S4 55</div> <div>2018 Antwerpen</div> <div>Tel.: - GSM: -</div> <div>Fax: -</div> <div>e-mail: -</div> |
|                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |

*Handwritten signature and date: 12-12-2015*



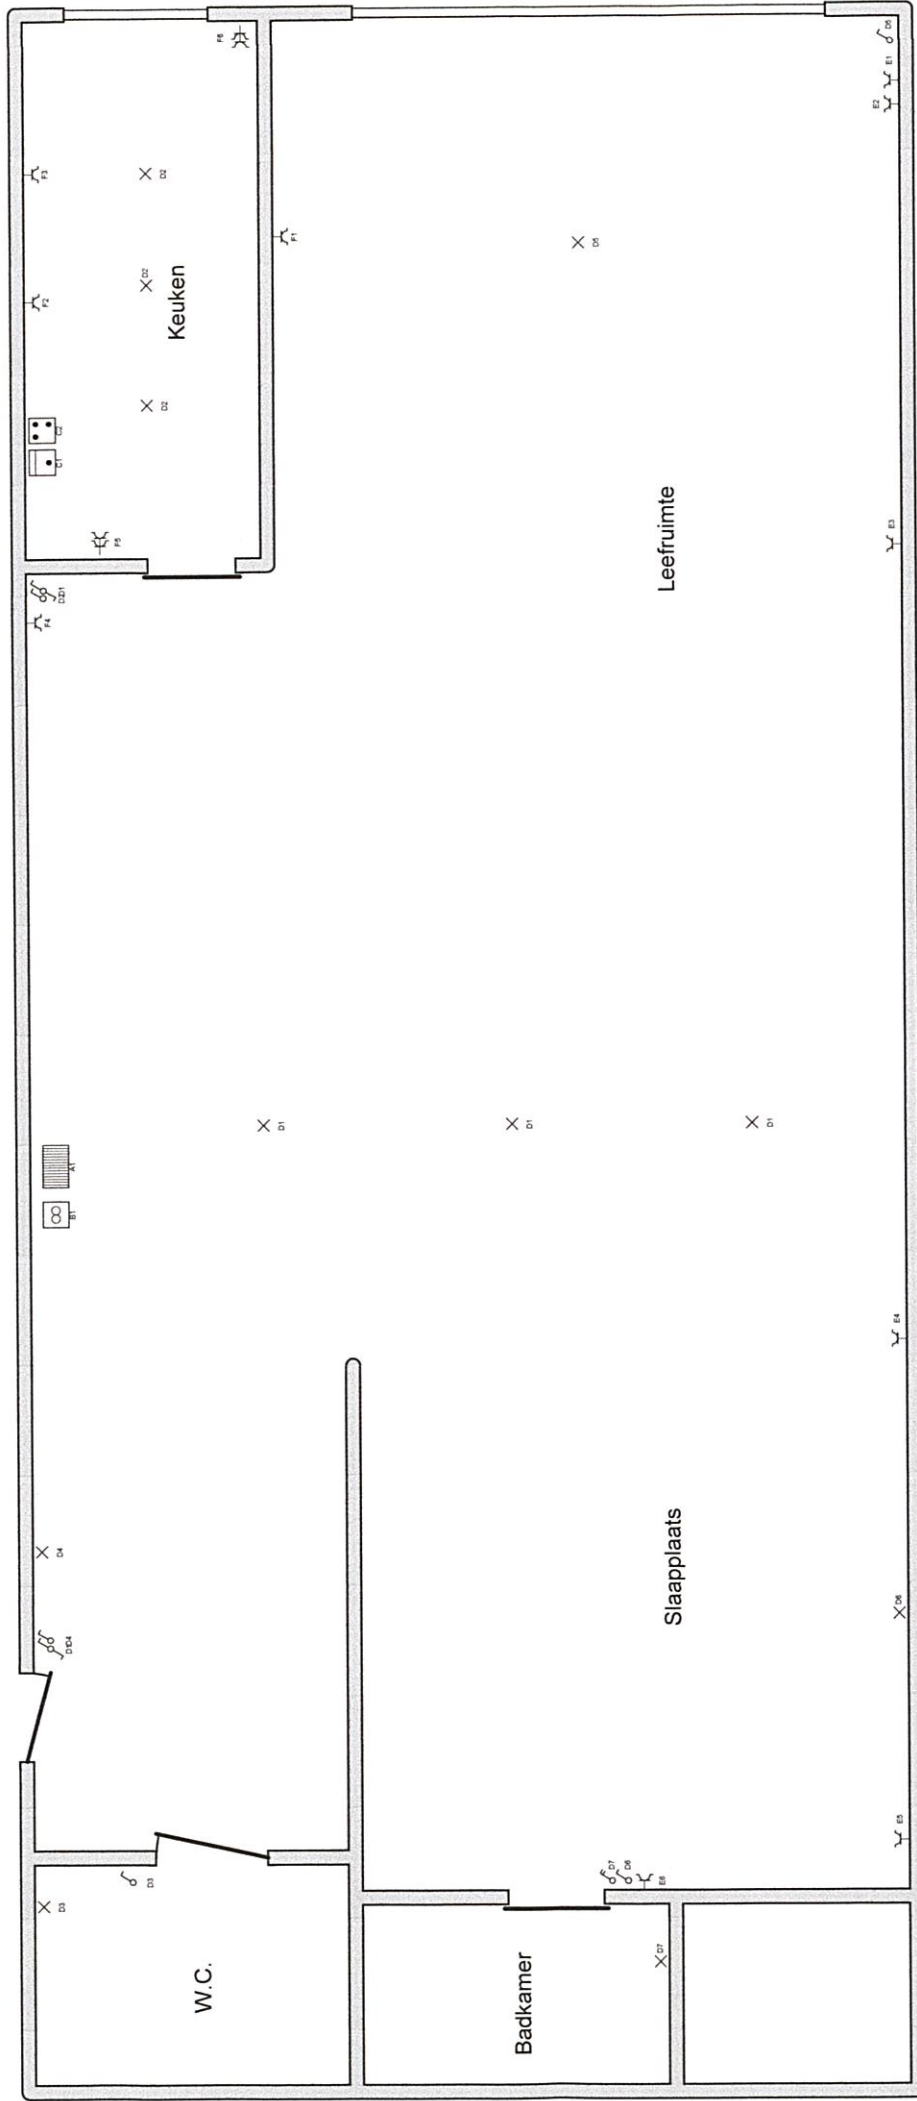

| Plaats van de elektrische installatie |  | Installateur   |  | p. 2/2<br>Situatieschema |  |
|---------------------------------------|--|----------------|--|--------------------------|--|
| rudy                                  |  | Tel.: - GSM: - |  | Datum: 12-12-2015        |  |
| Belgielei 4de verdiep app. S4 55      |  | Fax: -         |  | 3 x 400V + N ~ 50Hz      |  |
| 2018 Antwerpen                        |  | e-mail: -      |  |                          |  |
| Tel.: - GSM: -                        |  |                |  |                          |  |
| Fax: -                                |  |                |  |                          |  |
| e-mail: -                             |  |                |  |                          |  |
