

Resp. client:
N° commande.
N° client:
Pers. cont.:
Tél.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: mario.martinsalves@outlook.com



INSP-205



OCB vzw
Member of OCB Group

ProKo.: LS01
N° rapport : 5701505
N° rapp. prov.:
Date: 09/11/2021

Client / Mandant :
MARIO MARTINS
RTE DU LAC 22
4950 ROBERTVILLE

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT
(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie
(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATION

Organ. de contrôle: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-visiteur: 53 TRIBOLET JEAN-PAUL
Propriét. / exploit./gestionn.: Nom: MARIO MARTINS Adresse: RTE DU LAC 22 4950 ROBERTVILLE
Installat. / respons. travaux: Nom: MARIO MARTINS Adresse: RTE DU LAC 22 4950 ROBERTVILLE T.V.A.:
Adresse installation: MARIO MARTINS RTE DU LAC 22 ROBERTVILLE 4950 Cabine HT - privée: Kies een item.
Type installation: unité d'habitation Appareil/Install. ID:
EAN nr.: ? Fournisseur: Compteur: 4323499 Compteur nuit :

CONTROLE

Base: AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.

Type: contrôle de conformité avant la mise en usage - modification/extension importante (chap.6.4)
Kies een item.

Dérogat. partie 8 livre 1 *: Kies een item.

Date installation: après 01/06/2020

(*) En cas contrôle chap. 6.4., réf. du document « début réalisation avant 01/06/2020 » : Kies een item.

Date: 09/11/2021

Contrôle suivant dans 300 mois, ou avant le 30/11/2046

Contenu: Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

INSTALLATION

Présence tension: présente Raccordement: réseau souterrain au aérien Fourreau: placé Plaque d'isolat.: présente
Tension nominal: 3N400V Protection max.: 40A Protection princip.: 40A Interr. princip.: aut. GRD
Liaison comptage-coffre de repart.: type câble: EXVB nombre conduct.: 4 section: 16 mm²
Câble de raccordement au réseau: type câble: EXVB nombre conduct.: 4 section: 16 mm²
Prise de terre genre: individuelle accessibilité: en ordre - sectionn.de terre commune est accessible
Électrode de terre: type: boucle section: 35 mm²
Interrupteur Diff.: général: 4p 40A/300mA supplémentaire: 4p 40A/300mA
Schéma unifilaire et plan de position: ☒ voir annexe ☐ références:
Installation exécutée conformément aux schéma et plan: en ordre État du matériel fixe ou - à pose fixe: en ordre
Ne sont pas encore placés: ☐ cuisine ☐ salle de bains ☐ chauffage central ☐ compteur de gaz ☐ compteur d'eau ☐ luminaires
Ne sont pas encore raccordés: liaison équipotentielle ☐ principale ☐ supplémentaire
Nombre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux, incl. réserve: 28

RESULTATS

Résist. d'isolem. général: 35 MOhm Résistance de dispersion: 18 Ohm
Bouton d'essai diff.: en ordre Boucle de défaut: en ordre Continuité PE et liaison équipotential: en ordre
Protection contre les chocs électriques: contact direct: en ordre contact indirect: en ordre
Protection contre le surintensité: en ordre Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe: en ordre

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N Néant

I Néant

CONCLUSION

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.

Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus**.

Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.


Pour le Directeur Technique,




Ir. G. Croes

CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES



Lisez les prescriptions réglementaires par ce lien: https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf

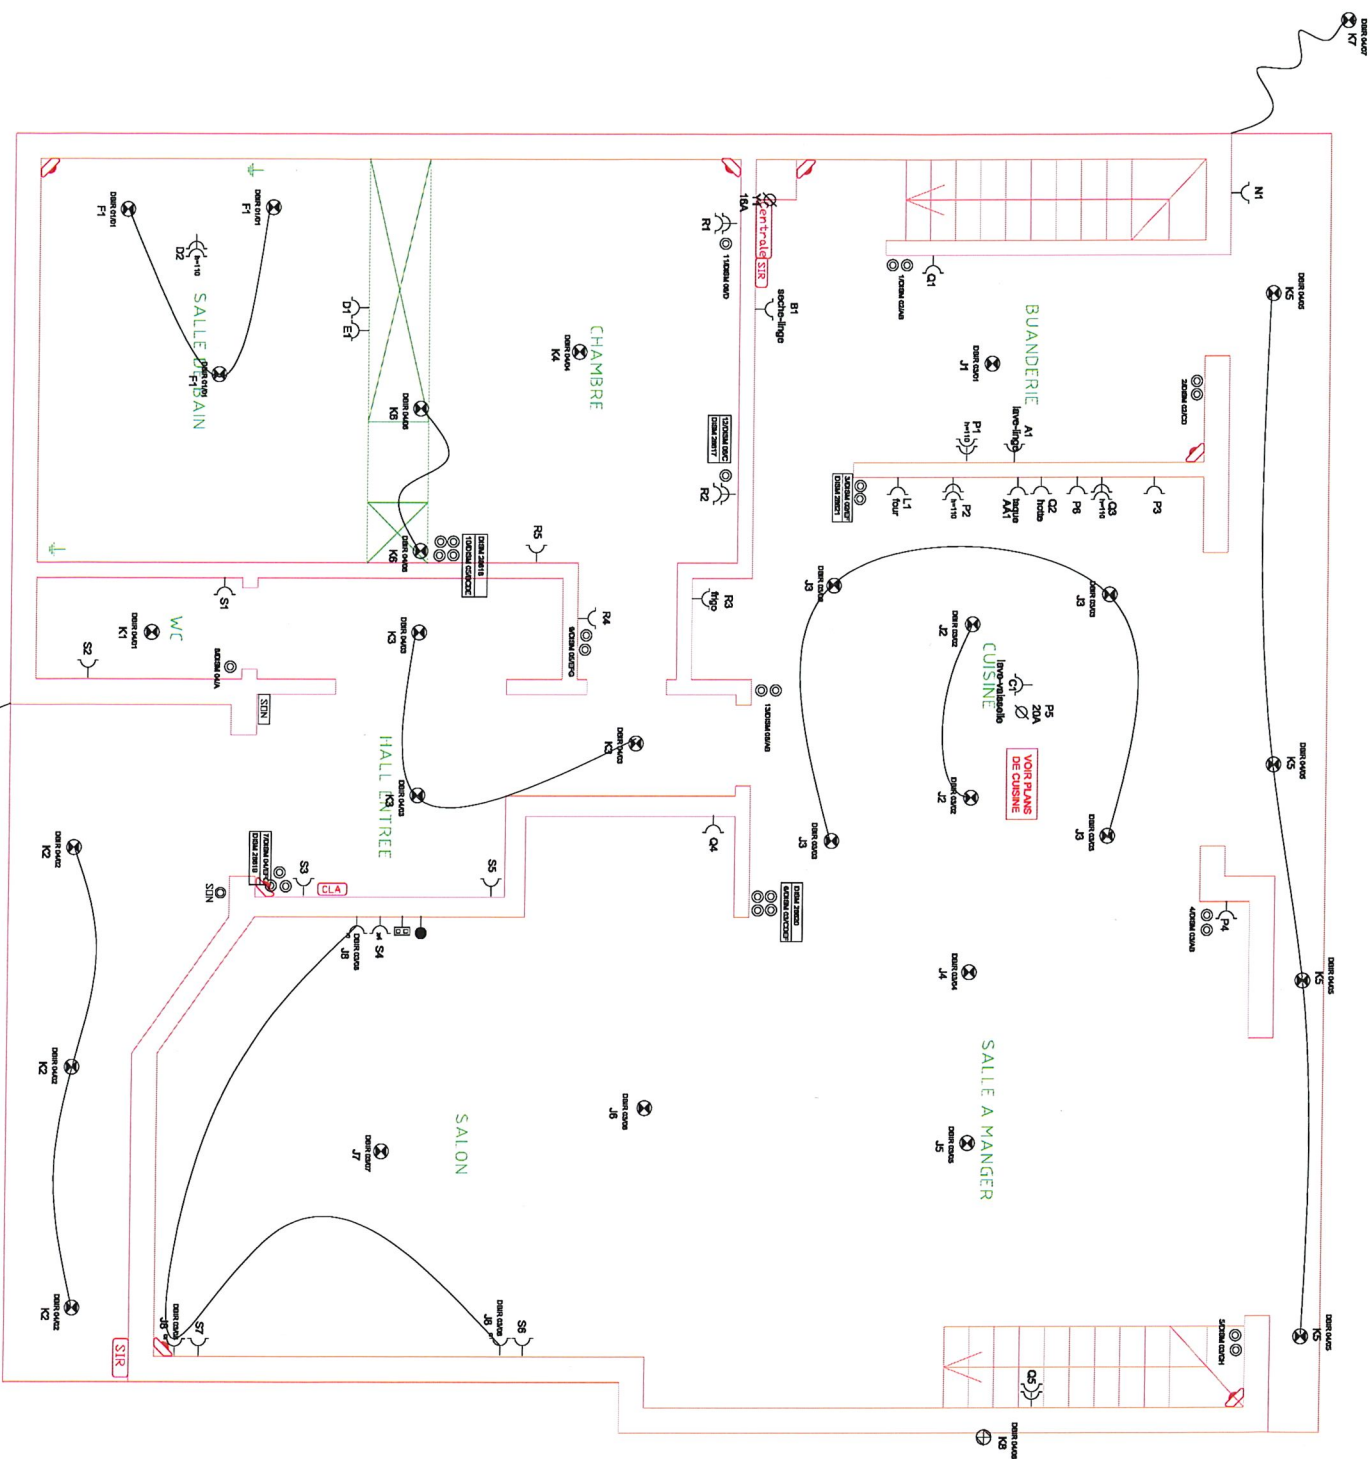

- LEGENDE ELECTRIQUE**
- ⊗ PL - soquet & ampoule
 - ⊕ PL en applique - soquet & ampoule
 - ⊙ Prise téledistribution
 - ⊙ Prise RJ double
 - ⊙ Prise simple
 - ⊙ Prise double
 - ⊙ Interrupteur simple
 - ⊙ Interrupteur x direction
 - ⊙ Détecteur de présence et crépusculaire
 - ⊙ Armature Fluorescente
 - ⊙ Bouton poussoir simple
 - ⊙ Bouton poussoir double
 - ⊙ Alimentation monophasée
 - ⊙ Carillon sonnerie
 - ⊙ Détecteur de mouvement
- Centrale** Centrale alarme
- SIR** Sirène alarme
- CLA** Clavier alarme
- ⊙** Détecteur de mouvement alarme
- ⊙** Contact magnétique

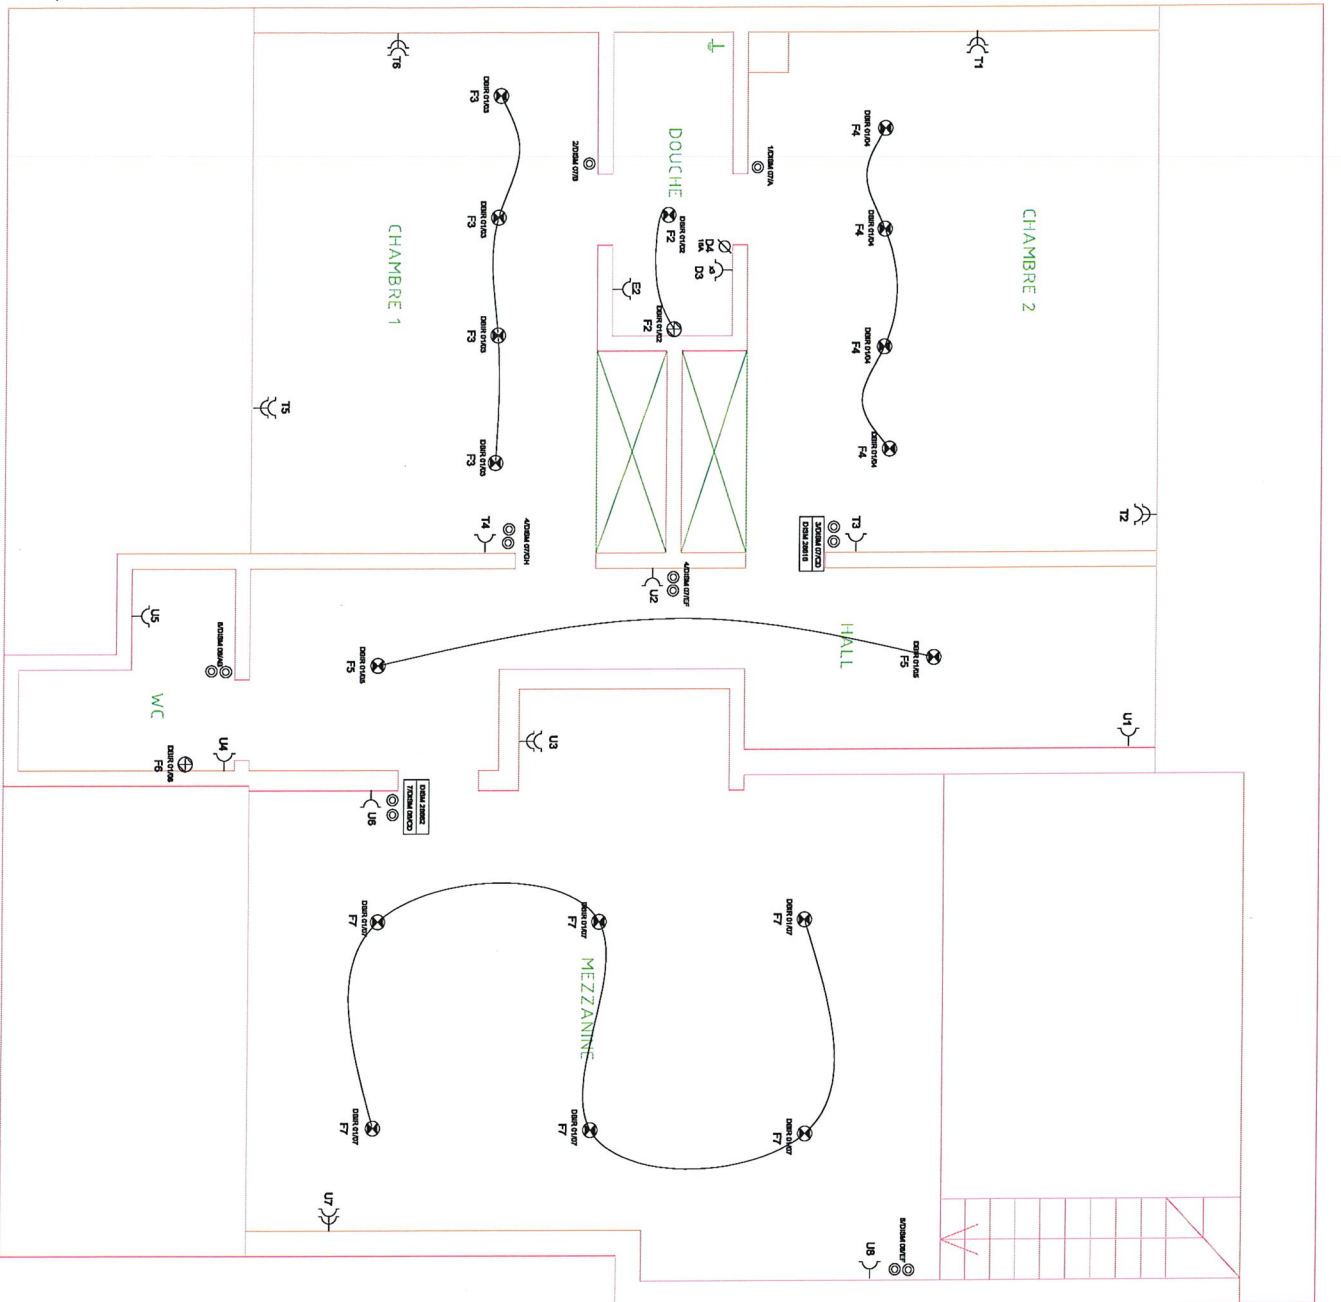

- LEGENDE ELECTRIQUE**
- ⊗ PL - soquet & ampoule
 - ⊕ PL en applique - soquet & ampoule
 - ⬤ Prise téledistribution
 - ⬤ Prise RJ double
 - ⬤ Prise simple
 - ⬤ Prise double
 - ⬤ Interrupteur simple
 - ⬤ Interrupteur x direction
 - ⬤ Détecteur de présence et crépusculaire
 - Armature Fluorescente
 - ⊙ Bouton poussoir simple
 - ⊙ Bouton poussoir double
 - ⊙ Alimentation monophasée
 - ⊙ Son Carillon sonnerie
 - ⊙ Détecteur de mouvement
 - ⊙ Centrale alarme
 - ⊙ Sirène alarme
 - ⊙ Clavier alarme
 - ⊙ Détecteur de mouvement alarme
 - ⊙ Contact magnétique

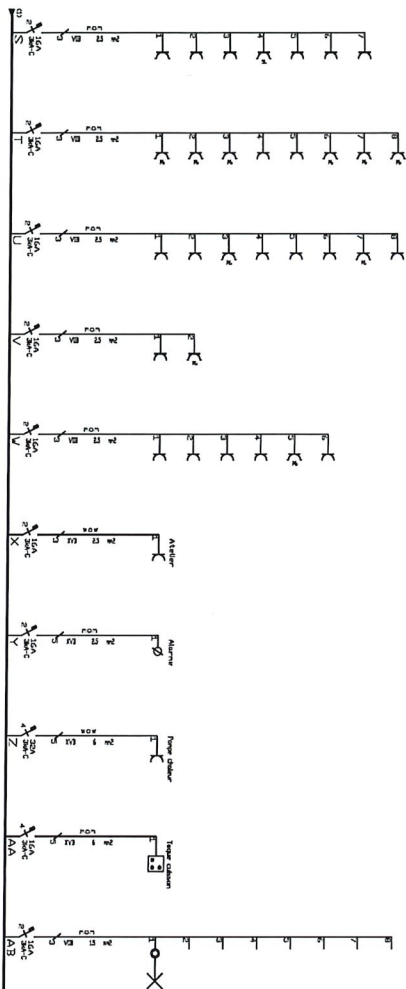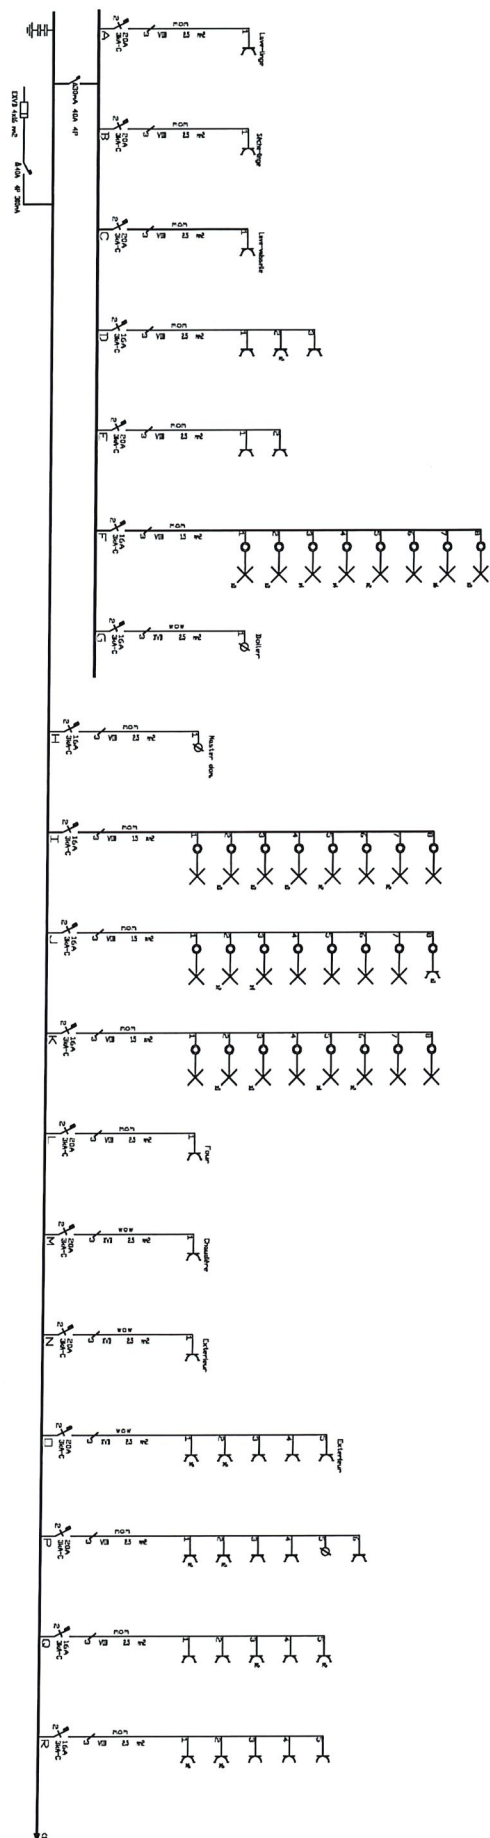

- A - Lave-linge
- B - Sèche-linge
- C - Lave-vaisselle
- D - Prises salle de bain/douche
- E - Radiateurs salles de bains
- F - Eclairage salle de bain/douche + étage
- G - Boîtier
- H - Master domotique
- I - Eclairage sous-sol
- J - Eclairage buanderie, cuisine, salles manger, salon
- K - Eclairage extérieur, hall, chambre rez, wc
- L - Four
- M - Chauffage
- N - Prise extérieure
- O - Prises garage
- P - Prises cuisine plan de travail, tiot, piezo
- Q - Prises cuisine hotte, plan de travail, salle à manger
- R - Prises chambre rez, frigo
- S - Prises wc, hall, salon
- T - Prises chambres étage
- U - Prises garage
- V - Prises chauffep, cave 1 et 2
- W - Prises garage futur atelier
- X - Alarme
- Y - Pompe à chaleur
- Z - Taquet de cuisson
- AB - Eclairage extérieur
