


Keuringsrapport elektrische installatie

Rapportnummer: RAP.1000.012.7093597.REV0

Pagina 1 van 1

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Minister Edmond Rubbenslaan 24, 9240 Zele
Naam eigenaar Daniel Coene
Adres eigenaar Brugsevaart 105, 9030 Mariakerke
Type object eengezinswoning
EAN-code niet beschikbaar
Aard installatie wijziging
Doel onderzoek gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname

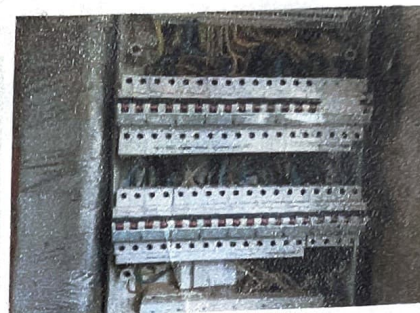

Het onderzoek is verricht op 29/04/2021 volgens hoofdstuk / afdeling 6.4 van Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Installatiegegevens

Spanning (V) 3 x 230 (3f)
Type elektrode pen
Ø voedingsleiding (mm²) 10
In hoofdbeveiliging (A) max 63

In hoofdschakelaar (A) 63
ΔI differentiële schakelaar(s) (mA) 300
Aantal verdeelborden 1
Aantal stroombanen per verdeelbord 15

Metingen

Ra / Zs (Ω) 6,91 / --
Continuïteitsmeting goed

Werking differentiële schakelaar(s) goed
Isolati weerstand van de installatie (MΩ) >0,5

Inbreuken

1. nihil

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Voor de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorneden van de stroombanen die ze beschermen zie eendraadsschema's.
Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt. Indien tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

Opmerkingen

Voor de omschrijving van de installatie zie schema's
De installatie is gecontroleerd rekening houdend met de uitzonderingsmaatregelen vermeld in hoofdstuk 8.2.1 van boek 1.
De installatie mag verzwaaard worden naar 3x230V en max 63A.


Besluit

De installatie is conform Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.
De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 29/4/2046, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 29/4/2021

Naam agentonderzoeker: Thomas Neirynd

Handtekening:



De elektrische installatie is uitgevoerd overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieschema's, indien aanwezig.

Voor de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorneden van de stroombanen die ze beschermen zie eendraadsschema's.

Gecontroleerd zijnde vast of vast opgesteld materiaal (correcte keuze, installatie en samenbouw ter plaatse) en de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I

Recommandaties

- de verplichting het verslag van de gelijkvormigheidscontrole te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- de verplichting in het dossier elke wijziging aan de elektrische installatie te vermelden;
- de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
