

Keuringsverslag van een industriële of ermee gelijkgestelde laagspanningsinstallatie

CONFORM

Datum: 26/03/2021	Inspecteur: Tom Anthonis	Mentor: -	Installateur: HV-technics
ID-label: -		Klantreferentie: -	
Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557	Serie Nr.: 18460151		
Plaats van het onderzoek		Eigenaar	
Straatnaam	Britselei	Naam	BV Advocatenkantoor Dana Dobrin
Huisnummer	28	Straatnaam	Britselei
Busnummer	3A	Huisnummer	28
Postcode	2000	Busnummer	3A
Gemeente	Antwerpen	Postcode	2000
Land	België	Gemeente	Antwerpen
		Land	België
Naam contactpersoon		Installateur	
Telefoon	Helder Pareira	Naam	HV-technics
Gsm nr. (SMS)	+32496492715	BTW nr.	BE 700 236 070
		Telefoonnummer	+32496492715
		E-mail	Helder@hp-renova.be
Type			
Lichte industrie			
Aard onderzoek			
Controlebezoek van een bestaande niet-huishoudelijke elektrische installatie volgens AREI boek 1 hoofdstuk 6.5, 8.1.1., 8.1.2., 8.3.2. en 4.2.4.4.			
Gegevens van de installatie			
Uitwendige invloeden: Zie uitwendige invloeden in bijlage verslag			
NAZICHT VAN DE INSTALLATIE			
Beschrijving van gecontroleerd deel van de installatie	Advocatenkantoor		
De controle omvat meerdere verdeelborden	Ja		
Aanwezig netsysteem	TT via openbare teller		
	SN teller: 24044758		
	Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 3~230V Meter		
	/ bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A		
Beschrijving aardingsinstallatie	Horizontaal in de grond ingegraven metalen geleider(s)		
Beoordeling elektrische schema's	schema's OK, zie scan schema's aangepast met kleine aanvullingen en bijgevoegd in bijlage van dit verslag		
	Zie schema's in bijlage van dit verslag		
Afschakelvermogen hoofdbeveiliging op ALSB	3kA	Noodnet	niet van toepassing
Kortsluitvermogen normaal Max.	Gemeten waarde : 0.557	Kortsluitvermogen noodnet Max.	
Voedingskabel type + sectie	4x10mm² xvb		
Filiatie	Nee		

VERDEELBORDEN

1	Omschrijving: Vb kelder	
	Opmerkingen (Nederlands): O2: Geen inbreuken vastgesteld.	Opmerkingen (Frans): O2: Aucune infraction .
2	Omschrijving: Vb kantoor	
	Opmerkingen (Nederlands): O2: Geen inbreuken vastgesteld.	Opmerkingen (Frans): O2: Aucune infraction .

RESULTATEN VAN DE METINGEN EN TESTEN

Spreidingsweerstand van aarding 4.81 Ω
 Continuïteitsmeting OK ($< 1\Omega$)
 Testen proefknoppen DSI OK

Kortsluit en isolatiemetingen:

Verdeelbord/kring/stopcontact	Icc max (kA)	Icc min (kA)	Riso (M Ω)
Vb kelder / vb kantoor	0.557	0.346	163.6

Inbreuken A.R.E.I. Boek 1	Gestructureerde mededeling	Voorwaarde	Opmerkingen

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

Besluit

Er is rekening te houden met de inhoud van dit verslag.

☐ Op het moment van de controle werden geen tekorten vastgesteld t.o.v.

☒ de AREI boek 1 (KB08/09/2019)-voorwaarden.

☒ Indien goedgekeurd: De installatie dient opnieuw gekeurd te worden uiterlijk op 26/3/2026 AREI Boek 1 afdeling 6.5.2., alsook voor de ingebruikname na elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding AREI Boek 1 Hoofdstuk 6.4 of Codex boek III

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Tom Anthonis



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

• Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.

- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

- Elk ongeval overkomen van personen en te wijlen, rechtsreeks of onrechtsreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit


- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De kourig beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be

02 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481

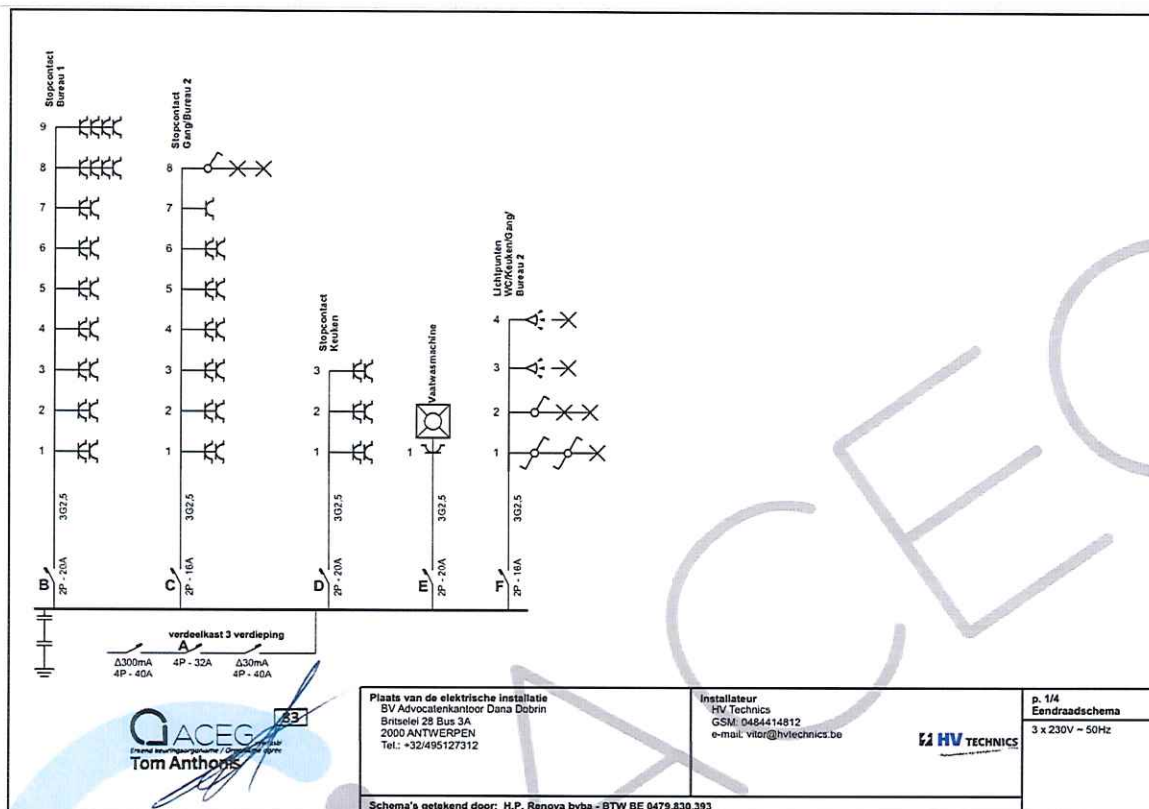

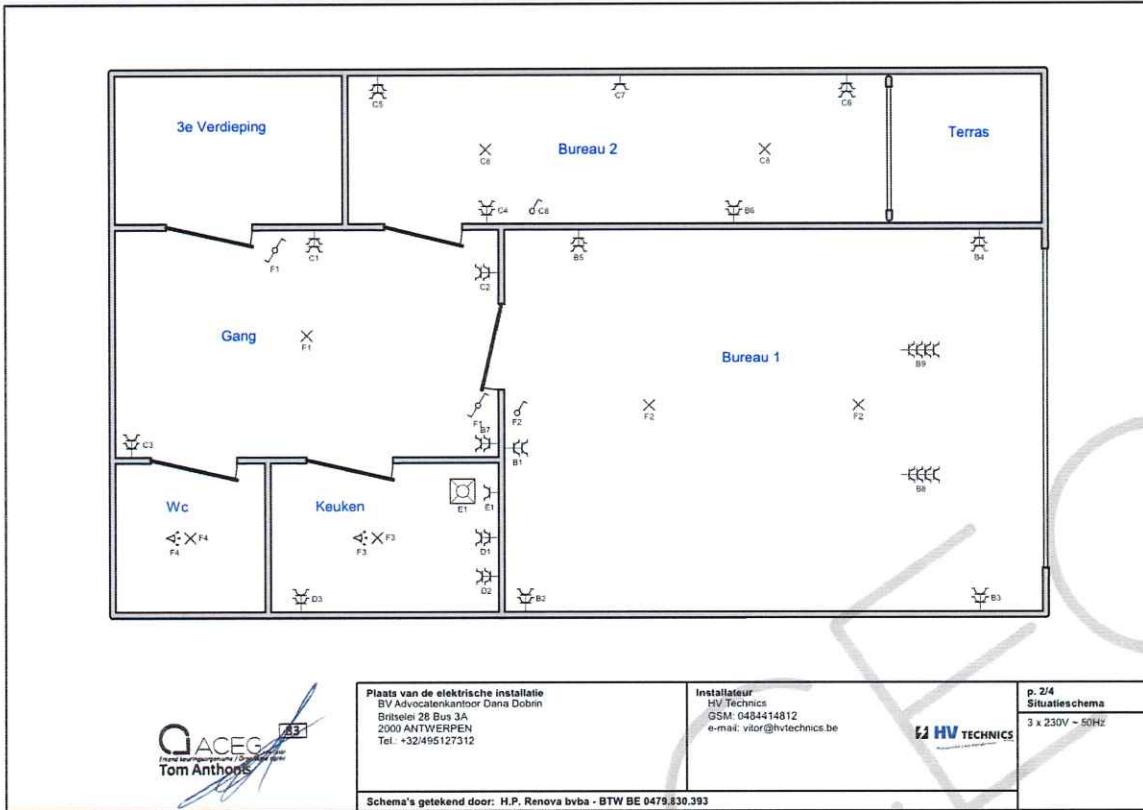

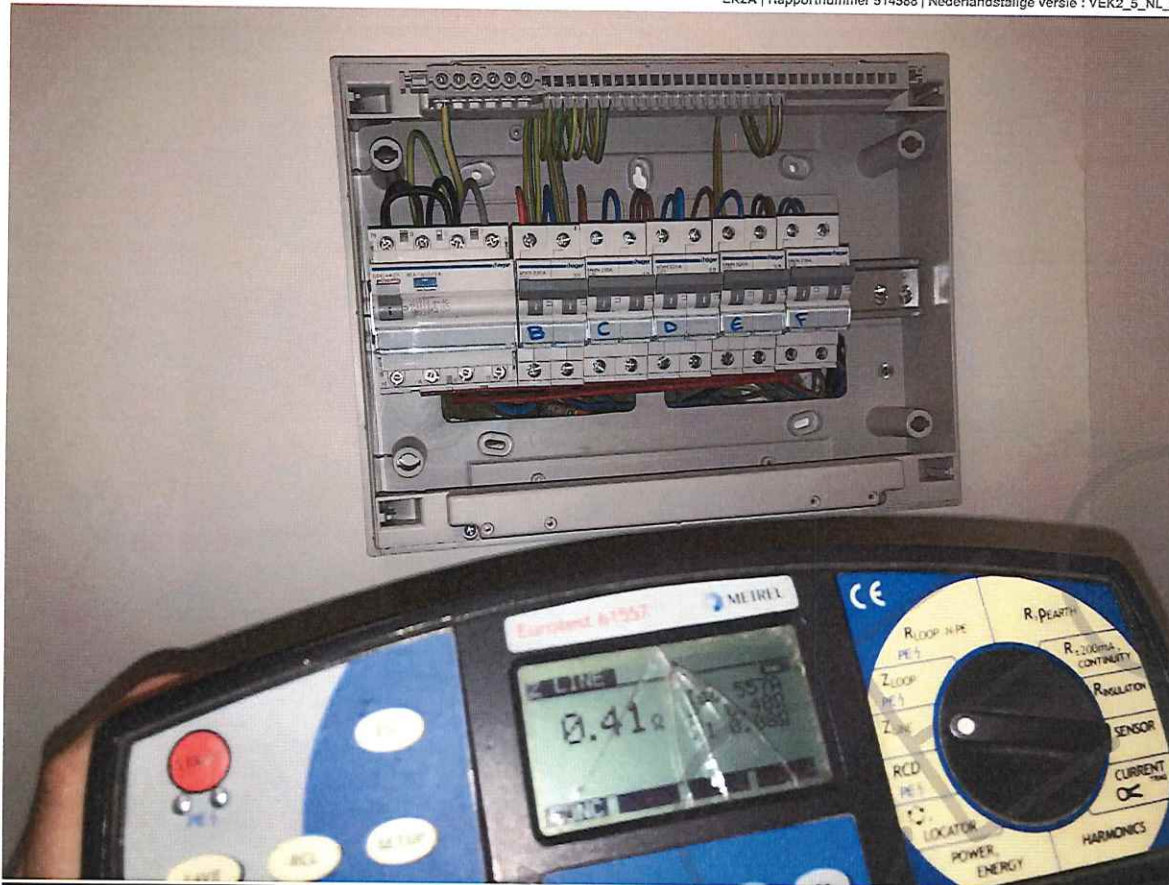

Inventaris uitwendige invloedsfactoren (AREI art. 19)

Adres van de Installatie :Brakelsele28 bis 34.....

Opstillingsdatum :

Behorend bij plannen en/of schema's met de nummers :

Behorend bij controleverslag met nummer :

() Er werden geen bijzondere Invloedsfactoren gemeld.
() De hierna vermelde, in tabelvorm, bijzondere Invloedsfactoren zijn aanwezig :

	AA	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	BA	BB	BC	BD	BE	CA	CB
Plants															
OFFICE	4	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1
KITCHEN	4	2	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1

Expilant of zijn tegenwoordiger		Tegenwoordiger van het Erkend Orgaan	
Datum	26-03-2021	Datum	26-03-2021
Naam	W. H. M. J. J.	Naam	W. H. M. J. J.
Handtekening		Handtekening	

