

**VINÇOTTE vzw**

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr.:

P.3626 97 92100

- ☒ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be



N 160009

Resi code: 2

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, voornaam: <u>Roels</u>	Naam, voornaam: <u>Roels</u>
Ident. Kaart nr. <u>592 615 1804 69</u>	Adres: <u>Herengracht 41</u>
BTW nr.: BE	Post nr. + Stad: <u>2460 Lichtaart</u>
	Tel.: / /

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

O

☒ Art 270	☒ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271 bis	☒ Wooneenheid
	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☐ Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 271	☐ periodiek	☐ controle		☐ Art 88	☐ Art	☐ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276	☐ verzwaaring	☐ Art 276bis	☐ verkoop van een wooneenheid	☐ Art ...	☐ Art	☐ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN	☒ EAN niet meegegeeld	☒ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.:	meterstand dag: nacht:	
	Bescherming aansluiting (A): ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100 ☐	☐ kWh excl. nacht meter:	
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V ☐	Type aardelektrode:	
	Maximale nominale stroom (A): ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 40 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100 ☐	☐ aardingslus ☒ pen / baar	
	Voedingsleiding hoofdbord: <u>4</u> X <u>1.0</u> mm ² - Type: <u>VUB</u>	☐	
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting <u>40</u> A / <u>300</u> mA	Aantal borden: <u>1</u>	Aantal eindstroombanen: <u>10</u>
☒ zie bijlage(n)			

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ >/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: <u>26.5</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau: <u>7.2</u> MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☐ Test diff.		
Differentieelstroominrichting: ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	☒ Nihil
Inbreuken Bestaande installatie	☒ Nihil
Opmerkingen	<u>Vereniging niet gecertificeerd</u>
☐ Nihil	

Besluit(en):

- ☒ De nieuwe installatie verdoet voldoet niet aan het AREI.
☐ De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

9.05.2012


door hetzelfde erkend organisme (*).

Agent bezoeker:

Naam: BERGHAUS Agent nr. 3626 Datum: 9.05.2012Bijlage(n): ☒ Situatieschema(s): 4 ☒ Eéndraadsschema(s): 4 ☐

Voor de directeur generaal: Handtekening

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

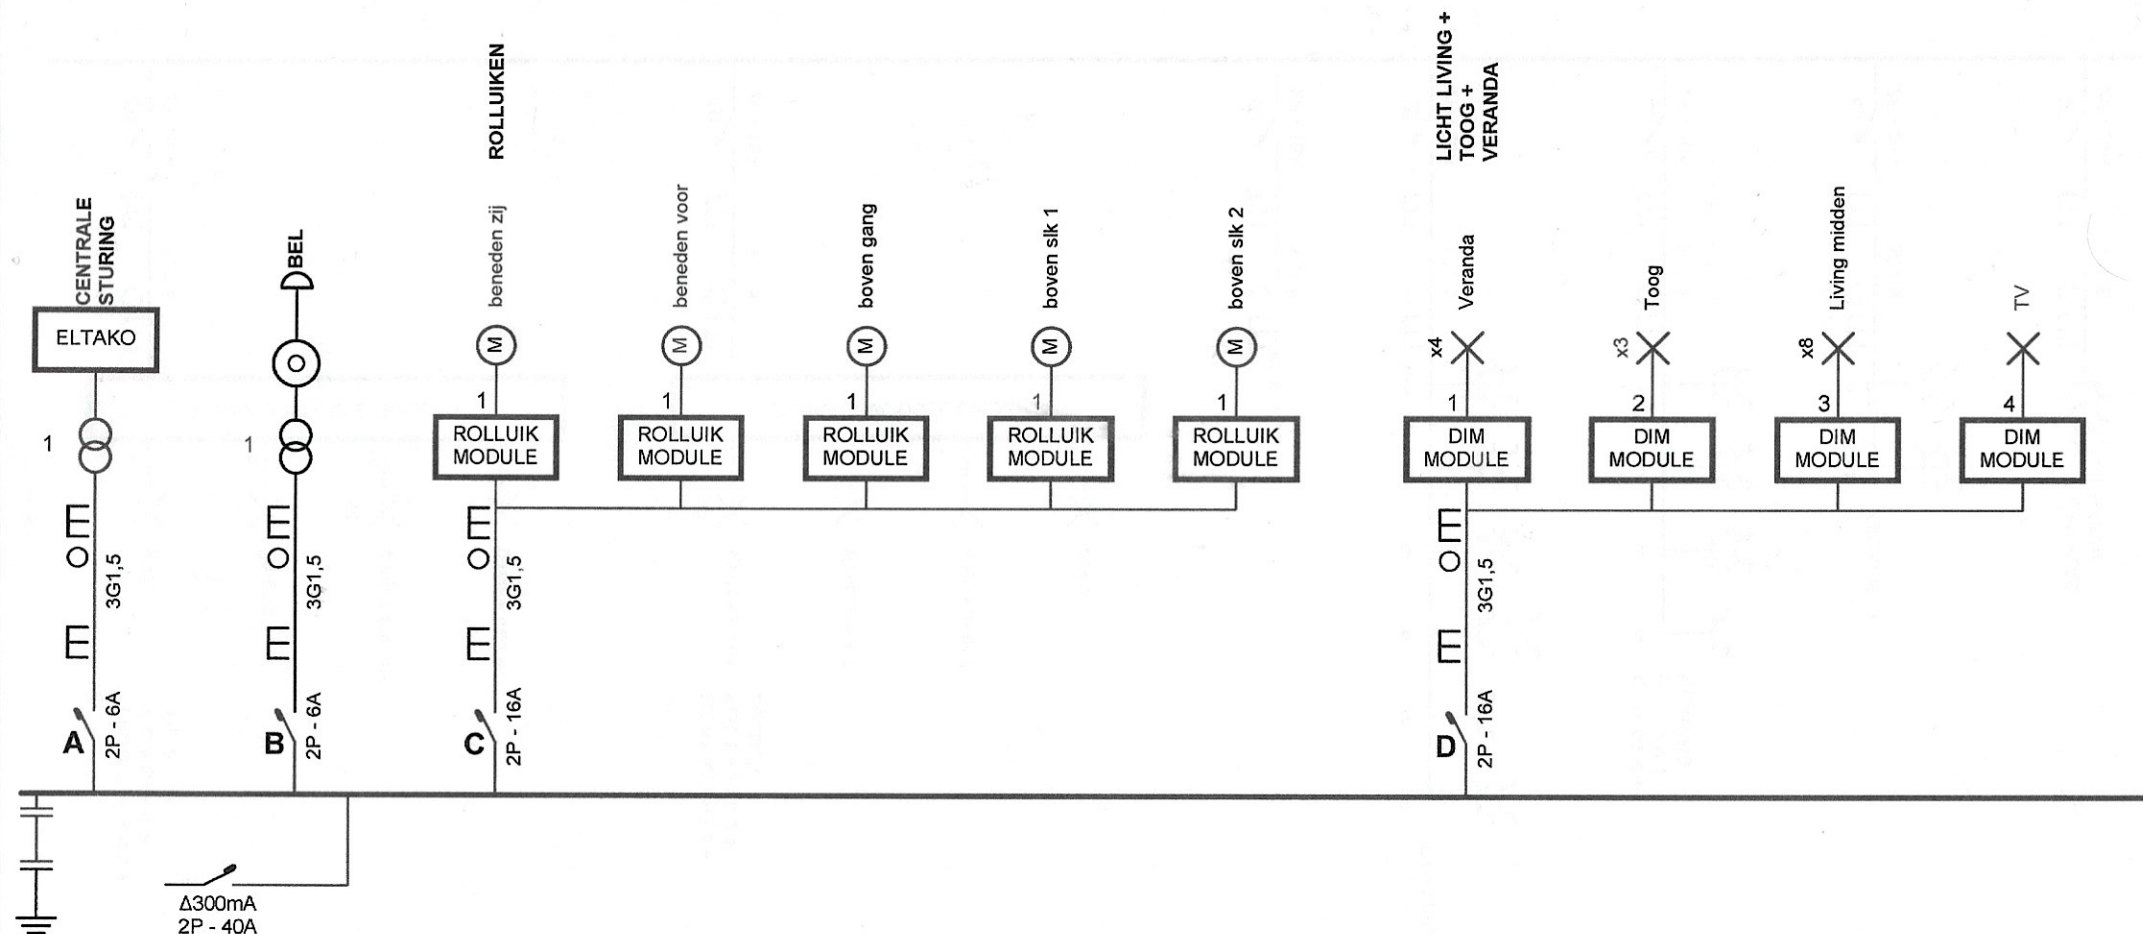

Plaats van de elektrische installatie
ROEFS WOUTER
HERENTALSESTEENWEG 41
2460 LICHTAART
GSM: 0497 608 106
e-mail: roefswouter@gmail.com

591-6151804-69

Installateur

p. 1/9
Eendraadschema


2 x 230V ~ 50Hz



2050-212581-02


625

LICHT BERGING +
WC + GANG +
TRAP



SCHAKELMODULE GROEP 1


LICHT KEUKEN +
SLK 1 + SLK 2 +
ZOLDER




SCHAKELMODULE GROEP 2

2P - 16A 3G1,5 RESERVE


TV + LIVING




EETHOEK +
KEUKEN +
BERGING



KEUKEN



WERKBLAD
KEUKEN




Plaats van de elektrische installatie
ROEFS WOUTER
HERENTALSESTEENWEG 41
2460 LICHTAART
GSM: 0497 608 106
e-mail: roefswouter@gmail.com

Installateur

p. 2/9
Eendraadschema


2 x 230V ~ 50Hz

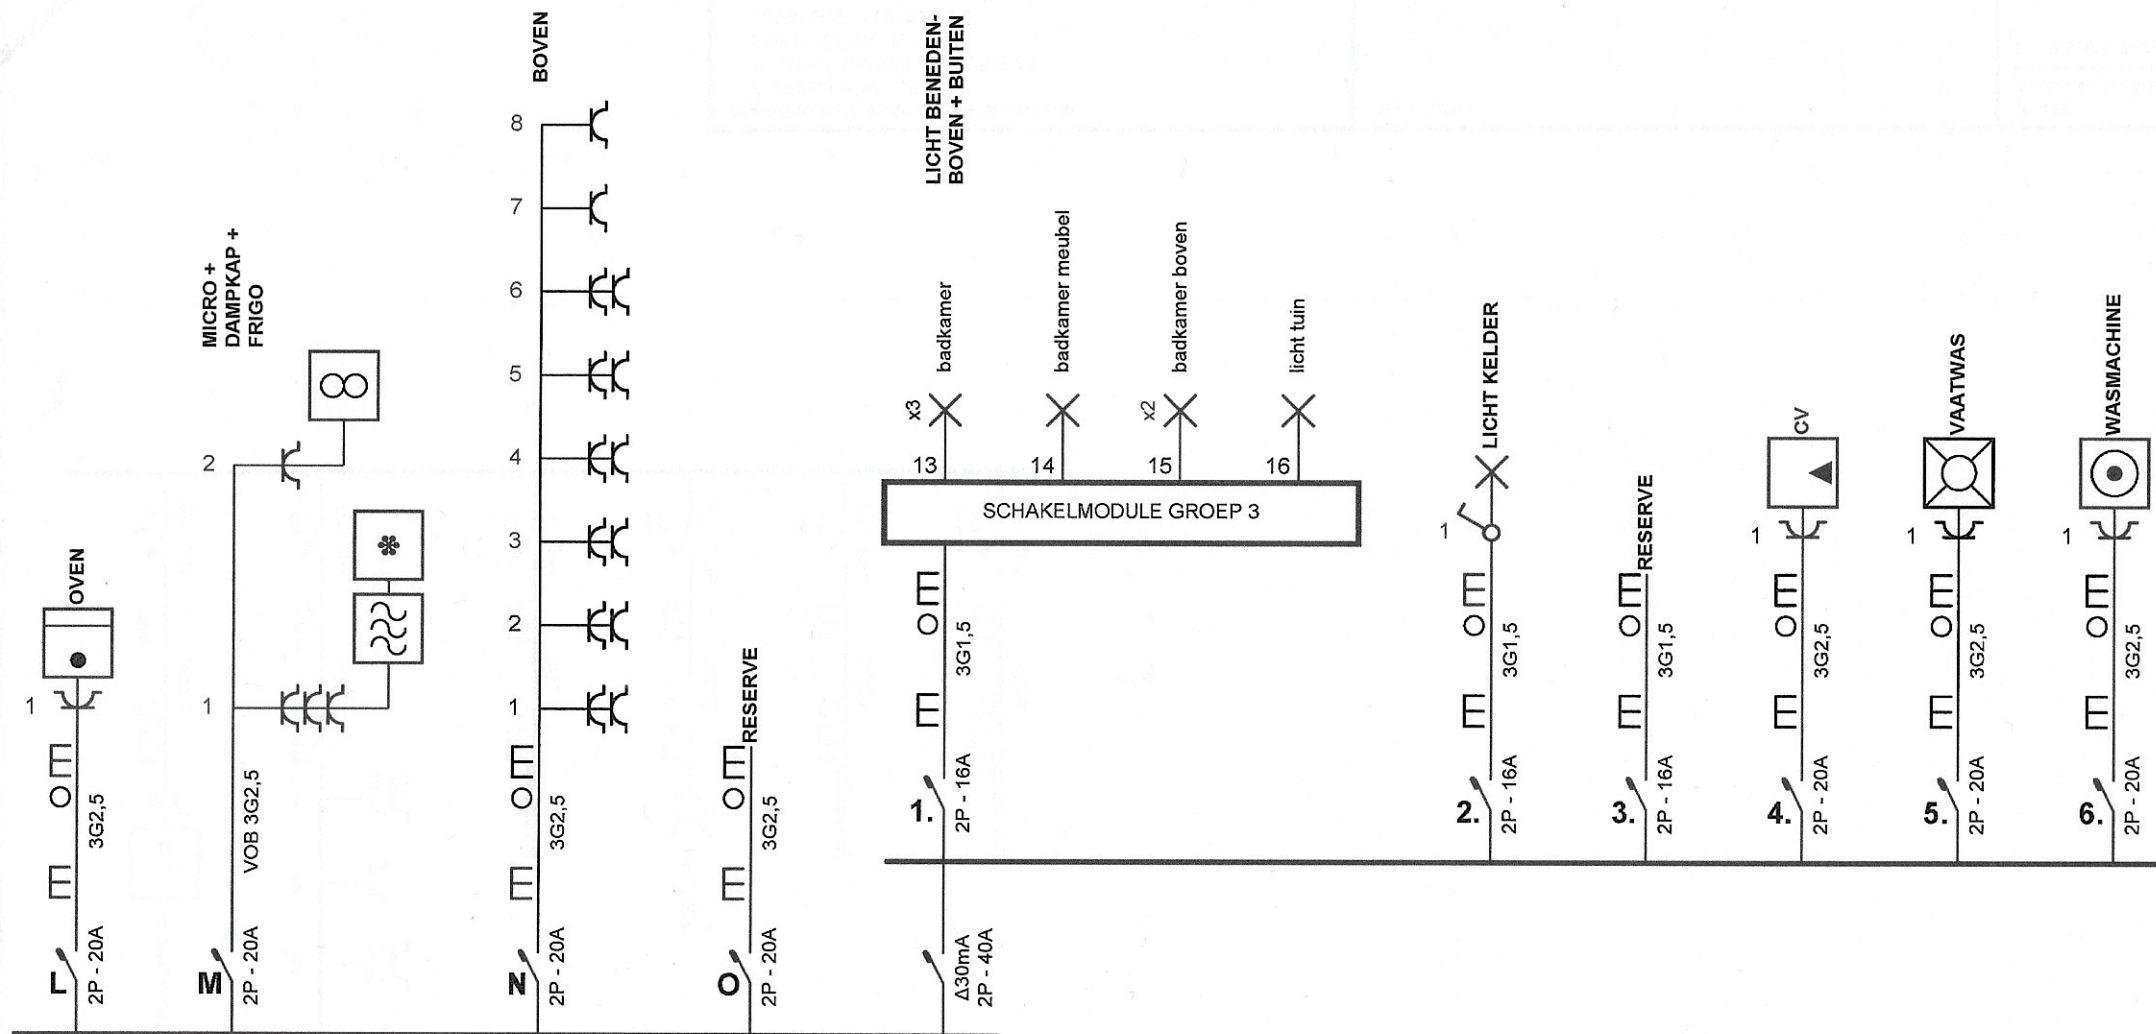

Plaats van de elektrische installatie
ROEFS WOUTER
HERENTALSESTEENWEG 41
2460 LICHTAART
GSM: 0497 608 106
e-mail: roefswouter@gmail.com

Installateur

p. 3/9
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

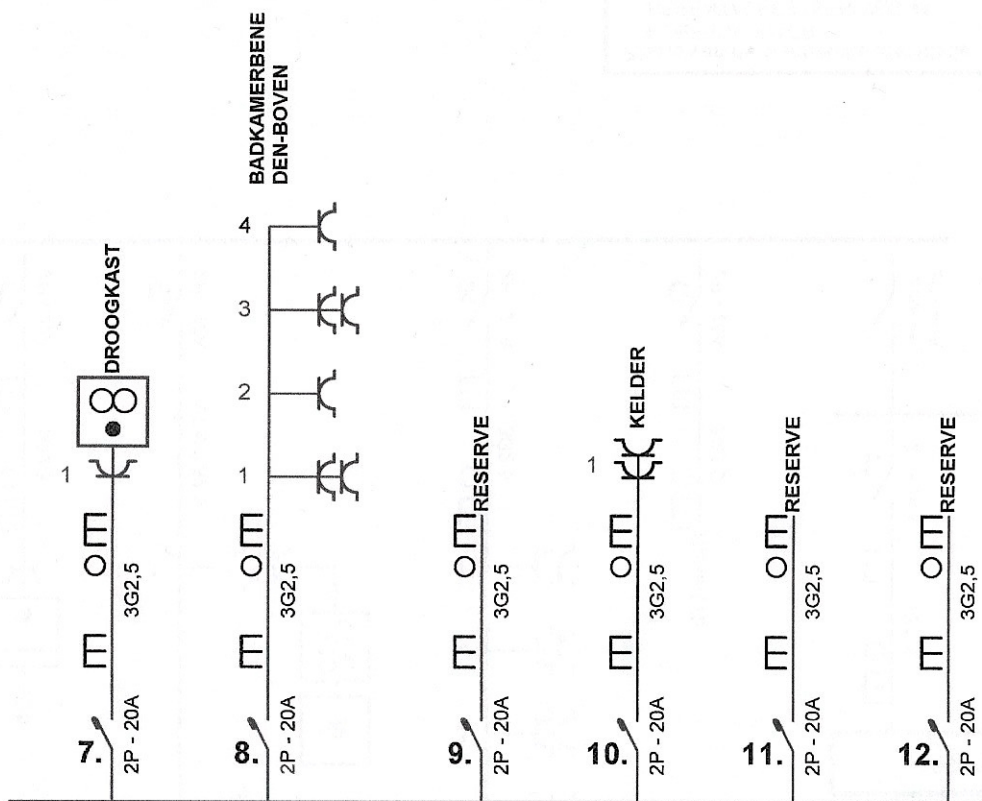

Plaats van de elektrische installatie
 ROEFS WOUTER
 HERENTALSESTEENWEG 41
 2460 LICHTAART
 GSM: 0497 608 106
 e-mail: roefswouter@gmail.com

Installateur

p. 4/9
 Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz



X
21

KELDER

10.1


2.1



Plaats van de elektrische installatie
ROEFS WOUTER
HERENTALSESTEENWEG 41
2460 LICHTAART
GSM: 0497 608 106
e-mail: roefswouter@gmail.com

Installateur


p. 5/9
Situatieschema
2 x 230V ~ 50Hz

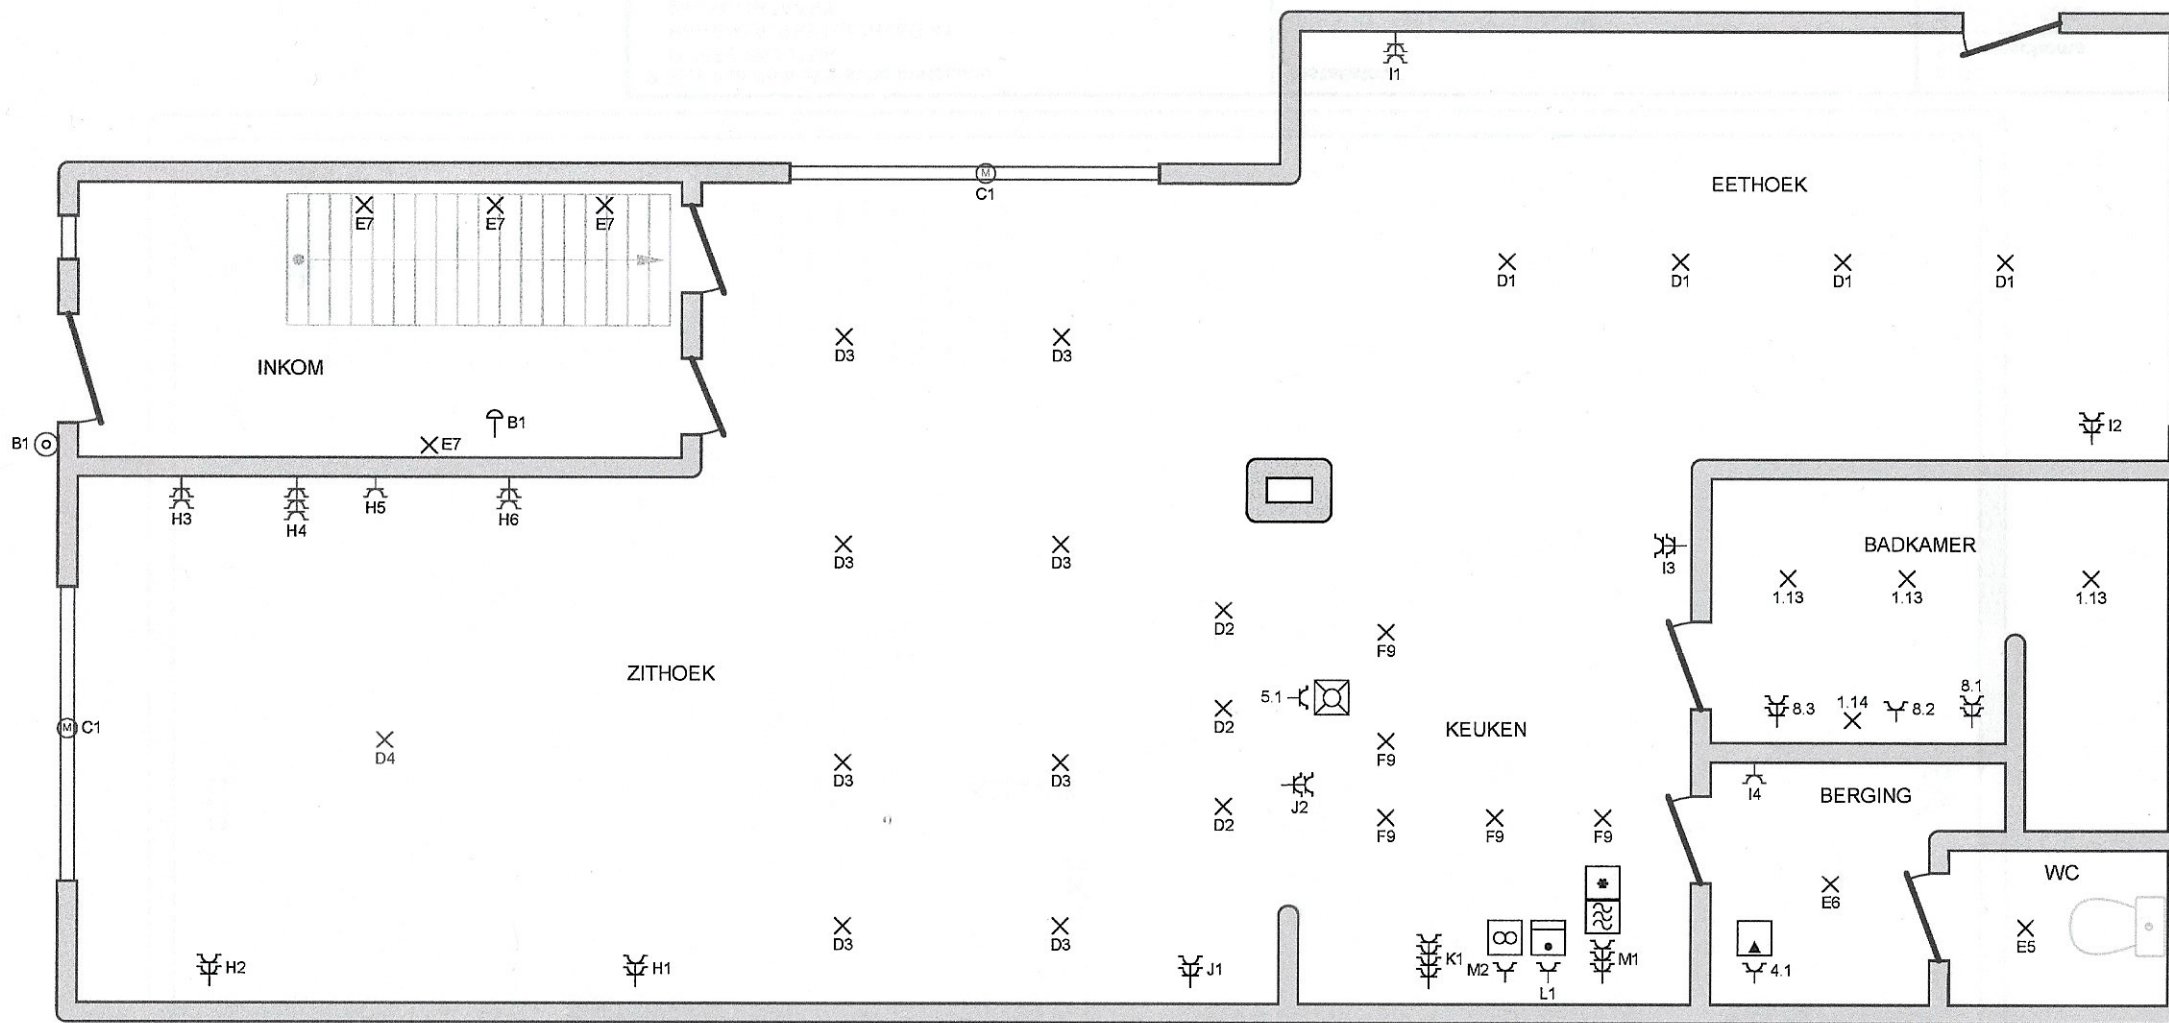

Plaats van de elektrische installatie
 ROEFS WOUTER
 HERENTALSESTEENWEG 41
 2460 LICHTAART
 GSM: 0497 608 106
 e-mail: roefswouter@gmail.com

Installateur

p. 6/9
 Situatieschema
 2 x 230V ~ 50Hz

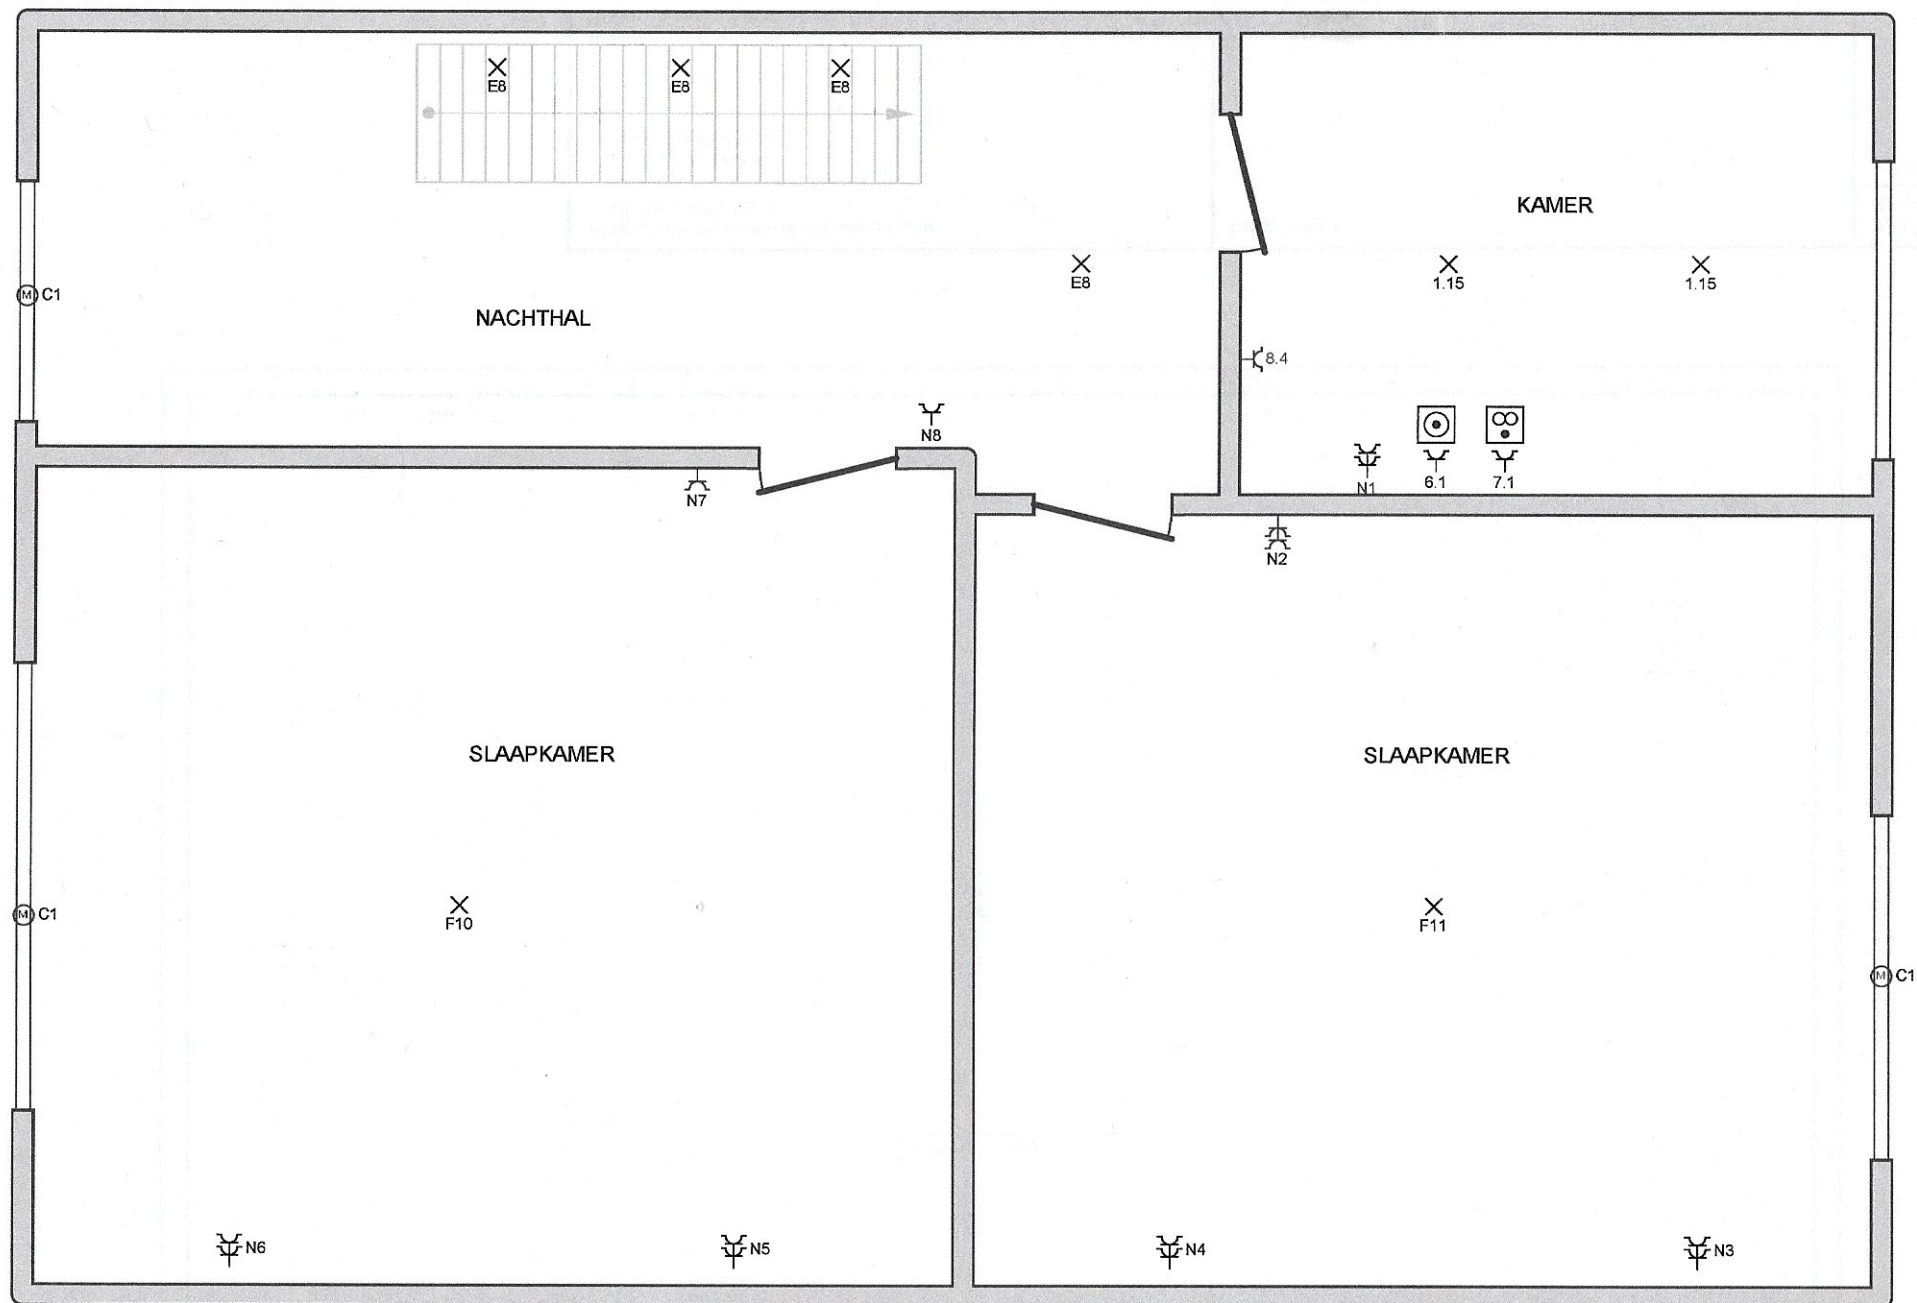

Plaats van de elektrische installatie
 ROEFS WOUTER
 HERENTALSESTEENWEG 41
 2460 LICHTAART
 GSM: 0497 608 106
 e-mail: roefswouter@gmail.com

Installateur

p. 7/9
 Situatieschema
 2 x 230V ~ 50Hz

ZOLDER

X
F12

Plaats van de elektrische installatie
ROEFS WOUTER
HERENTALSESTEENWEG 41
2460 LICHTAART
GSM: 0497 608 106
e-mail: roefswouter@gmail.com

Installateur

p. 8/9
Situatieschema
2 x 230V ~ 50Hz

A CENTRALE STURING

B BEL

C ROLLUIKEN

D LICHT LIVING + TOOG + VERANDA

E LICHT BERGING + WC + GANG + TRAP

F LICHT KEUKEN + SLK 1 + SLK 2 + ZOLDER

G RESERVE

H TV + LIVING

I EETHOEK + KEUKEN + BERGING

J KEUKEN

K WERKBLAD KEUKEN

L OVEN

M MICRO + DAMPKAP + FRIGO

N BOVEN

O RESERVE

1. LICHT BENEDEN-BOVEN + BUITEN

2. LICHT KELDER

3. RESERVE

4. CV

5. VAATWAS

6. WASMACHINE

7. DROOGKAST

8. BADKAMERBENEDEN-BOVEN

9. RESERVE

10. KELDER

11. RESERVE

12. RESERVE

Plaats van de elektrische installatie
ROEFS WOUTER
HERENTALSESTEENWEG 41
2460 LICHTAART
GSM: 0497 608 106
e-mail: roefswouter@gmail.com

Installateur

p. 9/9
Lijst Kringen

2 x 230V ~ 50Hz
