

Attest nr.: 407160212-1.3

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

EAN nr.:
Teller nr.: 31447457
Stand I: II:

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
volgens: AREI art. 86 / ~~AREI art. 87~~ / AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / ~~AREI art. 276~~ /

Aanvulling verslag nr.:

Aard installatie: Nieuwe / ~~Uitbreiding~~ / ~~Voorlopig~~ / ~~Bestaande~~ / ~~Verzwarend~~ / ~~Splitting meter~~ / ~~Spanningswijziging~~ / ~~Overdracht eigendom~~

Type der lokalen: Appartement 9

Plaats van onderzoek: Romain Steppestraat 84/86 - St. Amands App 9

Eigendom van:

Opdrachtgever: Wauters elektro - Schutterstraat 17 - Arendonk

Installateur: Idem

BTW: ID-kaart: Uitgereikt te: Datum:

Onderzoeker: Bart Lefeuvre Datum van onderzoek: 16/02/12

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ ~~3 x 380 V + N~~ Max. Beveiliging: 2p 40A Omschakelaar: stand: —

Hoofdbeveiliging: Zek.: xUB Schak.: ok diff. 2p 40A / 300mA

Meter-bordverbinding: kabeltype: xUB aantal geleiders: doorsnede: 10 mm²

Voedingsbekabeling: kabeltype: aantal geleiders: doorsnede: mm²

~~Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net~~ ~~Wachtbuis: geplaatst/niet geplaatst~~ ~~Isolatieplaat: aanwezig/niet aanwezig~~

Aardelektrode: Type: lus / ~~barren~~ / ~~penalen~~ / ~~horizontale geleiders~~ Sectie: 16 mm² Spreidingswaarde: 1,8 Ω

Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 13 Algemene isolatieweerstand: > 180 MΩ

Diff. schak.: algemene: 300 mA bijkomende: 30 mA

~~werkings toetsknop: in orde - niet in orde~~ ~~controle foutlus: in orde - niet in orde~~

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: ja - ~~neen~~ Staat van het vast elektrisch materieel: in orde - ~~niet in orde~~

Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking: in orde - ~~niet in orde~~

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding: in orde - ~~niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde - ~~niet in orde~~

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) ~~- toestellen~~

Zie schema's

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I)

N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.

N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

Geen inbreuken

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op: 16/02/2017, zoals voorzien door art. 271 van het AREI,

alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde

~~inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.~~

voor de directeur,
de onderzoeker

LEFEVRE Bart
GSM: 04956290036
bart.lefevre@ocb.be

erkend controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kortich

Tel. 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10


www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49

NOTA ONDERNEMINGEN: krachtens art. 638 lb v/h ARAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het Comité voor Veiligheid. Gezondheid en veiligheid van de werkdag.
NOTA HULPDIENST: EIGENAARS: Krachten niet AREI bent u verplicht
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrisch

1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie
2) elke wijziging aan de elektr. installatie te melden in het dossier
rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

OC0050406/005/007

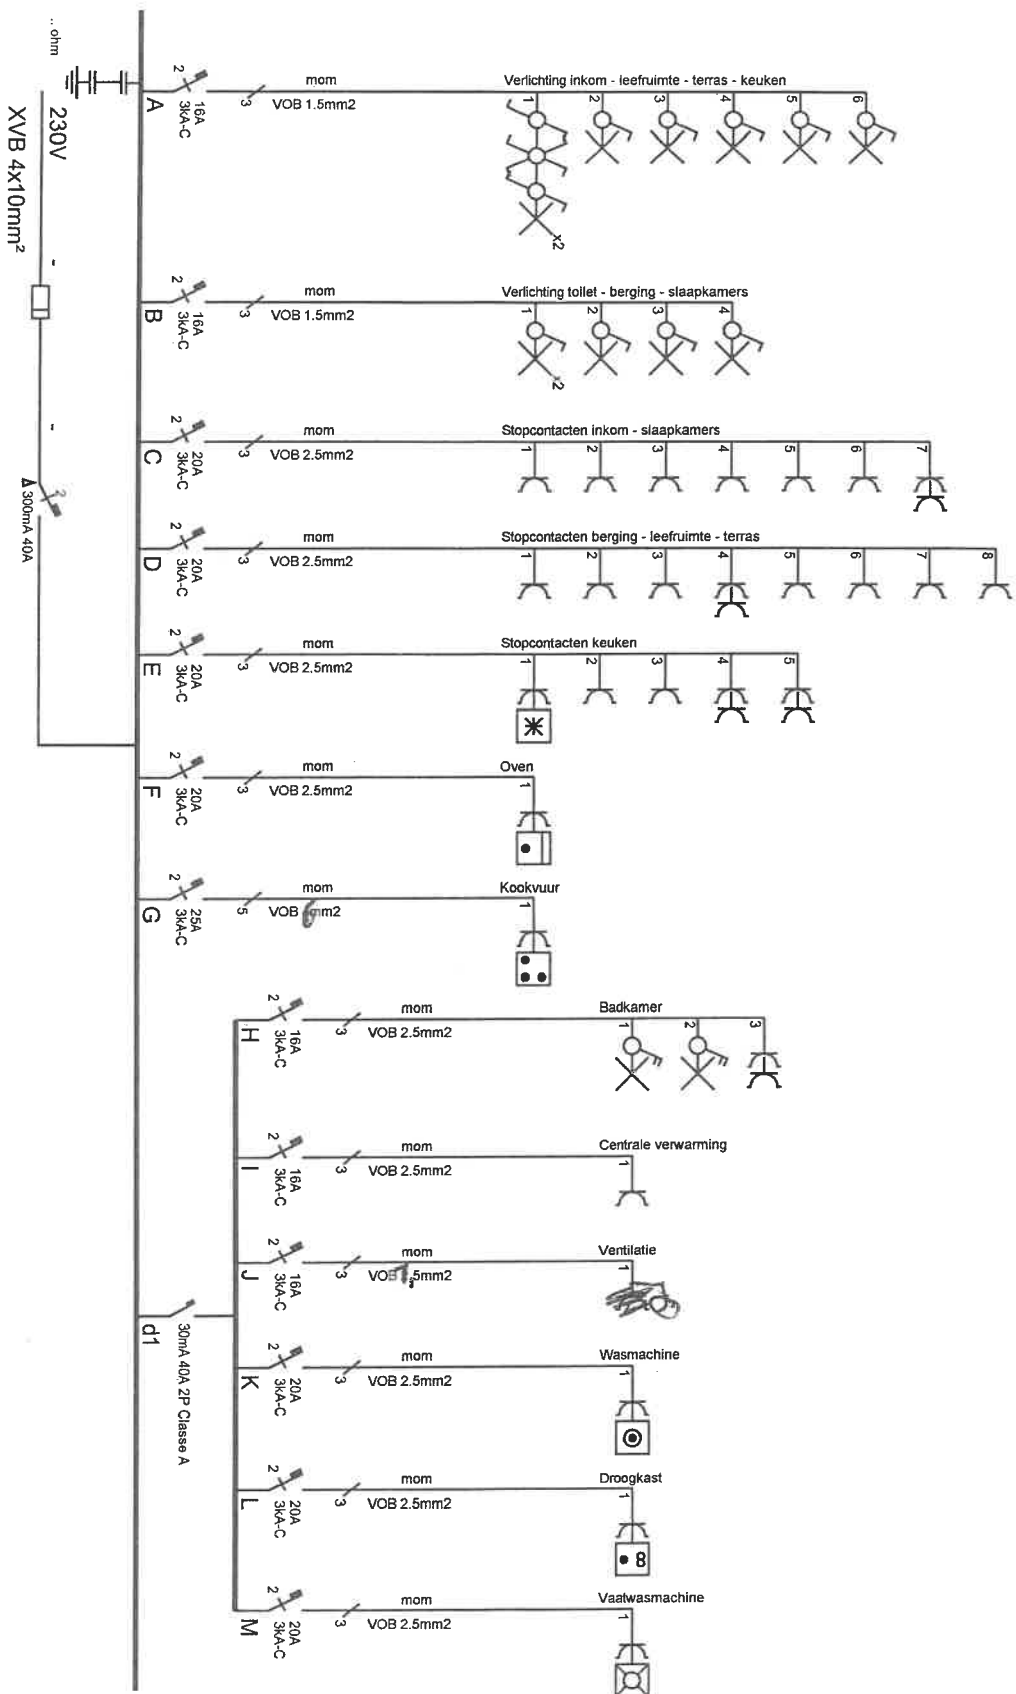

Afgelv. erkend organisme

LEFEVERE BartGSM: 0496729003b
bart.lefevere@ocob.be

16/2/12

App. 9

Romain Stepestraat
St.-Amands

Verantw. uitvoering

16 / 02 / 2012

Wauters Elektro bvba

Schutterstraat 17 2370 Arendonk

tel: 014 / 672070

fax: 014 / 672135

e-mail: info@wauterselektro.be

btw: 471.839.276

