

BTV BRUSSEL
Ruisbroeksesteenweg 75
1190 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Antwerpen

U. ref. _____

VERSLAG NR.: 34130793/09

ADRES INSTALLATIE: 2300 Tuenhout
Steenweg op Gierle 119 B2
EIGENAAR: Groos Stijn

OPDRACHTGEVER: idem

Adres: _____

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

Ref.: _____ Teller nr. 233725

Index: _____

Datum van het onderzoek: 23-07-2013 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

~~(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art.276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorsch. DNB)~~

Aard installatie: ~~Nieuwe - Uitbreiding~~ ~~Wijziging~~ ~~Voorlopig~~ ~~Verzwaring~~ Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: *App. 2^{de} verdieping*

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230V mono V Bescherming van de aansluiting aut max 40 A

bedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm²

Alg. schakelaar: type AOS60A/300mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 7; RA: 10 Ohm; RI tot 1 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING: zie schema's in bijlage.

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: Geen.

PROCES-VERBAAL VAN HET

GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 23-07-2038 (art. 271 ARE) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2. De installatie is niet conform.

De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is nist conform.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER:

nr. + naam + handtekening

FORM. 382-02/2013

De directeur.




3w1130723/02



Jan Gijvers 341

23-07-2013

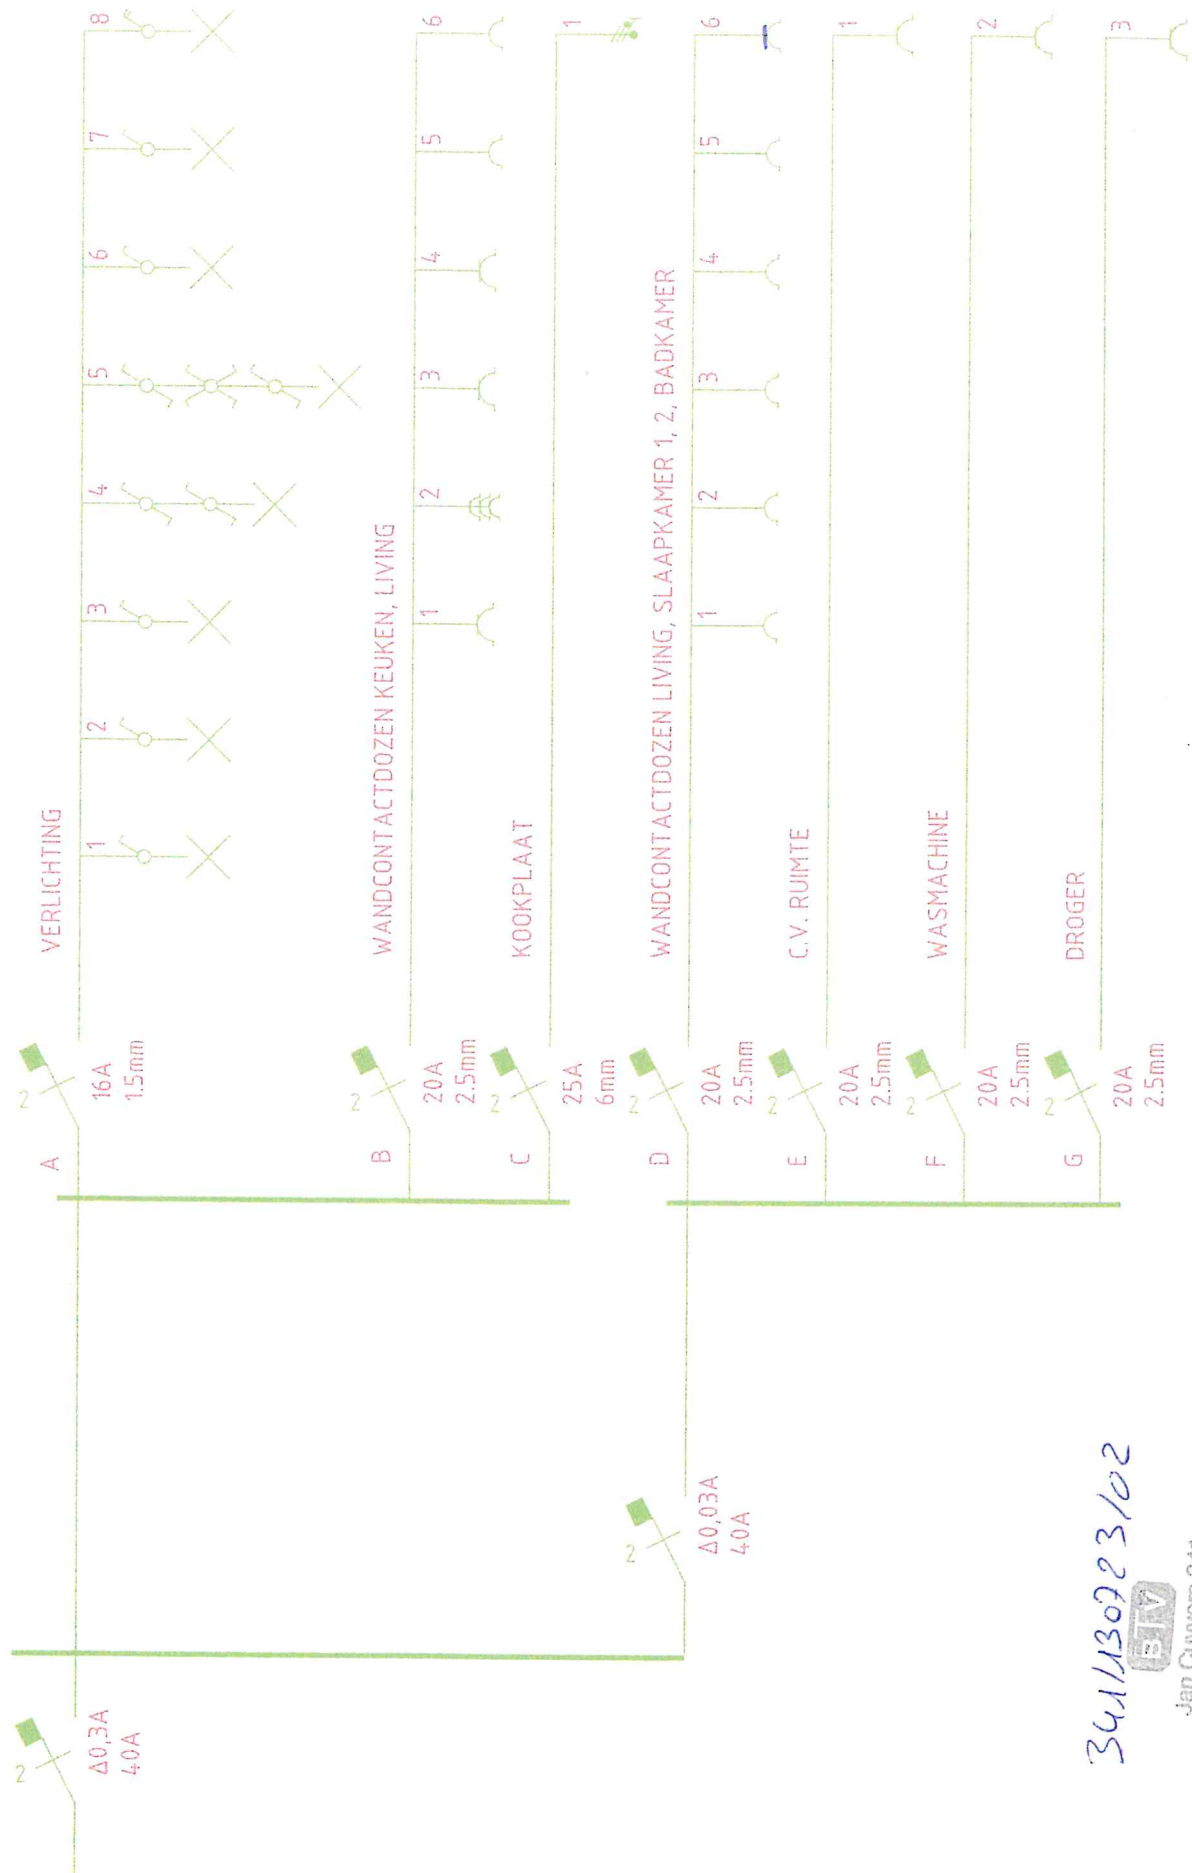

341130723/02



Jan Cuyvers 341

23-07-2013
