



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

☐ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02/380.52.71 - fax 02/380.89.86

☒ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056/35.76.76 - fax 056/35.68.87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. 214856

Ref. verslag RAP BD 20161213-2C



Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

- ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270)
- ☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	MATEXI - ROZENGAARD		Voornaam		Postnr	9300
Adres	Koolzaadstraat 2/4 - APP A0.07		Gemeente	AALST		
Installateur	ELECTRA CONTRACTORS NV		Gemeente	SINT-ELOOIS-VIJVE		
BTW-nummer	BE 0869.624.596					
of identiteitskaartnr.	-	Uitreikingsdatum	- / - / -	Gemeente		
Plaats van onderzoek	MATEXI - ROZENGAARD		Postnr.	9300		
Adres	Koolzaadstraat 2/4 - APP A0.07		Gemeente	AALST		
EAN-code			Elektriciteits verdelers			
Type installatie	☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten ☒ wooneenheid (huis, appartement, andere) ☐ huishoudelijke werkeenheid ☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid					
Algemene beschrijving van de aansluiting						
U _{nom} (V ac/dc)	1N400V	2x	2P AUT 16A - 1,5mm ²			
Ø voedingskabel (mm ²)	4x10mm ²	4x	2P AUT 20A - 2,5mm ²			
I _{nom} aansluiting (A)	40A MAX	1x	2P AUT 32A - 6mm ²			
Type alg. schakelaar	ALG. DIFF	VIA DIFF 30mA				
Aantal borden	1	4x	2P AUT 20A - 2,5mm ²			
Aantal eindstroombanen	11					
Type aardelektrode	LUS					
Algemene diff.stroom.inr.	2P 40A 300mA					
Bijkomende diff.stroom.inr.	2P 40A 30mA					
Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :						
Metingen Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01						
Aardspreidings- weerstand :	1Ω	Isolatiweerstand (250/500/1000V) :	> 1MΩ	Werking differentieel- stroominrichting :	OK / NOK	Continuïteit PE- geleiders & equipot. :
Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)						
Inbreuken :	Geen					
Opmerkingen:	Verlichting, keuken, badkamer, CV-ketel niet geplaatst/afgewerkt.					
☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP ____ / ____ -						
Besluit						
☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïllustreerd. De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)						
☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór :						
Volgend controle- bezoek uiterlijk op:	13.12.2041	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)			Datum onderzoek:	13.12.2016

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

☐ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02/380.52.71 - fax 02/380.89.86

☒ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056/35.76.76 - fax 056/35.68.87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. 214856

Ref. verslag RAP BD 20161213-2C

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

- ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270)
- ☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwarende van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	MATEXI - ROZENGAARD	Voornaam		Postnr	9300
--	---------------------	----------	--	--------	------

Adres	Koolzaadstraat 2/4 - APP A0.07	Gemeente	AALST
-------	--------------------------------	----------	-------

Installateur	ELECTRA CONTRACTORS NV	Gemeente	SINT-ELOOIS-VIJVE
--------------	------------------------	----------	-------------------

BTW-nummer	BE 0869.624.596
------------	-----------------

of identiteitskaartnr.	-	Uitreikingsdatum	- / - / -	Gemeente	
------------------------	---	------------------	-----------	----------	--

Plaats van onderzoek	MATEXI - ROZENGAARD	Postnr.	9300
----------------------	---------------------	---------	------

Adres	Koolzaadstraat 2/4 - APP A0.07	Gemeente	AALST
-------	--------------------------------	----------	-------

Adres	Koolzaadstraat 2/4 - APP A0.07	Gemeente	AALST
-------	--------------------------------	----------	-------

EAN-code		Elektriciteits verdelers	
----------	--	-----------------------------	--

Type installatie	☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten	☒ wooneenheid (huis, appartement, andere)	☐ huishoudelijke werkeenheden	☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid
------------------	--	---	--	--

Algemene beschrijving van de aansluiting

Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen

U _{nom} (V ac/dc)	1N400V	2x	2P AUT 16A - 1,5mm ²
----------------------------	--------	----	---------------------------------

Ø voedingskabel (mm ²)	4x10mm ²	4x	2P AUT 20A - 2,5mm ²
------------------------------------	---------------------	----	---------------------------------

I _{nom} aansluiting (A)	40A MAX	1x	2P AUT 32A - 6mm ²
----------------------------------	---------	----	-------------------------------

Type alg. schakelaar	ALG. DIFF	VIA DIFF 30mA
----------------------	-----------	---------------

Aantal borden	1	4x	2P AUT 20A - 2,5mm ²
---------------	---	----	---------------------------------

Aantal eindstroombanen	11		
------------------------	----	--	--

Type aardelektrode	LUS
--------------------	-----

Algemene diff.stroom.inr.	2P 40A 300mA
---------------------------	--------------

Bijkomende diff.stroom.inr.	2P 40A 30mA
-----------------------------	-------------

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :

Metingen Meefapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01

Aardspreidingsweerstand :	1Ω	Isolatiweerstand (250/500/1000V) :	> 1MΩ	Werking differentieelstroominrichting :	OK / NOK	Continuïteit PE-geleiders & equipot. :	OK / NOK
---------------------------	----	------------------------------------	-------	---	----------	--	----------

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

Inbreuken : Geen

Opmerkingen: Verlichting, keuken, badkamer, CV-ketel niet geplaatst/afgewerkt.

☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP ____ / ____ - ____

Besluit

☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïllustreerd.

De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.


De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór :

Volgend controlebezoek uiterlijk op:	13.12.2041	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)		Datum onderzoek:	13.12.2016
--------------------------------------	------------	--	--	------------------	------------

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW
Inspecteur (n° 143)
DECAESTECKER Brecht

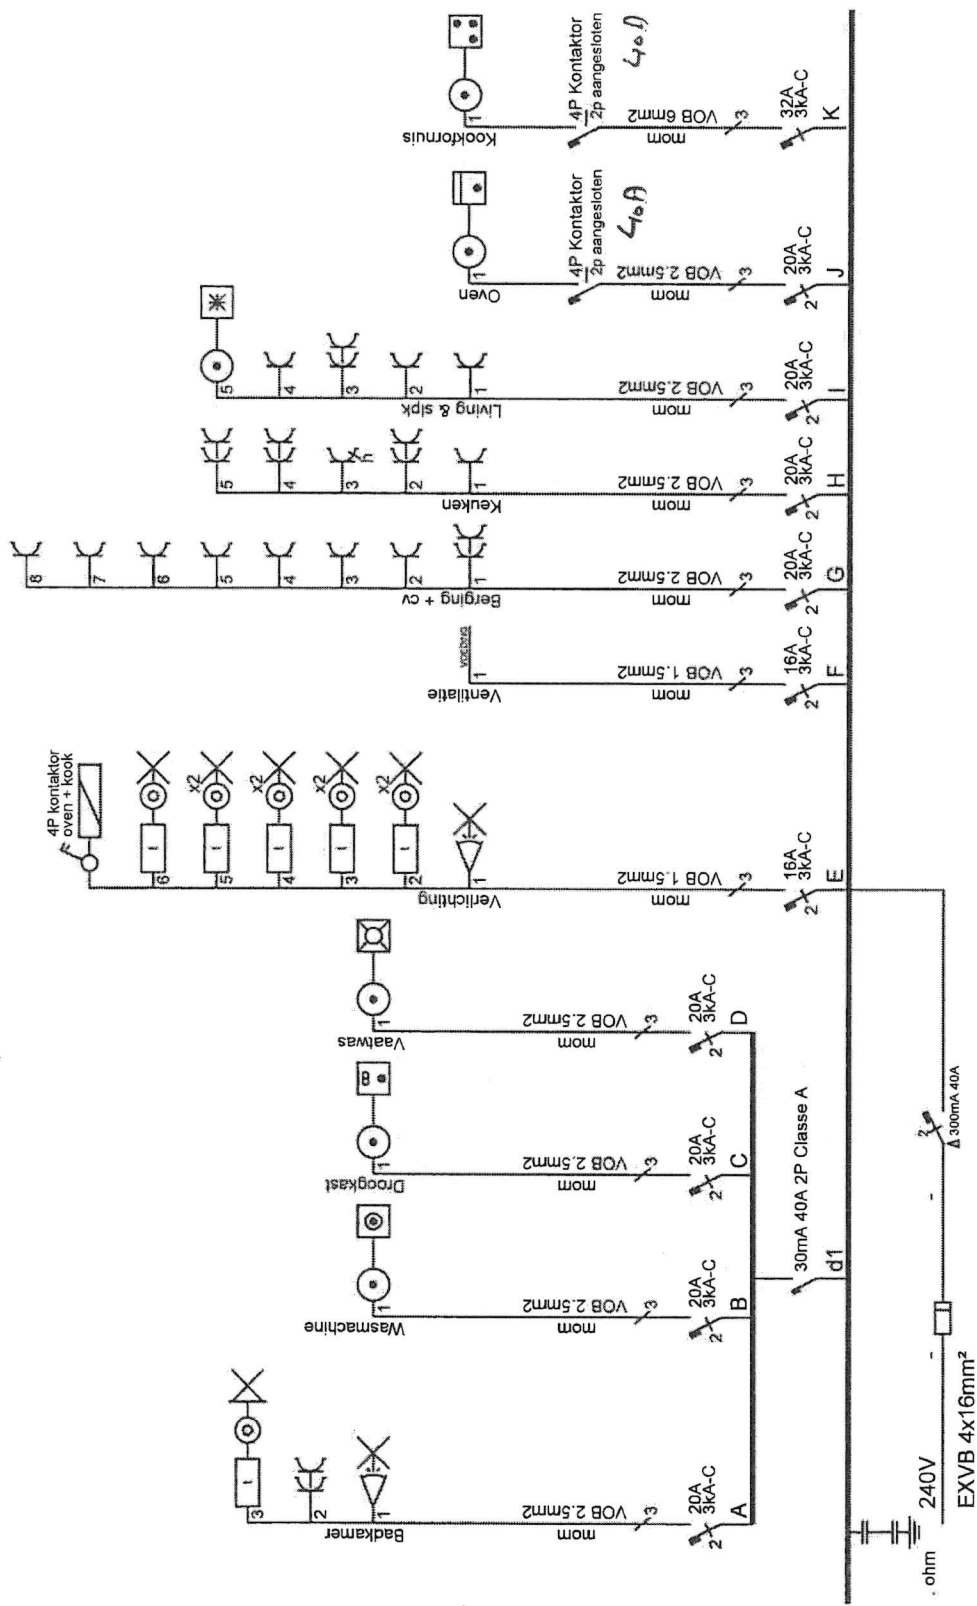

Verantw. uitvoering
J. M. / 2016

Matexi - Rozengaard
 Koolzaadstr. 2/4 (App 0.07)
 9300 Aalst

Afgev. erkend organisme
 .. / .. / 2016


Contractors
 E. Clausstraat 45
 8793 St-Eloois-Vijve
 Tel: 056/60 17 16
 BTW BE 869.624.596

J. M. / 2016

13 DEC 2016

J. VAN NEMELLEN
 KEURINGSORGANISME VZW
 inspecteur (143)
 DEGAESTECKER Brecht

Rozengaard
App A0.07
9300 Aalst
Koolzaadstraat 2/4



Vrije stopcontacten op 50cm hoogte
en 50cm uit hoeken
Geen vent. schakelaar
Thermostaat draadloos


⊙ = Drukknop met verikkerlijche
die continu brand, behalve E6


Schak. Bicino

Alles uit verdeling
Aan uit oven & kook



13 DEC 1910

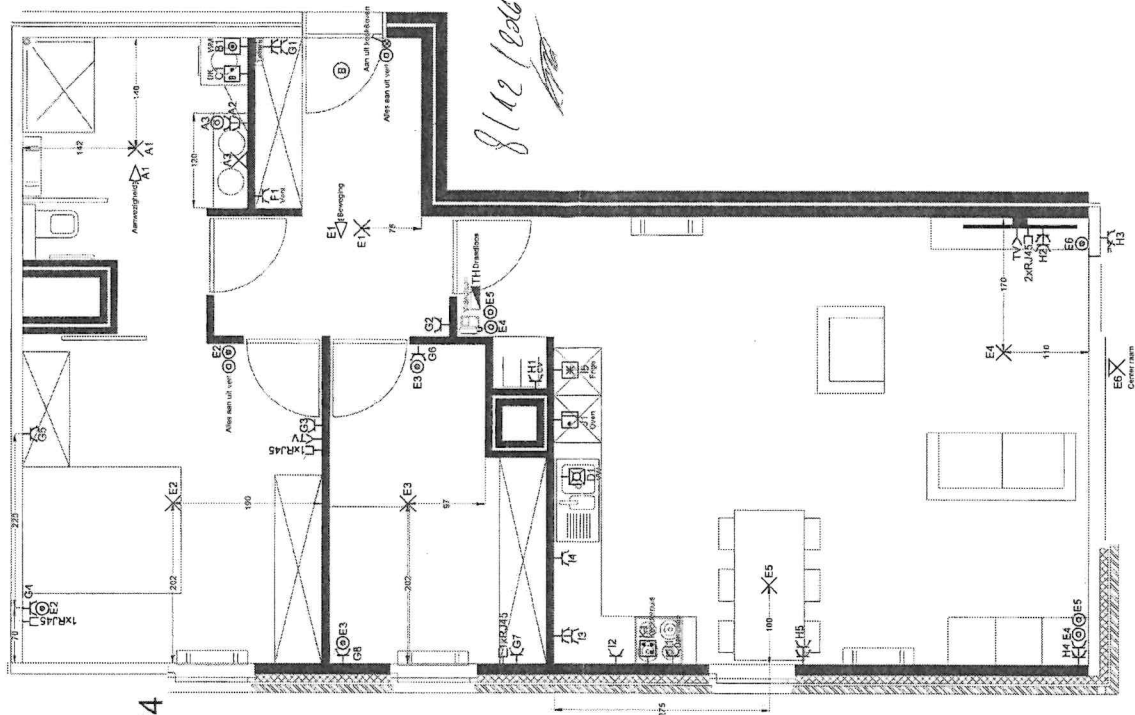

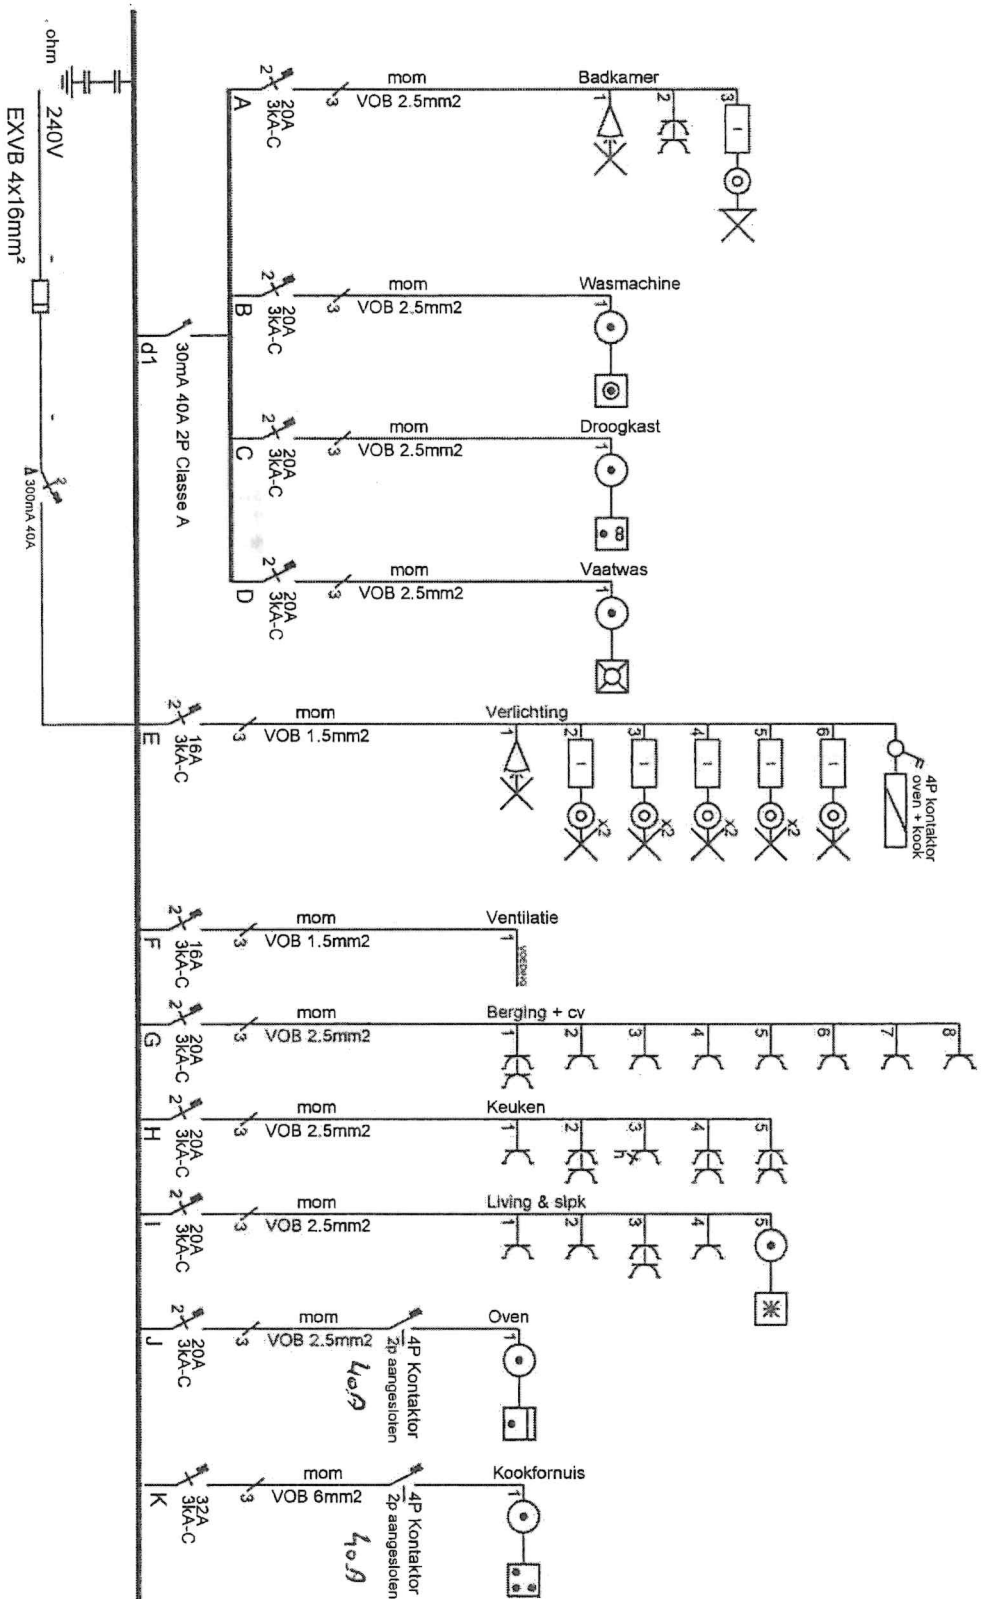

Afgev. erkend organisme

.. / .. / 2016

Matexi - Rozengaard
Koolzaadstr. 2/4 (App 0.07)
9300 Aalst

Verantw. uitvoering

8.. / 16. / 2016

Electra

NV

Contractors

E. Clausstraat 45
8793 St-Elouis-Vijve

Tel: 056/60 17 16
BTW BE 869.624.596

J. VAN NEMEN
KEURINGSORGANISME PVZ
inspecteur (143)
DECAESTECKER Brecht

13 DEC 2016
