

Mission: 71901

Client / Entreprise: SRL BAW RENOVATION
ID Externe:

No Client: 00083530

Adresse : Rue Saint-Jean 122, 1480 Tubize
Ref.PV precedent:

Contact:

TVA: BE0832073324

Date d'émission: 2024-07-18

SO/24010099

EXEMPLAIRE ORIGINAL

Num. rapport: 20240011257-V.1

RAPPORT DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ : INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT & TBT DOMESTIQUE

GENERALITE

Type d'installation: Extension/Modification

Lieu d'inspection: Av. des Grenadiers 8, 1050 Ixelles, - RCD

Référence: Livre I Chapitre 6.4.

Date d'inspection: 13/07/2024 (08:00 - 09:00)

Inspecteur: Aleksander MICHALOWSKI

Propriété :

Pers.Cont.:

Nature de l'extension/modification:

Type de locaux: Appartement

Type d'inspection: Contrôle de conformité avant mise en service

Autres Règlements:

Prochain contrôle au plus tard le: 13/07/2029

Installateur: /

T.V.A.: /

tel.:

Documents de référence:

DETAILS DU POINT DE FOURNITURE

Nom de l'entreprise distributrice d'électricité: SIBELGA

Numero EAN: Non disponible

Compteur: 50199033

Marque: ACTARIS

Index I: 002093

Index II: /

Raccordement: Souterrain ou aérien (Ondergronds of bovengronds)

Tension de serv.: 3N400V

I max. instal.: 40A

Liaison comptage-coffre de repart.

Type de cable: XVB

Prot. princ. branchement: 4P20A

Nombre de cond.: 4

Section: 10 mm²

CONTROLES VISUELS - MESURES - ESSAIS

Description Installation:

☒ voir les schemas en annexe

Etat du matériel électrique (fixation, dégradation...): en ordre

Protection contre les chocs électriques:

Contact direct: en ordre

Contact indirect: en ordre

Electrode de terre:

Contrôle des boucles de défaut: en ordre
type: piquets

Resist. d'isolement general: 744 Mohm

Resistance de dispersion: 7.02 Ohm

Continuité PE et liaison equipotentielle: en ordre

Matériel et influences externes: en ordre

Section: 16 mm²

Inter.Diff.General: 4p 40A/300mA

Scellé par plombage: en ordre

Diff. supplém.: 2p 40A/30mA

Différentiels:

Pas encore places:

Nombre de tableaux: 1

Nombre de circuit:
3

Contrôle visuel du matériel fixe ou à poste fixe dangereux: En ordre

Contrôle visuel du matériel mobile à poste fixe dangereux: Pas d'application

CONCLUSION

L'INSTALLATION EST CONFORME

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension et peut être mise en service. La prochaine visite de contrôle est à effectuer dans le délai prescrit par le Livre 1 (voir ci-dessus).



Pour le Directeur Technique,
L'inspecteur,

CONSTATATIONS

Note (N) - Remarque (O) - Infraction au Livre 1 (I) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N12 () - Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

N13 () - Sauf stipulation contraire, l'examen porte exclusivement sur l'état et le bon fonctionnement de l'installation. Sa conception sort du cadre de la mission.

N15 () - Le temps indiqué après la date d'inspection correspond à l'heure de début et l'heure de fin du contrôle. Ce temps ne comprend pas le temps de rédaction du rapport.

L'inspecteur certifie avoir suivi toutes les étapes de la check-list: OUI

Mission: 71901

Client / Entreprise: SRL BAW RENOVATION
ID Externe:

No Client: 00083530

Adresse : Rue Saint-Jean 122, 1480 Tubize
Ref.PV precedent.:

Contact:

TVA: BE0832073324

Date d'émission: 2024-07-18

SO/24010099

EXEMPLAIRE ORIGINAL

Num. rapport: 20240011257-V.1

CONSEILS/REMARQUES:

Suivant la sous-section 6.4.6.4.b.7. du Livre 1, il est obligatoire de rappeler :


- a) l'obligation de conserver le rapport dans le dossier de l'installation électrique ;
- b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique ;
- c) l'obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.

Suivant la sous-section 3.1.2.1. du Livre 1, il est important de rappeler :

Le rapport de contrôle, les schémas unifilaires et les plans de position signés sont remis au propriétaire gestionnaire ou exploitant de l'installation électrique pour faire partie du dossier de l'installation électrique. Une copie du rapport de contrôle, des schémas unifilaires et des plans de position signés sont conservés par l'organisme agréé précité pendant une période de cinq ans comme mentionné dans la sous-section 6.4.6.1. Durant la période précitée, le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant de l'installation électrique peut s'adresser à l'organisme agréé concerné pour obtenir un duplicata du rapport de contrôle, des schémas unifilaires et des plans de position signés. La délivrance d'une copie du rapport de contrôle, des schémas unifilaires et des plans de position signés peut être soumise au paiement d'une rétribution dont le montant est fixé par l'organisme agréé. Les rétributions éventuellement demandées pour la délivrance de la copie ne peuvent en aucun cas excéder le prix coûtant d'un contrôle.

Livre 1: RGIE approuvé (ou introduit) par l'arrêté royal du 08/09/2019.

27.05.2024

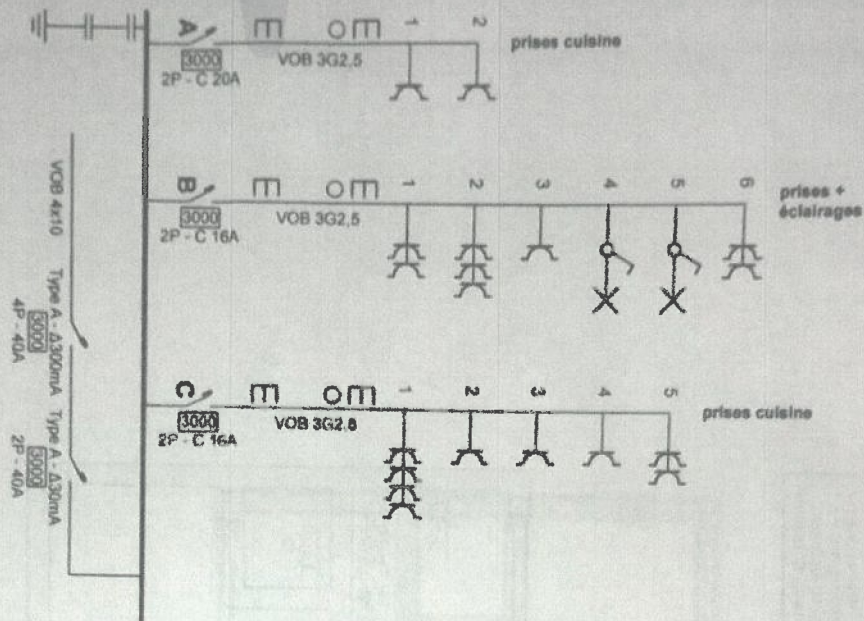

Adresse de l'installation électrique

Bierenplein de Hennen
Avenue des grenadiers 8
1050 Bruxelles
EAN 541448920703767809

Installateur

BAV Renovaton w/
Rue Saint-Jean 122
1480 Clabect
GSM: 0498 36 71 47
e-mail: bawrenovation@gmail.com
TVA BE 0832.073.328

p. 1/3
Schema unifilaire
Date: 11-07-24
3 x 400V + N - 50Hz

Installatie gecontroleerd door:
Installateur controleerd par:


INSPECT
BELGIUM

Ilgallaan 9, 3500 Hasselt
Chce de Thémont 5, 1370 Jodogne
015 860 462 - 010 280 577
Inspecteur: Aleksander MICHALOWSKI
Hardtekening / Signature

Adresse de l'installation électrique
Bâtiments de l'Armée
Avenue des généraux 8
1060 Bruxelles
EAN 541448320703767809

Installateur
BAW Renovasjon srl
Rue Saint-Jean 122
1480 Clabecq
GSM: 0496 34 71 47
e-mail: Devernasyon@gmail.com
TVA BE 0832.073.324

P. 2/3
Schéma de position
Date 11-07-24
3 x 400V + N ~ 50Hz

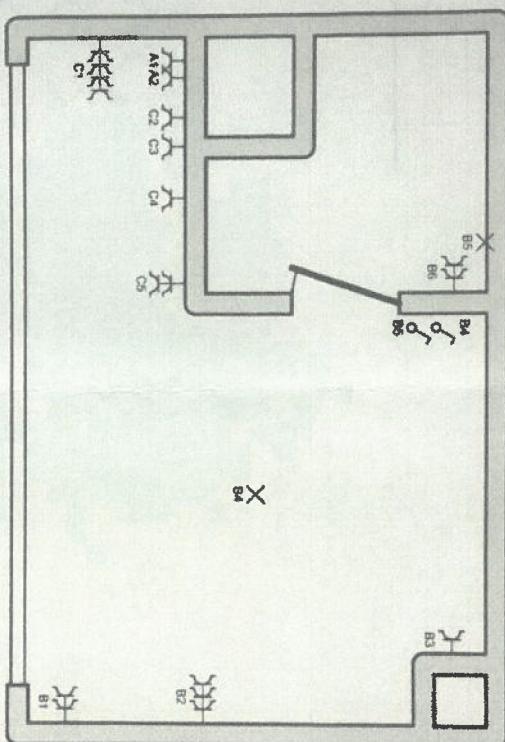

Installation gecontroleerd door:
Installation contrôlée par :
INSPECT
BELGIUM

Ilgataan 9, 3500 Hasselt
Chée de Trefmont 5, 1370 Jodogne
015 890 460 - 010 280 577
Inspecteur : Aleksander MICHALOWSKI
Handtekening / Signature
