

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Paul Vekemanslaan 90 Bus 4, 2660 Hoboken
 Naam eigenaar Eduardo Dehon
 Adres eigenaar idem,
 Type object appartement
 EAN-code niet beschikbaar
 Aard installatie wijziging
 Doel onderzoek periodiek



Het onderzoek is verricht op 27/03/2016 volgens artikel 271 en 276bis [van het AREI](#) en onze procedure(s) TP1.

Installatiegegevens

Spanning (V)	3 x 230 (3f)	Gegevens hoofdbeveiliging (A)	40
Type elektrode	pen	Waarde differentiële schakelaar(s) (mA)	300 en 30
Ø voedingsleiding (mm ²)	10	Aantal verdeelborden	1
Waarde hoofdschakelaar (A)	40	Aantal stroombanen per verdeelbord	13

Metingen

RA / ZS (Ω)	11 /	ΔI differentiële schakelaar(s) (mA)	goed
Continuïteitsmeting	goed	Isolati weerstand van de installatie (MΩ)	>0,5

Inbreuken

1. nihil

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc. zijn niet losgemaakt. Indien tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

Opmerkingen

(Ver)bouwjaar: na 2000
 Voor de omschrijving van de installatie zie schema's

Besluit

De installatie is conform het AREI.
 De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.
 De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 27/3/2041, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 27/3/2016

Naam agentonderzoeker: Mohamed Rahmouni


Handtekening:



Raadgevingen

- Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
- Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.


Stopc. slpk.
3. slpk. 1. slpk. 2. en
hal



Plaats van de elektrische installatie
Eduardo Dehon
Paul Vekemanslaan 90 Bus 1R
2660 Hoboken
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 2/4
Eendraadschema
Datum: 21-3-2016
3 x 230V ~ 50Hz

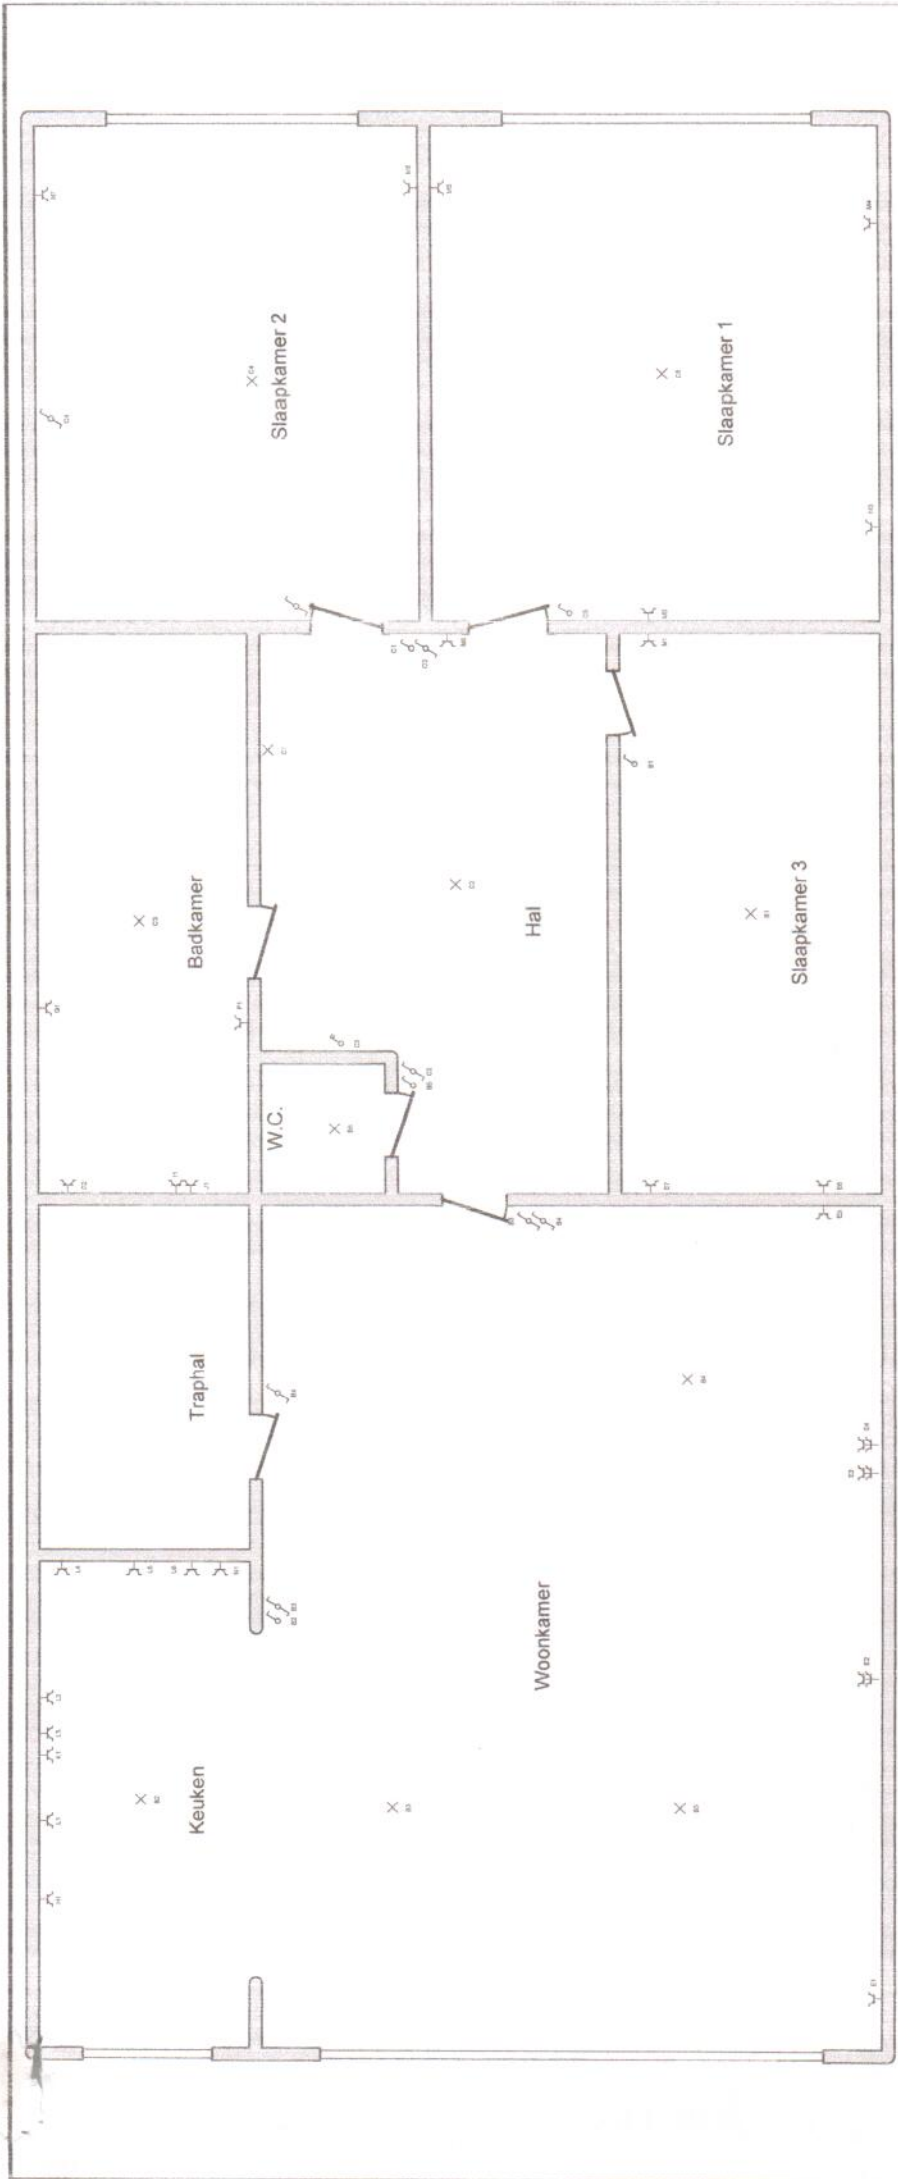


P. 3/4
Situatieschema
 Datum: 21-3-2016
 3 x 230V ~ 50Hz

Installateur

Tel.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

Plaats van de elektrische installatie
 Eduardo Dehon
 Paul Vekemanslaan 90 Bus 1R
 2660 Hoboken
 Tel.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

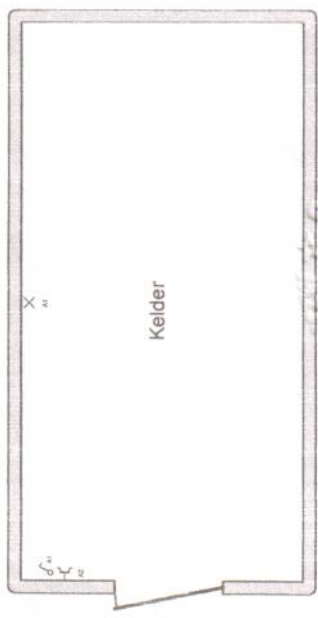

[Handwritten signature in blue ink]

A: Keider

B: Verl. Slpk.3,Woonk.,Keuken en W.C.

C: Verl. Slpk.1,Slpk2,Badk en hal

D: RES.

E: Stopc. Slpk.3 en woonk.

F: Stopc. badk.

G: Stopc. badk. en ketel

H: Vaatwas

I: Wasmachien

J: Droogmachien

K: Kookplaat

L: Stopc. keuken Werkblad, frigo en Dampkap

M: Stopc. slpk. 3,slpk. 1,slpk.2 en hal

N: Oven

Plaats van de elektrische installatie

Eduardo Dehon
Paul Vekermanslaan 90 Bus 1R
2660 Hoboken
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 4/4
Lijst Kringen

Datum: 21-3-2016

3 x 230V ~ 50Hz
