



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 19/02/2025

Inspecteur: Yoshi Van den Eynden

Mentor: -

Installateur: Vektro Projects

ID-label: -

B.T.W. nr.: BE 1017 514 558

Klantreferentie: -

Merk en type meettoestel: Metrel
ET61557

Serienummer: 19481297

Datum verslag: 19/02/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Watermanlaan
Huisnummer 3
Busnummer
Postcode 2960
Gemeente BRECHT
Land België

Eigenaar

Naam Van Den wouwer
Straatnaam Watermanlaan
Huisnummer 3
Busnummer
Postcode 2960
Gemeente BRECHT
Land België

Installateur

Naam Vektro Projects
BTW nr. BE 1017 514 558
Telefoonnummer +32 478 08 72 61
E-mail kevin@vektro-project.be

Type : woning

EAN : 54

☒ Niet meegedeeld

Teller Nr.: : 8451123

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS
Aantal borden: 1
Aardelektrode: Aardingslus

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 3N400V
Aantal kringen: 15

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 32 A

Ri algemeen: 1.376 MΩ

RE: 11.44 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

ΔI (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{Δt}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	15	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	7	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	7	OK	OK
-	-		-	-	-	-	-
300	40	Nachtteller	22,5kA2s (3000A)	A	3	NVT	NVT

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema					
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 12 De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieelschakelaars kon niet getest worden.

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

Dit gaat enkel over de verdeelbord van de nachtteller

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 19/2/2050
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 08:10 tot 08:34

De inspecteur Yoshi Van den Eynden

Yoshi Van den Eynden

ACEG VZW - 8412

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorgaan en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 19/2/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



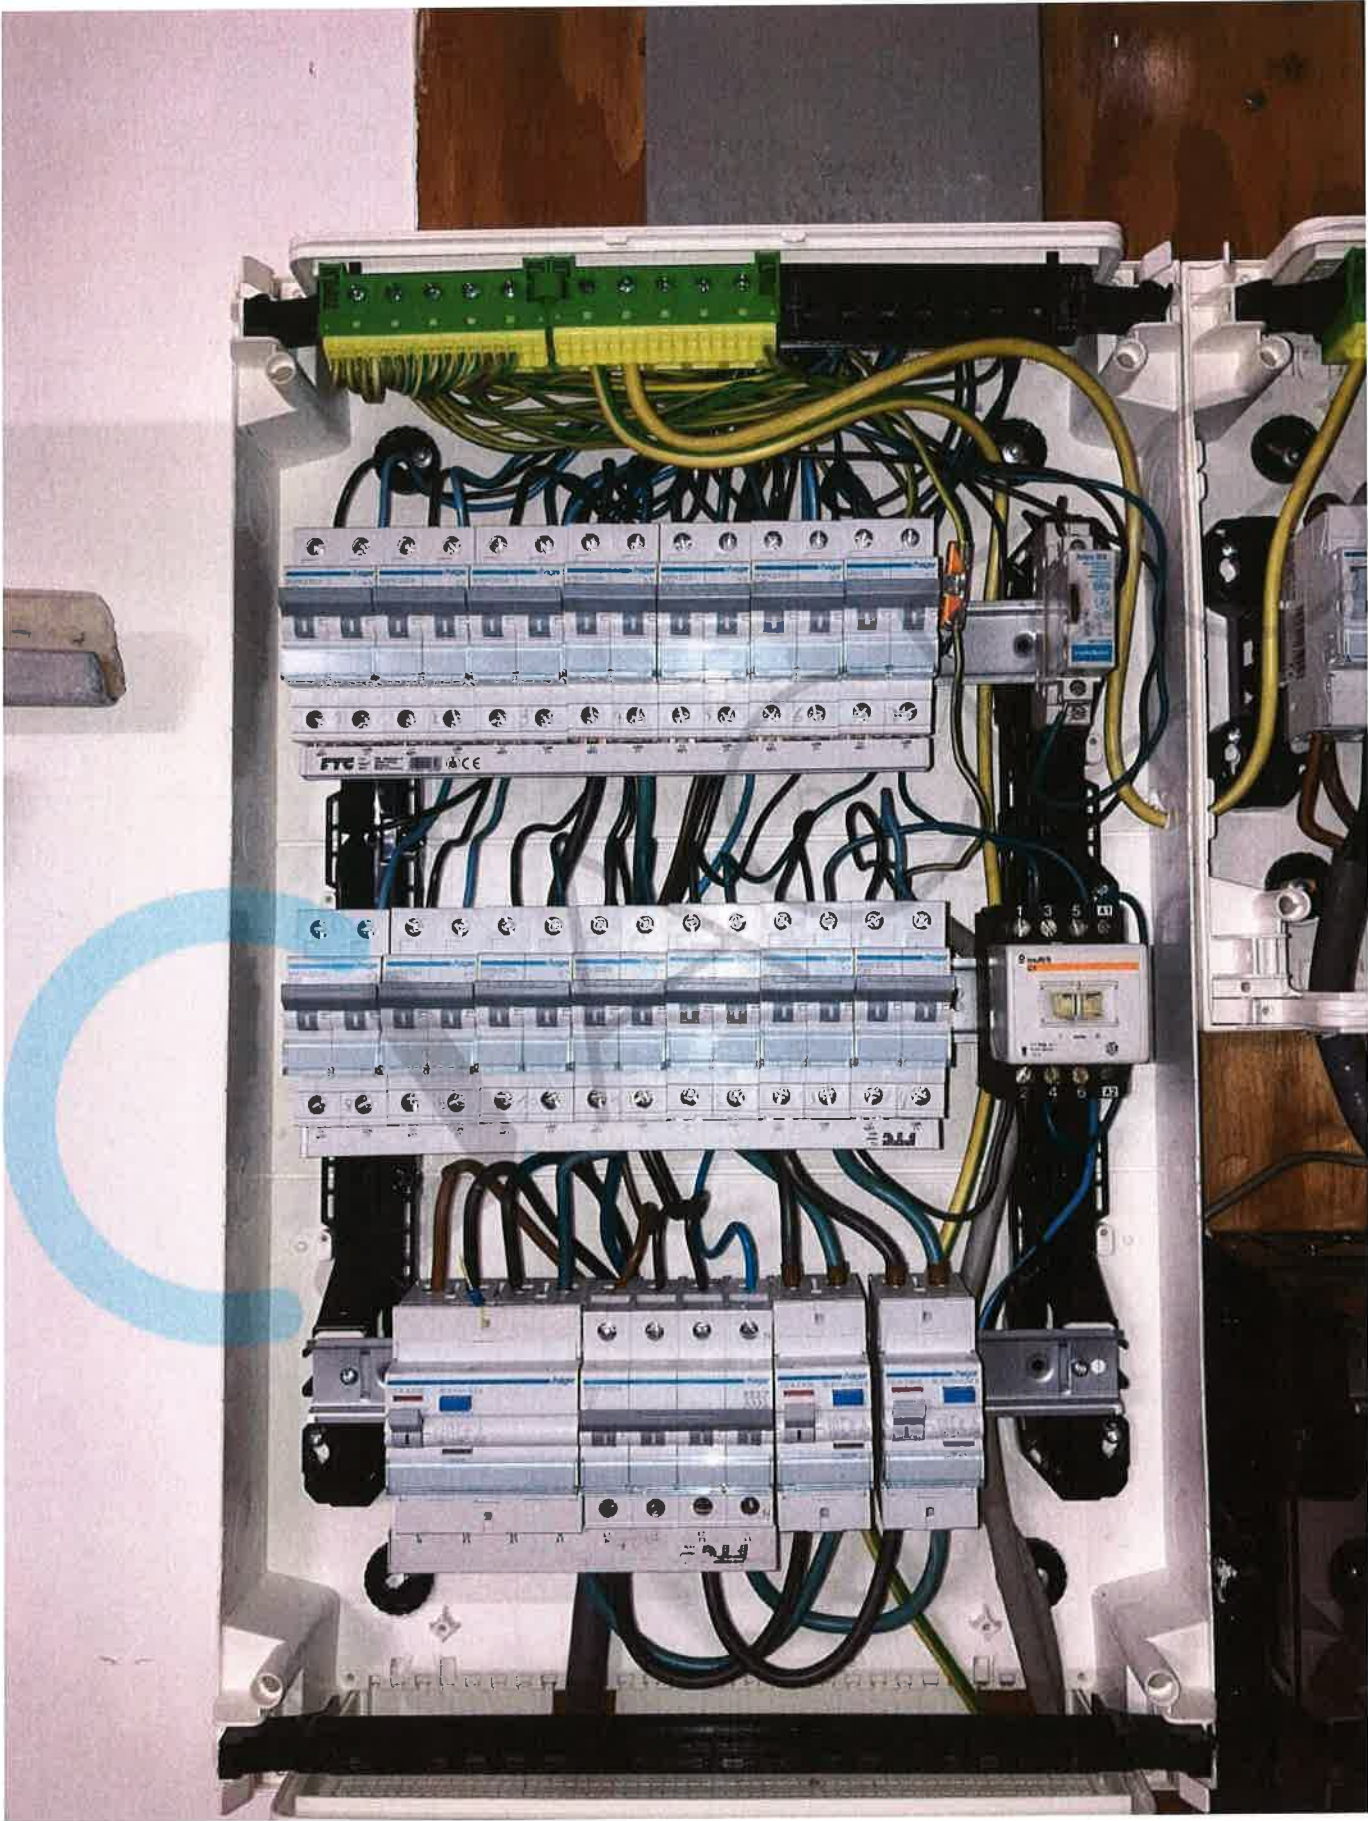
















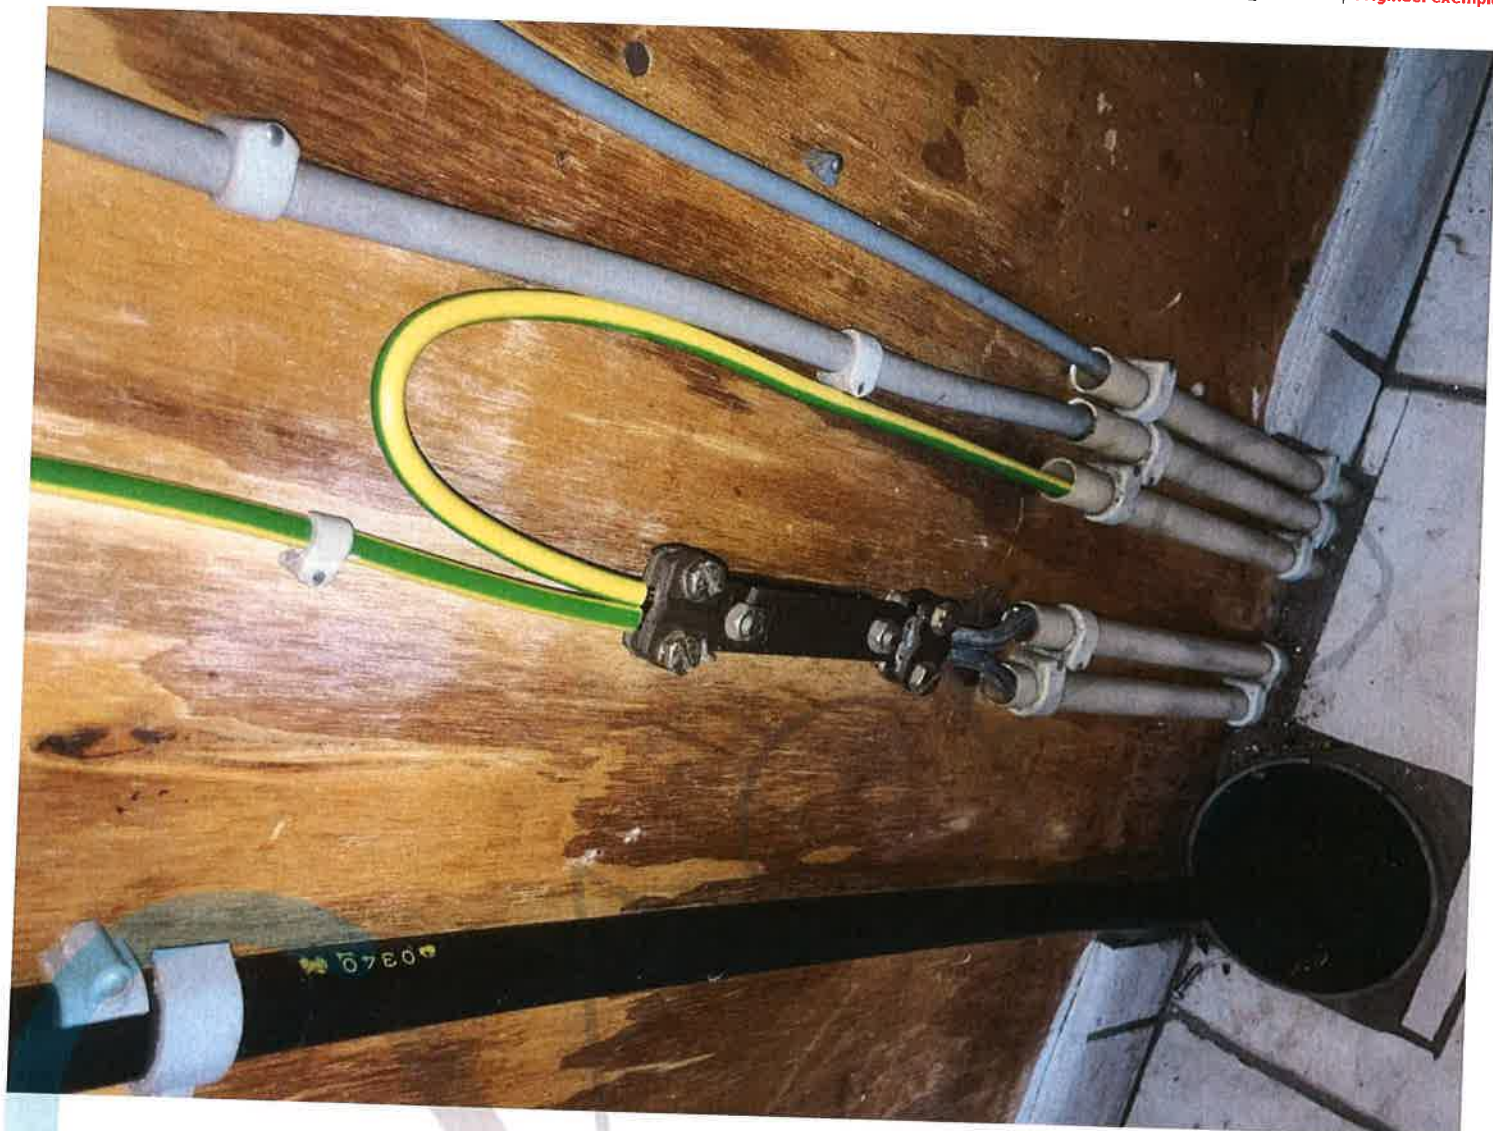


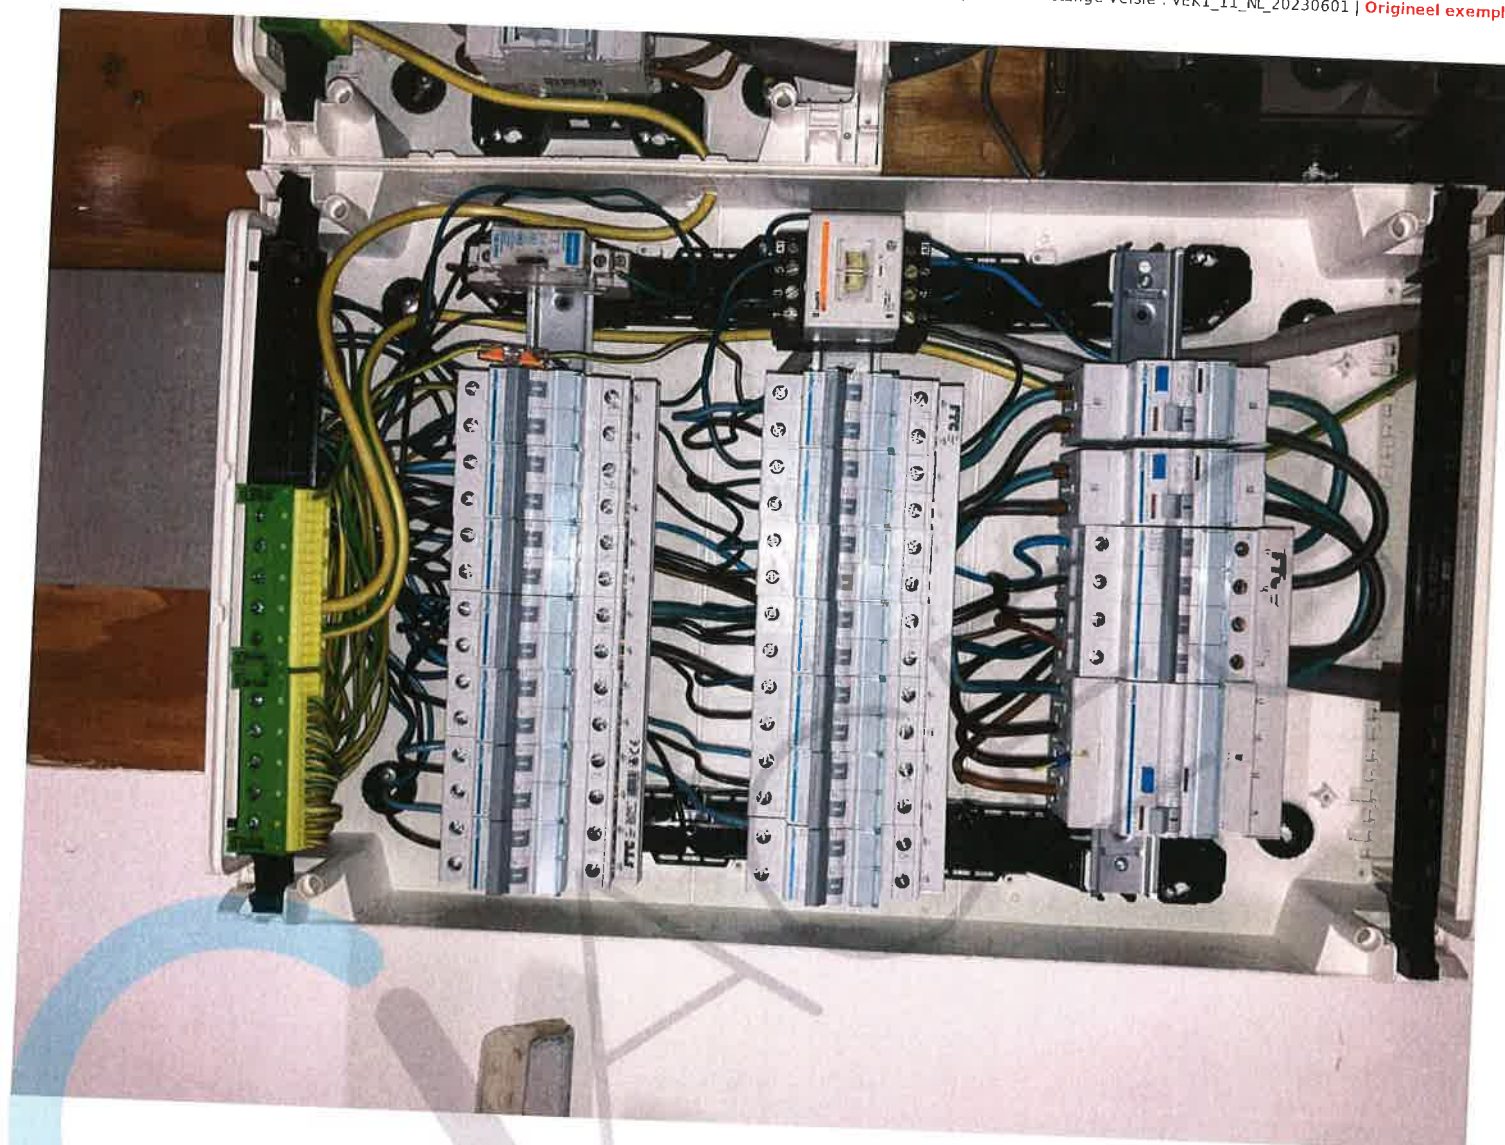

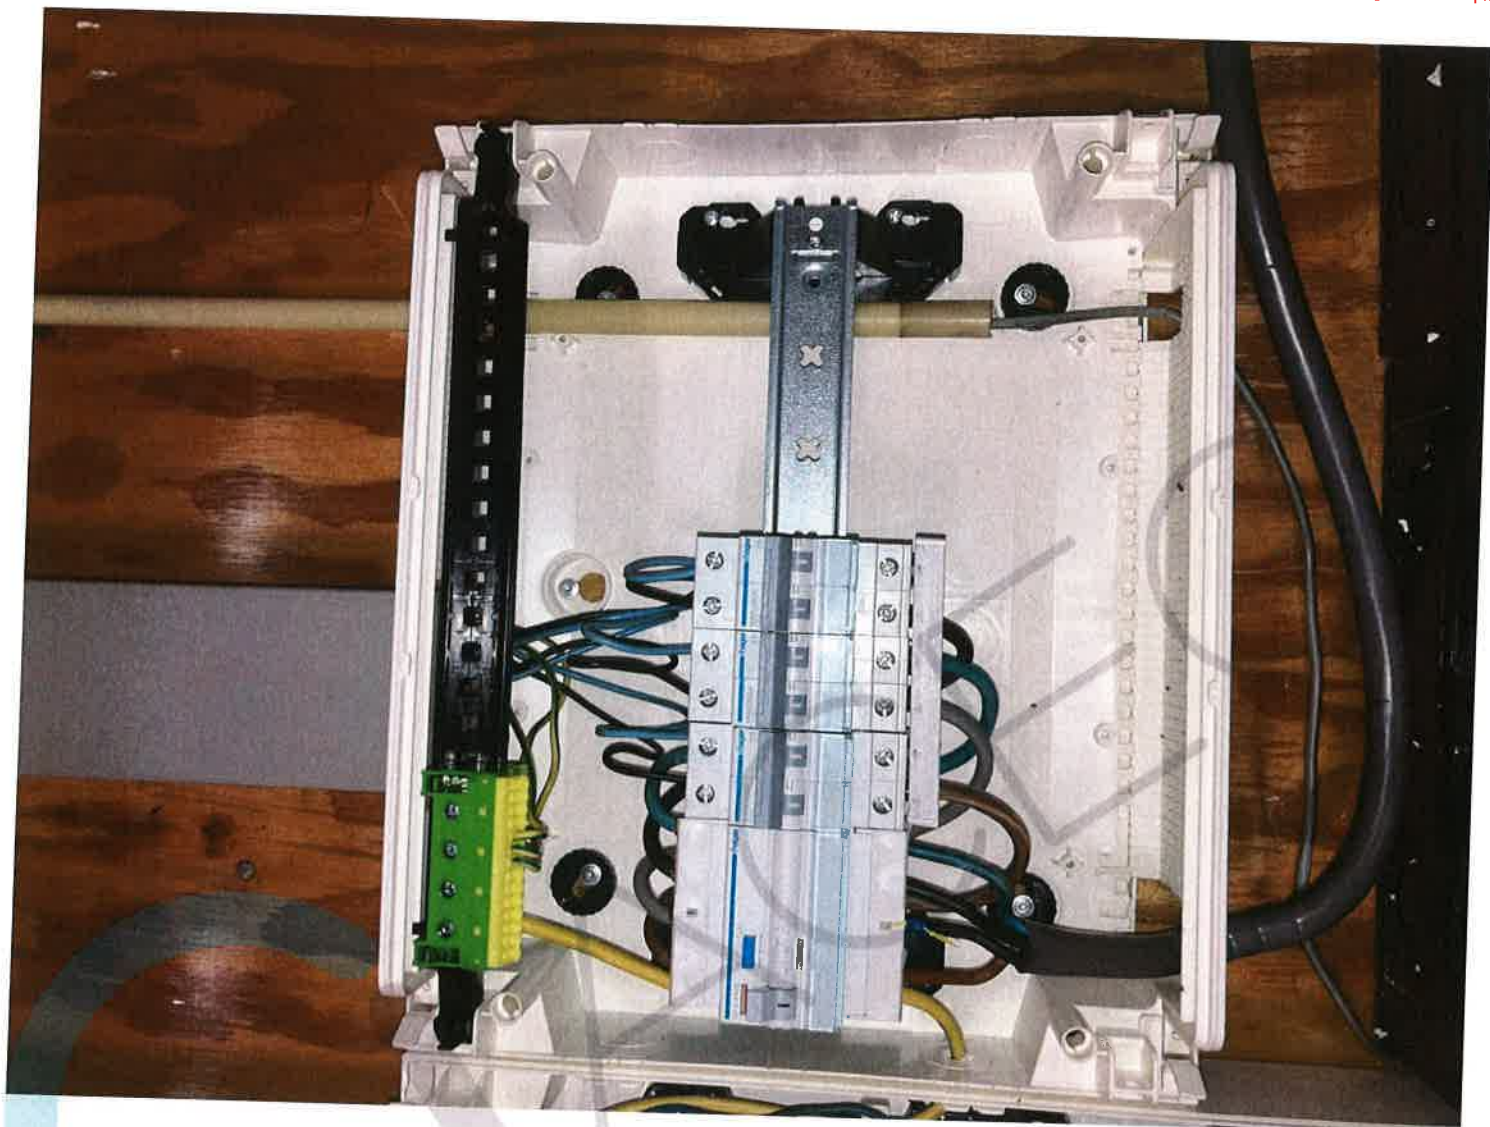





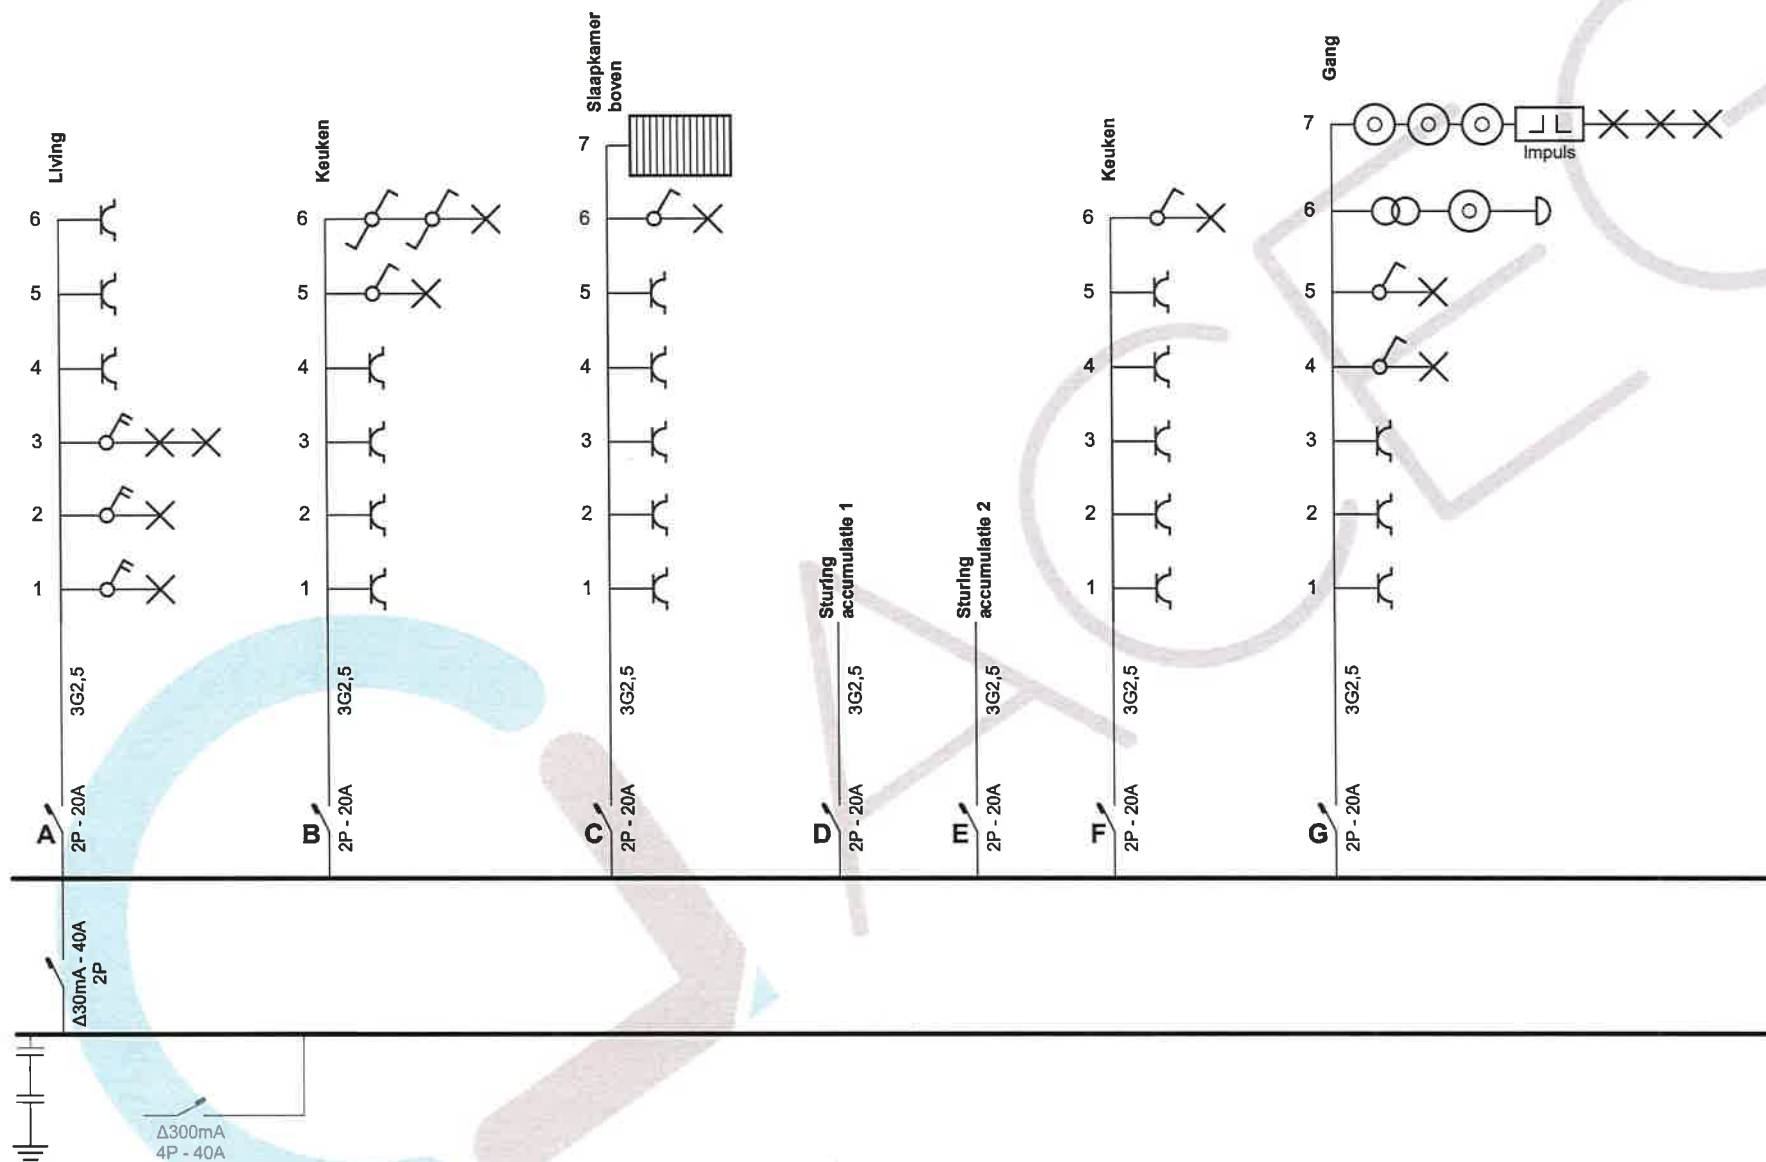


Plaats van de elektrische installatie
 Van Den Wouwer
 Watermanlaan 3
 2960 Brecht

Installateur
 Vektro - Projects BV
 Bosstraat 29
 2040 Berendrecht



p. 1/6
Eendraadschema
 3 x 400V + N ~ 50Hz

Schema's getekend door: Kevin VE ERGEON B.V.B.A. - BTW BE 0817.199.561

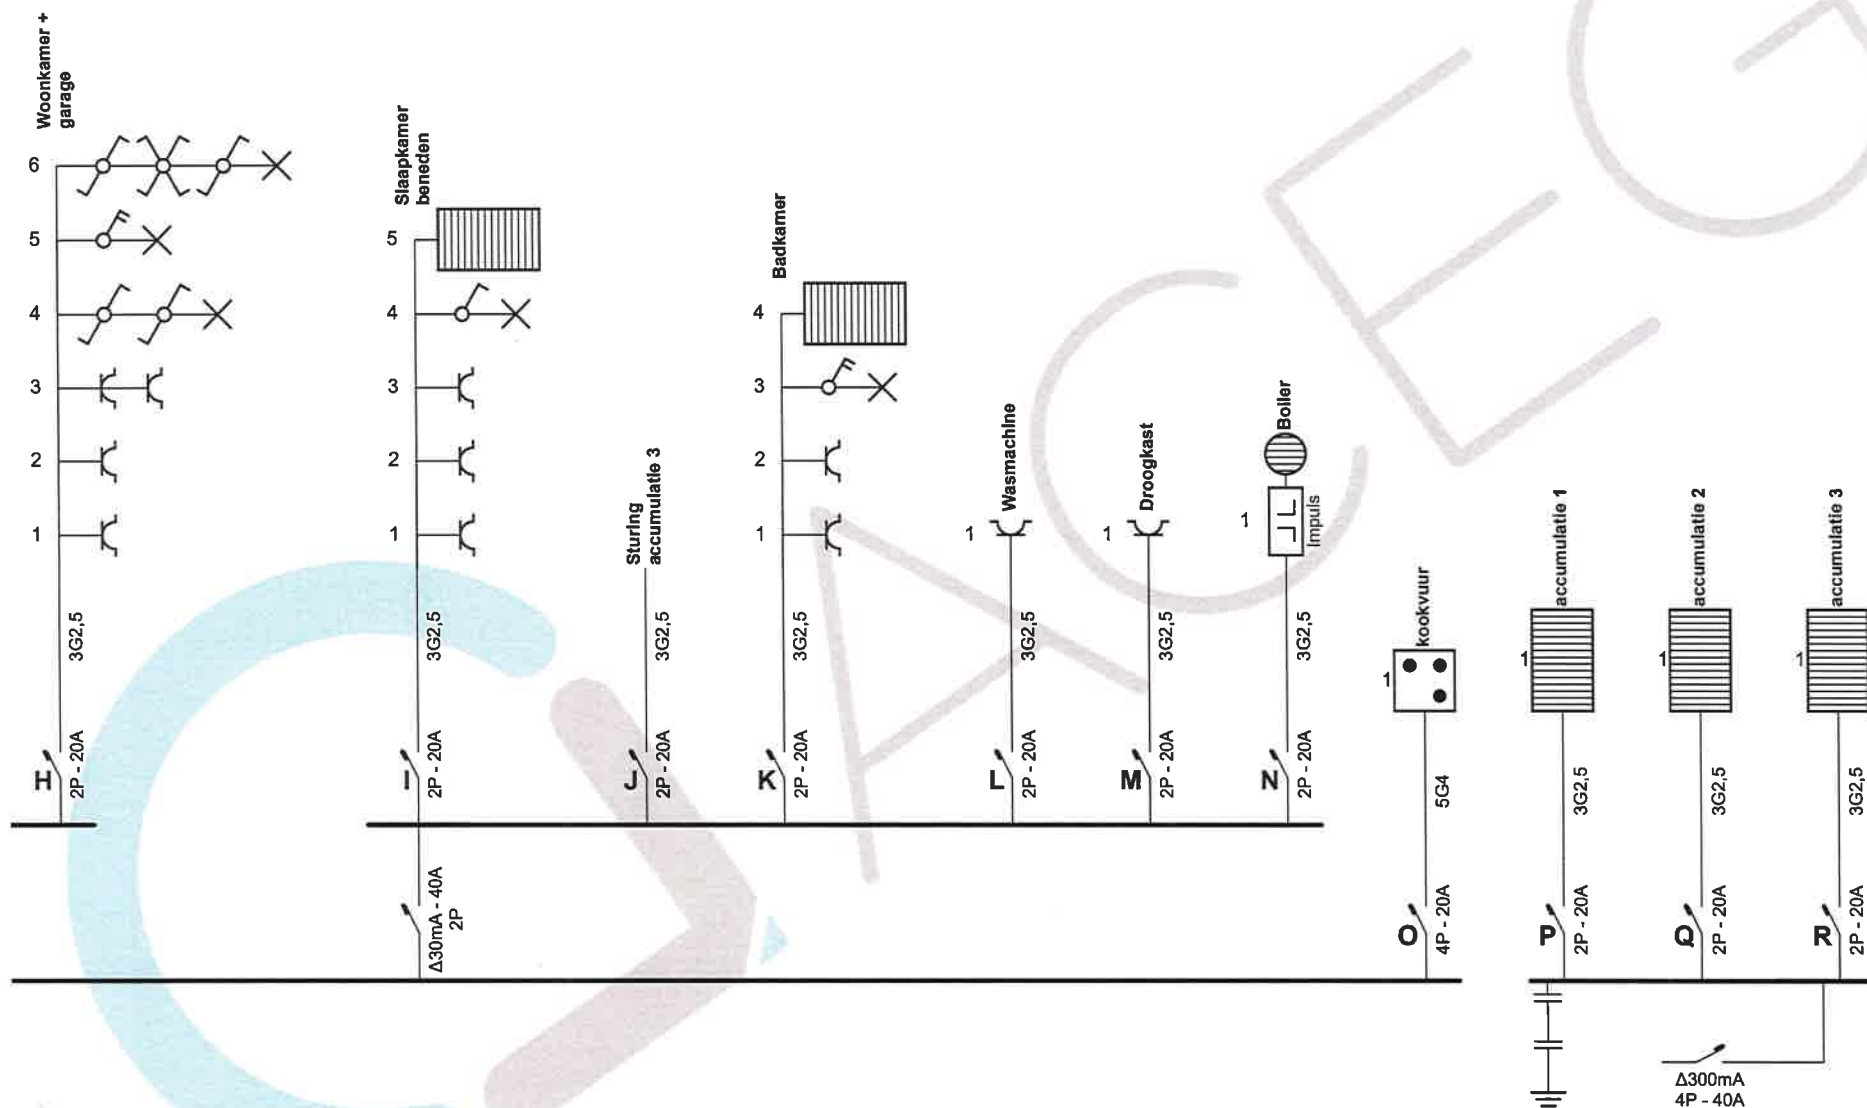

Plaats van de elektrische installatie
 Van Den Wouwer
 Watermanlaan 3
 2960 Brecht

Installateur
 Vektro - Projects BV
 Bosstraat 29
 2040 Berendrecht




p. 2/6
Eendraadschema
 3 x 400V + N ~ 50Hz

Schema's getekend door: Kevin VE ERGEON B.V.B.A. - BTW BE 0817.199.561

19/02/2025

Yoshi Van den Eynden

ACEG VZW - P412

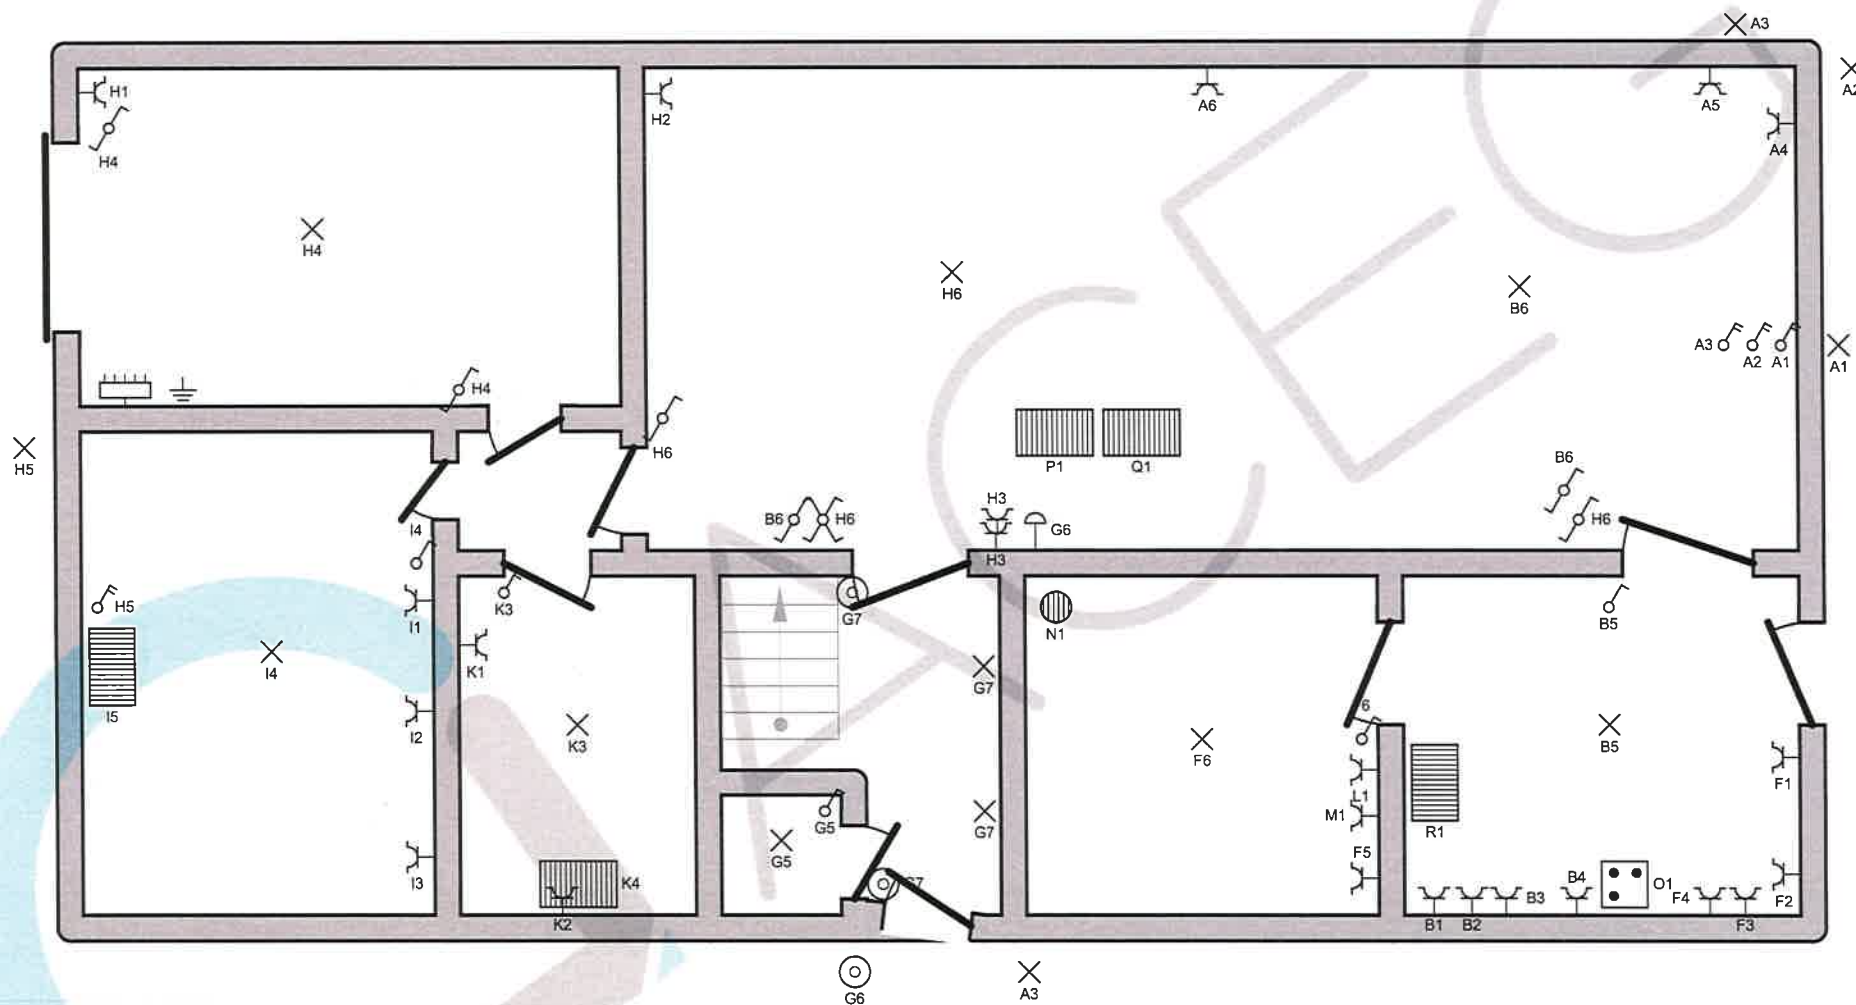


Plaats van de elektrische installatie
 Van Den Wouwer
 Watermanlaan 3
 2960 Brecht

Installateur
 Vektro - Projects BV
 Bosstraat 29
 2040 Berendrecht



p. 3/6
Situatieschema
 3 x 400V + N ~ 50Hz

Schema's getekend door: Kevin VE ERGEON B.V.B.A. - BTW BE 0817.199.561

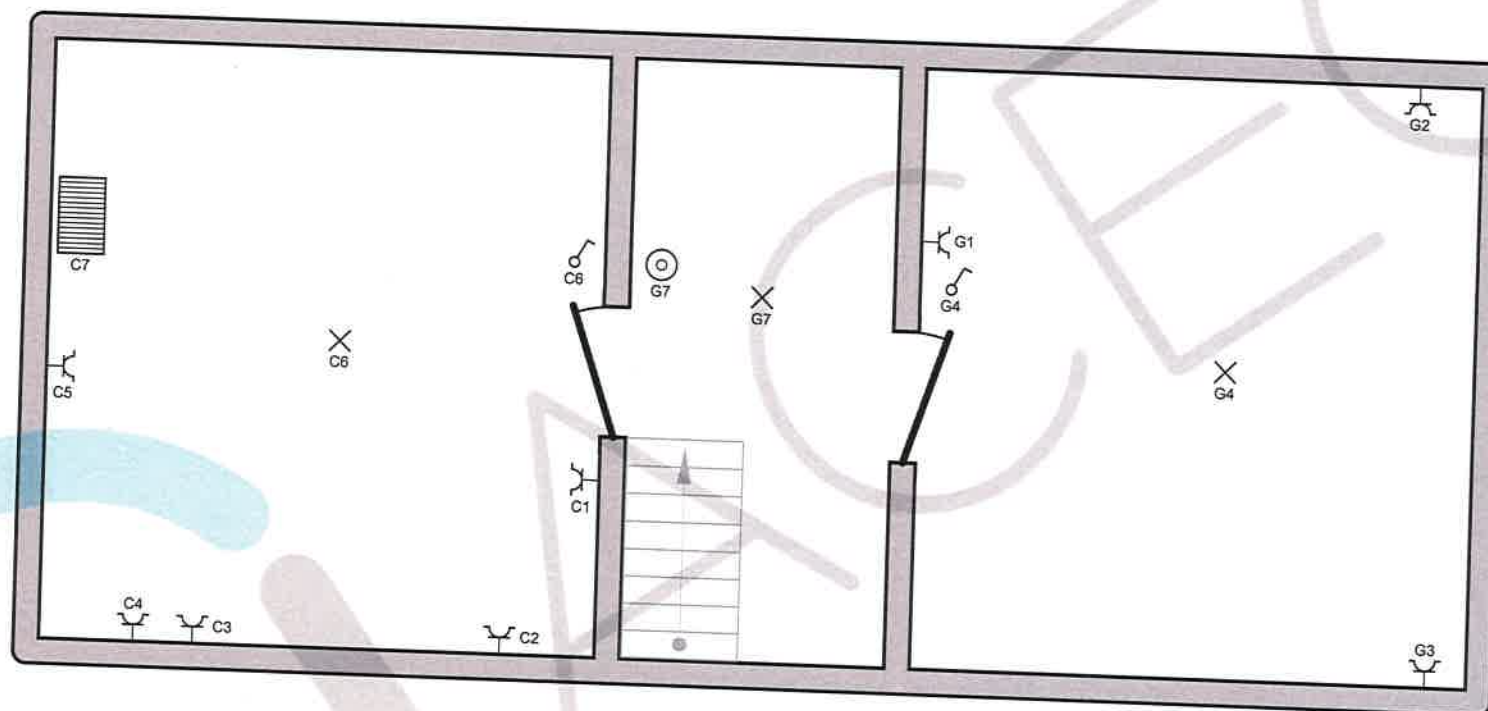

Plaats van de elektrische installatie
 Van Den Wouwer
 Watermanlaan 3
 2960 Brecht

Installateur
 Vektro - Projects BV
 Bosstraat 29
 2040 Berendrecht



p. 4/6
Situatieschema
 3 x 400V + N ~ 50Hz

Schema's getekend door: Kevin VE ERGEON B.V.B.A. - BTW BE 0817.199.561

Yoshi Van den Eynden

ACEG VZW #412
 19/02/2025

Yoshi Van den Eynden

Yoshi Van den Eynden

ACEG VZW - #412

19/02/2025

Plaats van de elektrische installatie
Van Den Wouwer
Watermanlaan 3
2960 Brecht

Installateur
Vektro - Projects BV
Bosstraat 29
2040 Berendrecht



p. 5/6
Situatieschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

Schema's getekend door: Kevin VE ERGEON B.V.B.A. - BTW BE 0817.199.561

- A Living
- B Keuken
- C Slaapkamer boven
- D Sturing accumulatie 1
- E Sturing accumulatie 2
- F Keuken
- G Gang
- H Woonkamer + garage
- I Slaapkamer beneden
- J Sturing accumulatie 3
- K Badkamer
- L Wasmachine
- M Droogkast
- N Boiler
- O kookvuur
- P accumulatie 1
- Q accumulatie 2
- R accumulatie 3

Plaats van de elektrische installatie
 Van Den Wouwer
 Watermanlaan 3
 2960 Brecht

Installateur
 Vektro - Projects BV
 Bosstraat 29
 2040 Berendrecht



p. 6/6
Lijst Kringen
 3 x 400V + N ~ 50Hz

Schema's getekend door: Kevin VE ERGEON B.V.B.A. - BTW BE 0817.199.561

Yoshi Van den Eynden

ACEG VZW - #412

19/02/2025
