

Num. rapport: 20230002692-V.1

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RAPPORT DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT & TBT DOMESTIQUE EXISTANTE**GENERALITE**

Type d'installation: Existante

Lieu d'inspection: 171 rue Vervloet, 1180 Uccle app c3

Référence: Livre I Chapitre 6.5.

Date d'inspection: 16/02/2023

Inspecteur: François GHISLAIN

Propriete de:

Pers.Cont.:

Ref PV Précédent: 20230002691

Conclusion PV Précédent:

Documents de référence:

Type de locaux: Appartement

Type d'inspection: Visite de contrôle

Autres Reglements:

Prochain contrôle au plus tard le: 16/02/2048 ou dans un délai de: 299 mois

Installateur: Fredelec

T.V.A.: BE0543169910

tel.:

Date PV Précédent:

Organisme ayant émis le report_num précédent:

DETAILS DU POINT DE FOURNITURE

Nom de l'entreprise distributrice d'électricité: SIBELGA

Numero EAN: Non disponible

Compteur: 9508363

Marque: sorema

Index I: 71042

Index II:

Raccordement: Souterrain ou aérien (Ondergronds of bovengronds)

Tension de serv.: 2x230V

I max. instal.: 63A

Liaison comptage-coffre de repart.

Type de cable: VOBst

Nature du courant: Alternatif

Prot. princ. branchement: 2P63A

Nombre de cond.: 2

Section: 10 mm²**CONTROLES VISUELS - MESURES - ESSAIS**

Schémas conformes et signés: OUI

Description Installation:

☒ voir les schemas en annexe

Installation executee conformement aux schemas: en ordre

Protection contre les chocs electriques:

Différentiels essaie par bouton test: en

Contrôle des boucles de défaut: en ordre

ordre

Electrode de terre:

type: piquets

Continuite PE et liaison equipotentielle: en ordre

Inter.Diff.General: 2p 63A/300mA

Diff. supplem.: 2p 63A/30mA

Pas encore places:

Nombre de tableaux: 1

Adéquation entre les dispositifs de protection et la section des conducteurs: En ordre

Test du dif. via courant de défaut (2,5 à 2.75 I_{Δn}): En ordre

Contrôle visuel du matériel fixe ou à poste fixe dangereux: En ordre

Borne d'entrée du différentiel d'en-tête scellé par mes soins: Oui

Les schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) de position sont à re-signer: Oui

Adéquation entre le différentiel et la valeur de la resistance de dispersion de terre: En ordre

☒ schema unifilaire et schema de position ont ete signes pour approbation

Etat du matériel électrique (fixation, dégradation...): en ordre

Contact direct: en ordre

Contact indirect: en ordre

Resist. d'isolement general: 5 Mohm

Section: 16 mm²

Resistance de dispersion: 15 Ohm

Nombre de circuits terminaux: 0

Matériel de classe I et liaison équipotentielle: En ordre

Contrôle visuel du matériel mobile à poste fixe dangereux: Pas d'application

CONCLUSION**L'INSTALLATION EST CONFORME**

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. La prochaine visite de contrôle est à effectuer dans le délai prescrit par le Livre 1 (voir ci-dessus).

Pour le Directeur Technique,

L'inspecteur,

CONSTATATIONS

Note (N) - Remarque (O) - Infraction au Livre 1 (I) - Dérogation (D) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N11 () - Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection..

Num. rapport: **20230002692-V.1****EXEMPLAIRE ORIGINAL****N12 ()** - Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.**N13 ()** - Sauf stipulation contraire, l'examen porte exclusivement sur l'état et le bon fonctionnement de l'installation. Sa conception sort du cadre de la mission.

L'inspecteur certifie avoir suivi toutes les étapes de la check-list: OUI

CONSEILS/REMARQUES:**Suivant la sous-section 6.5.7.2.b.7. du Livre 1, il est obligatoire de rappeler :**

- a) l'obligation de conserver le rapport de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique ;
- b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique ;
- c) l'obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques;
- d) L'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du rapport de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Livre 1: RGIE approuvé (ou introduit) par l'arrêté royal du 08/09/2019.

Fredelec

Frédéric MERCHERS
Rue des Bigarreux 20
1180 Uccle
Tél : 0475/248.948

Monsieur Charlier
Rue F. Vervloet 171/C3
1180 Uccle

FREDELEC
Rue des Bigarreux 20
1180 Uccle

SCHEMAS ELECTRIQUES

Installation contrôlée par :
Installatie gecontroleerd door:
Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre
010 280 577 - 015 860 460



Inspecteur : **François GHISLAIN**

FREDELEC

Signature / handtekening :

Rapport / Verslag BE 0543.169.910

IBAN : BE 44 001707456745

Fredelec

Frédéric MERCHERS
Rue des Bigarreux 20
1180 Uccle
Tél : 0475/248.948

Monsieur Charlier
Rue F.Vervloet 171/C3
1180 Uccle

LEGENDE TABLEAU ELECTRIQUE

1X400V

Tableau Divisionnaire

FREDELEC
Rue des Bigarreux 20
1180 Bruxelles

- A : Diff 30MA
- B : Disj 16A Eclairage Cuisine+Hall+SDB
- C : Disj 16A Eclairage Salon+SAM+WC
- D : Disj 16A Prise Cuisine+Salon
- E : Disj 16A Prise Salon+SAM+Hall+SDB
- F : Disj 16A Prise LV
- G : Disj 16A Machine a laver
- H : Disj 32A Taque electrique

Installation contrôlée par :
Installatie gecontroleerd door:
Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre
010 280 577 - 015 860 460




Inspecteur : **François GHISLAIN**

FREDELEC

Signature / Handtekening :


Rapport / Verslag BE 0543.169.910

IBAN : BE 44 001707456745

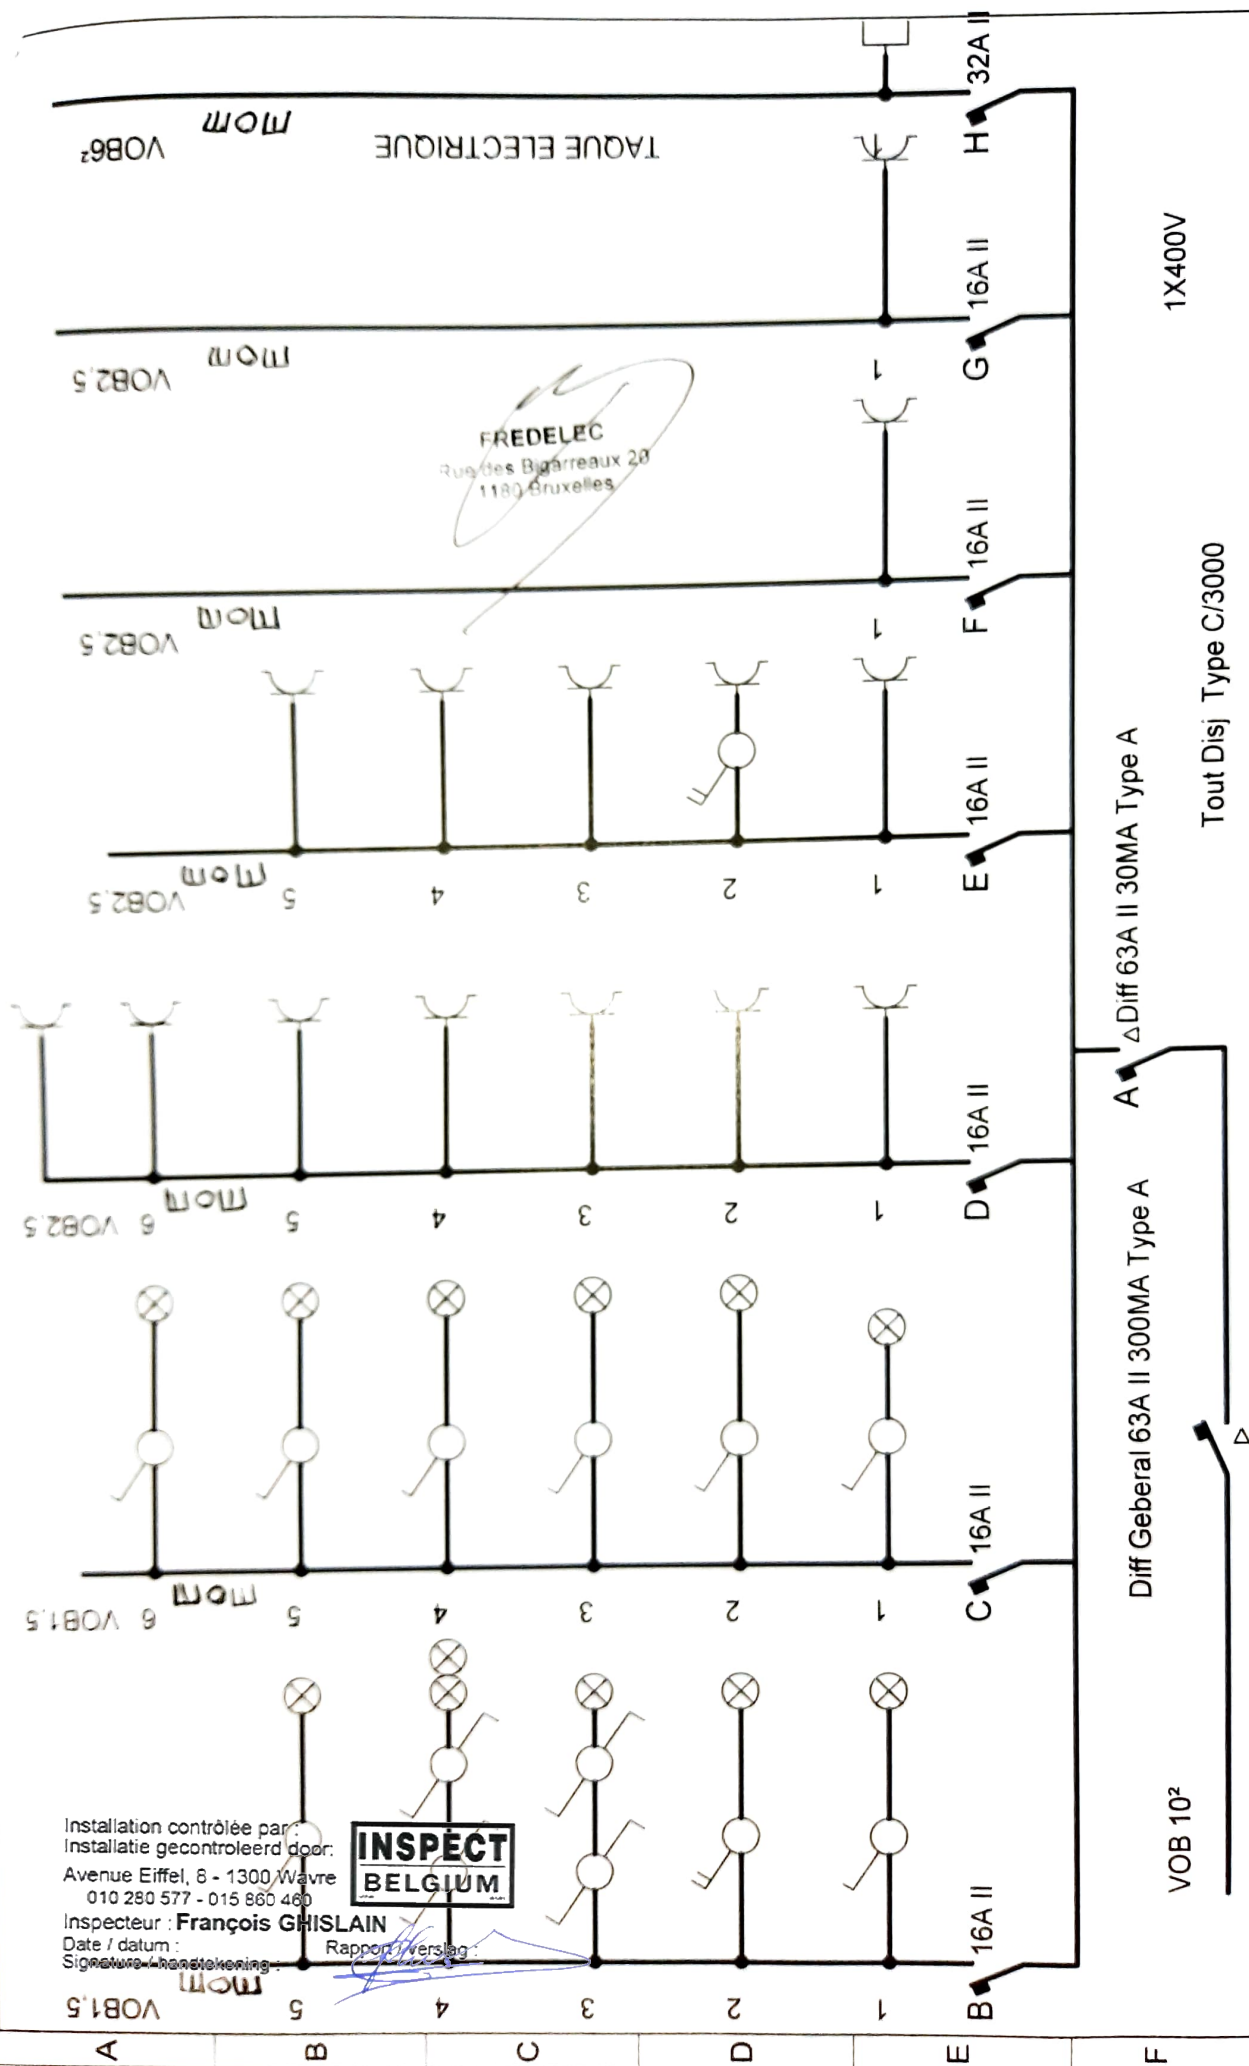

Désignation du dossier	Concepteur	Date	Modifications	Date dossier
	Realisateur			15/2/23
	Verificateur			Date folio
Désignation du folio				15/2/23
			CE FOLIO A ETE REALISE AVEC LE LOGOIEL SEE TECHNICAL DU GROUPE GE-AAO	1/1

Mr Charlier
171 Av F. Verbeet 3C
1180 Bruxelles

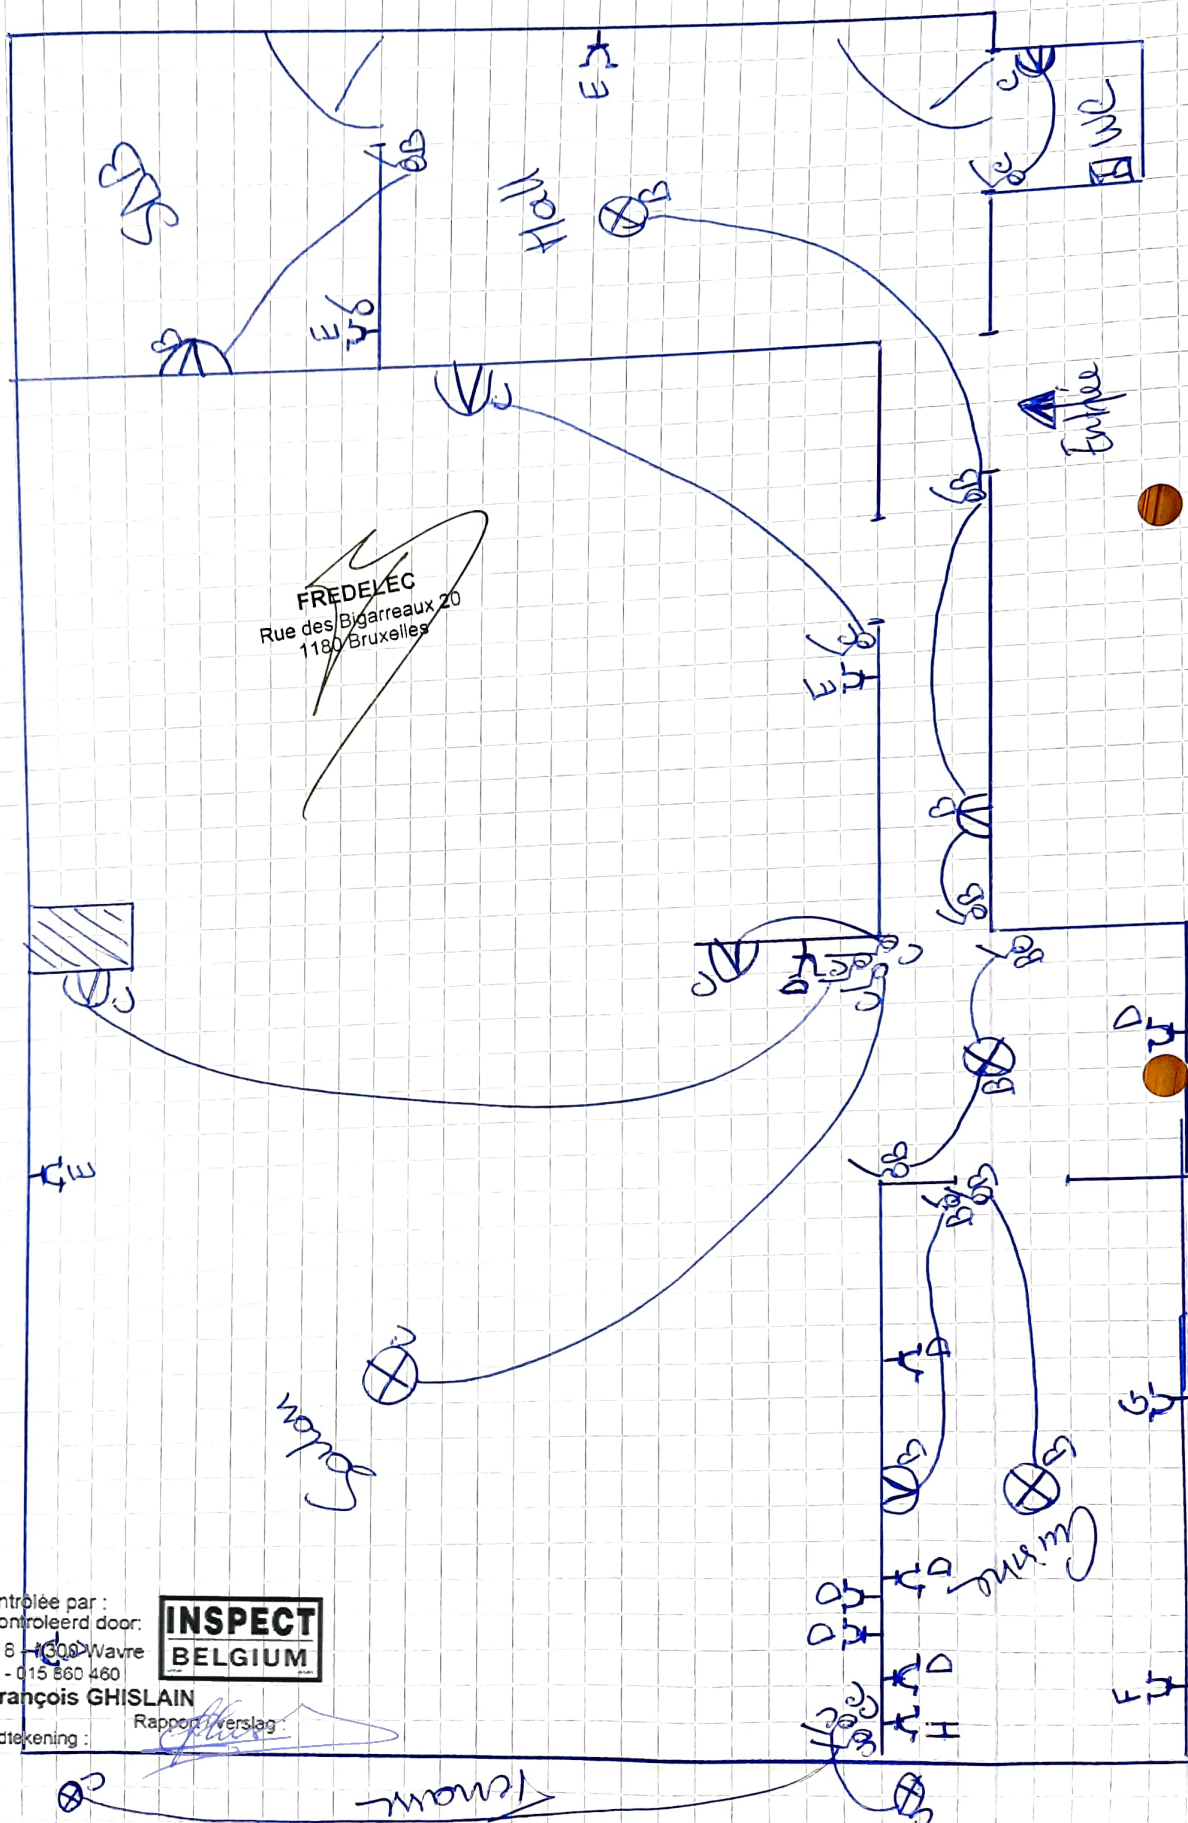

Installation contrôlée par :
Installatie gecontroleerd door:
Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre
010 280 577 - 015 860 460



Inspecteur : **François GHISLAIN**

Date / datum :

Rapport / verslag :

Signature / handtekening :
