

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 05/11/2025

Inspecteur: Jelle De Wilde

Mentor:

Installateur: -

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel MI 3102 BT

Serienummer: 23162225

Datum verslag: 05/11/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Katelijnestraat
Huisnummer 2
Busnummer
Postcode 9308
Gemeente Hofstade
Land België

Eigenaar

Naam -
Straatnaam Katelijnestraat
Huisnummer 2
Busnummer
Postcode 9308
Gemeente Hofstade
Land België

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer
E-mail -

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448860003748064

Teller Nr.: : 1LGZ0570478448



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 1

Aardelektrode: Aardingslus

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 25 A



Aantal kringen: 18

Ri algemeen: 47.7 MΩ

RE: 4.73 Ω

OK

OK

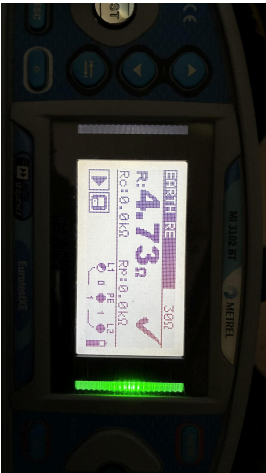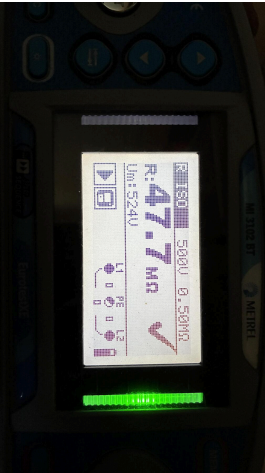

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	18	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	5	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema's	-	-		-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 5/11/2050
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, toegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 15:10 tot 15:46

De inspecteur Jelle De Wilde

Jelle De Wilde

ACEG VZW - 473

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte­streeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 5/11/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



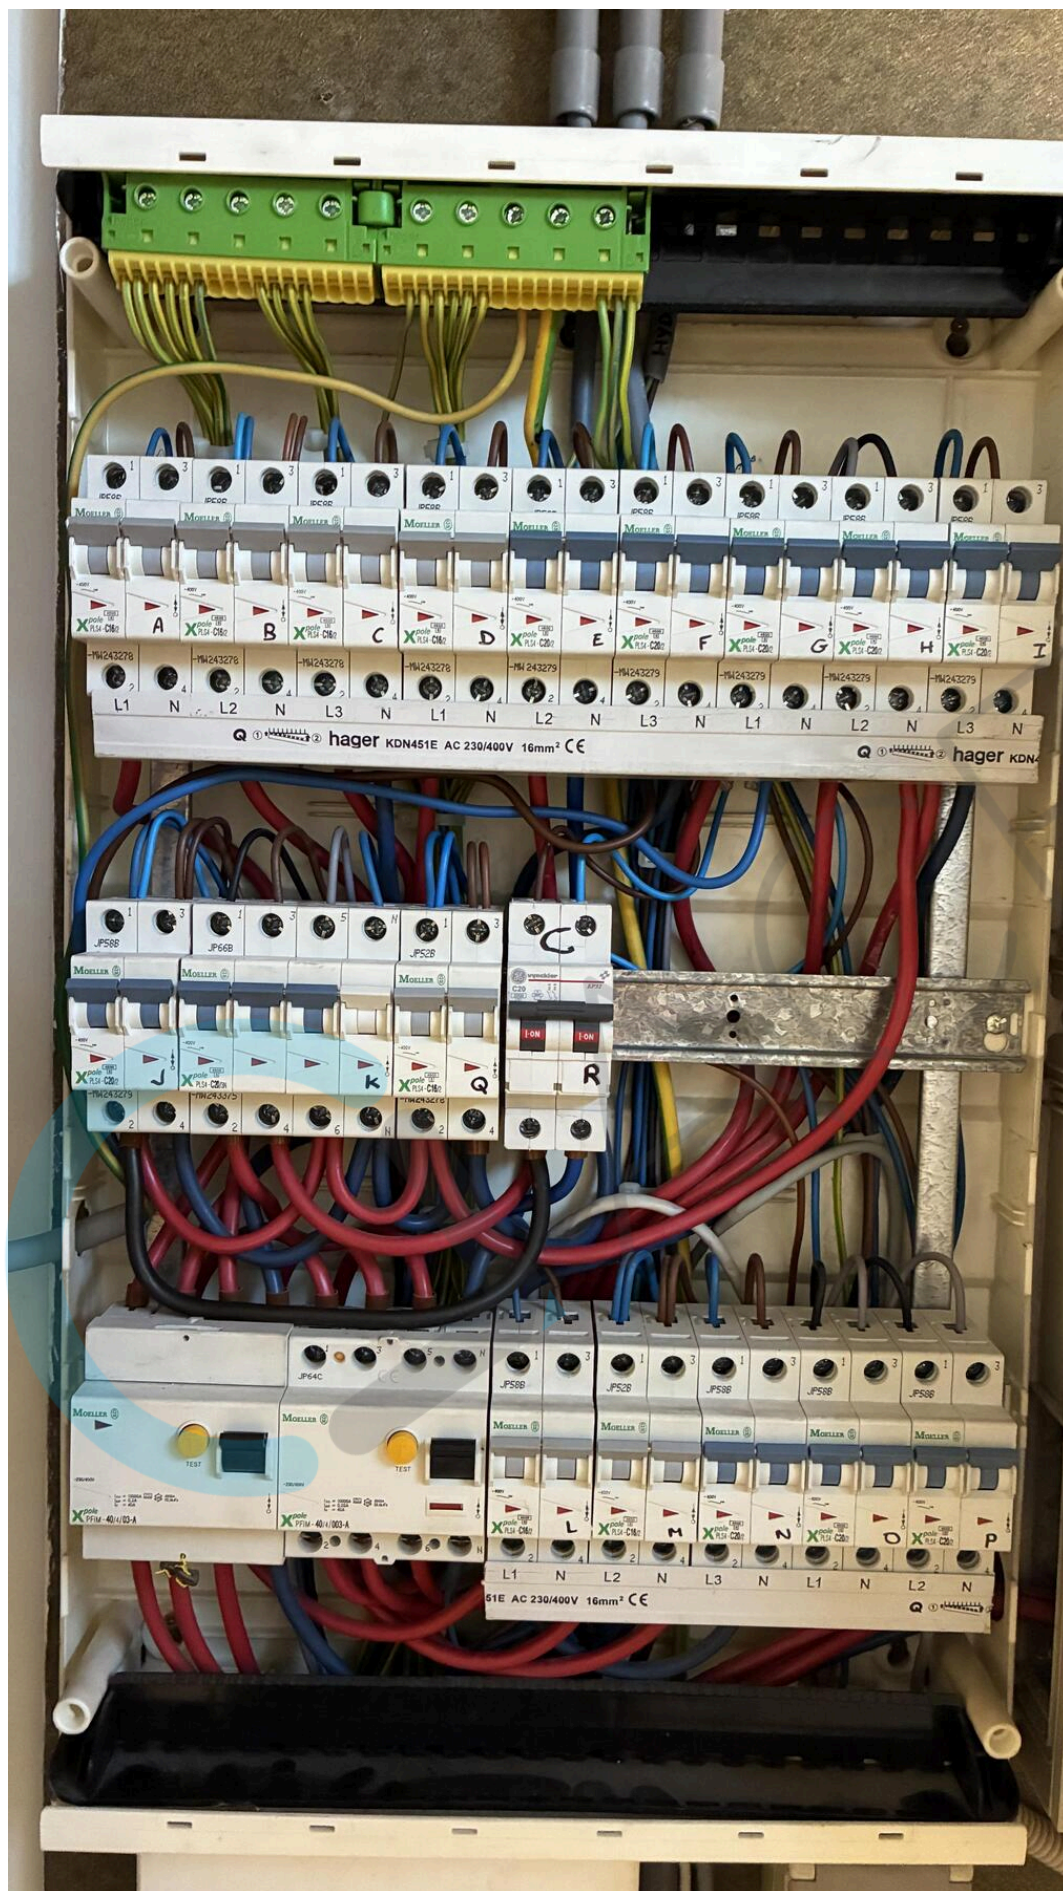










CLACK

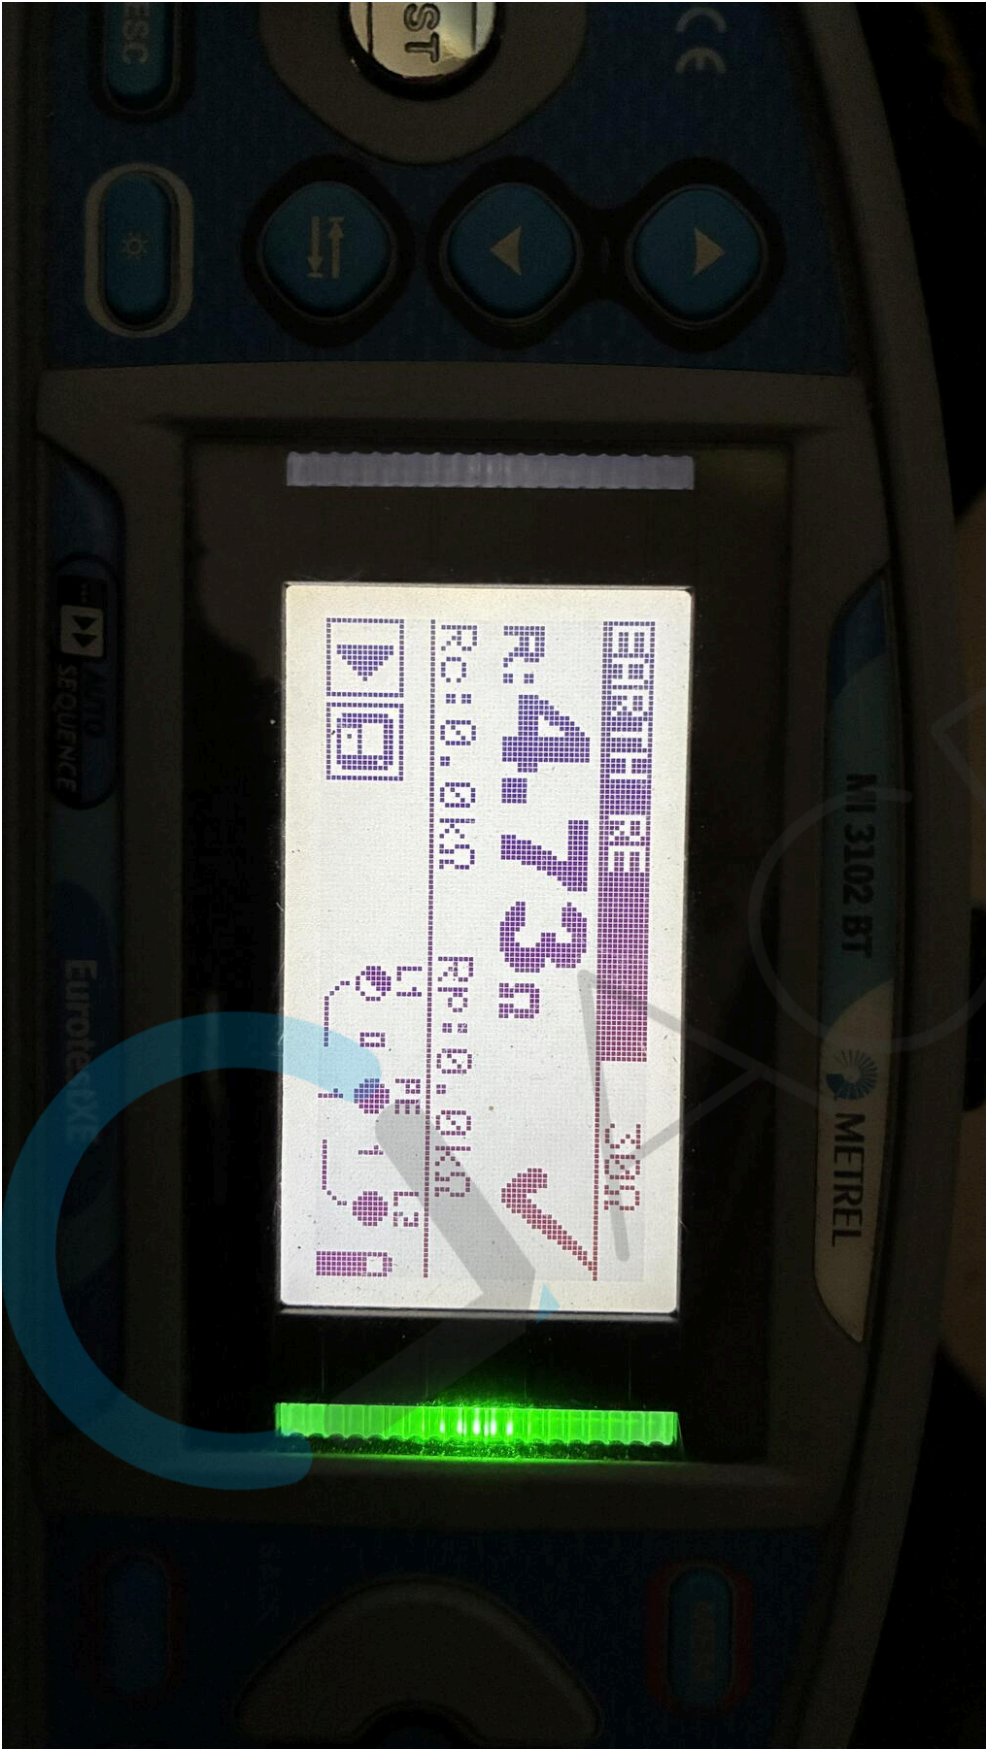

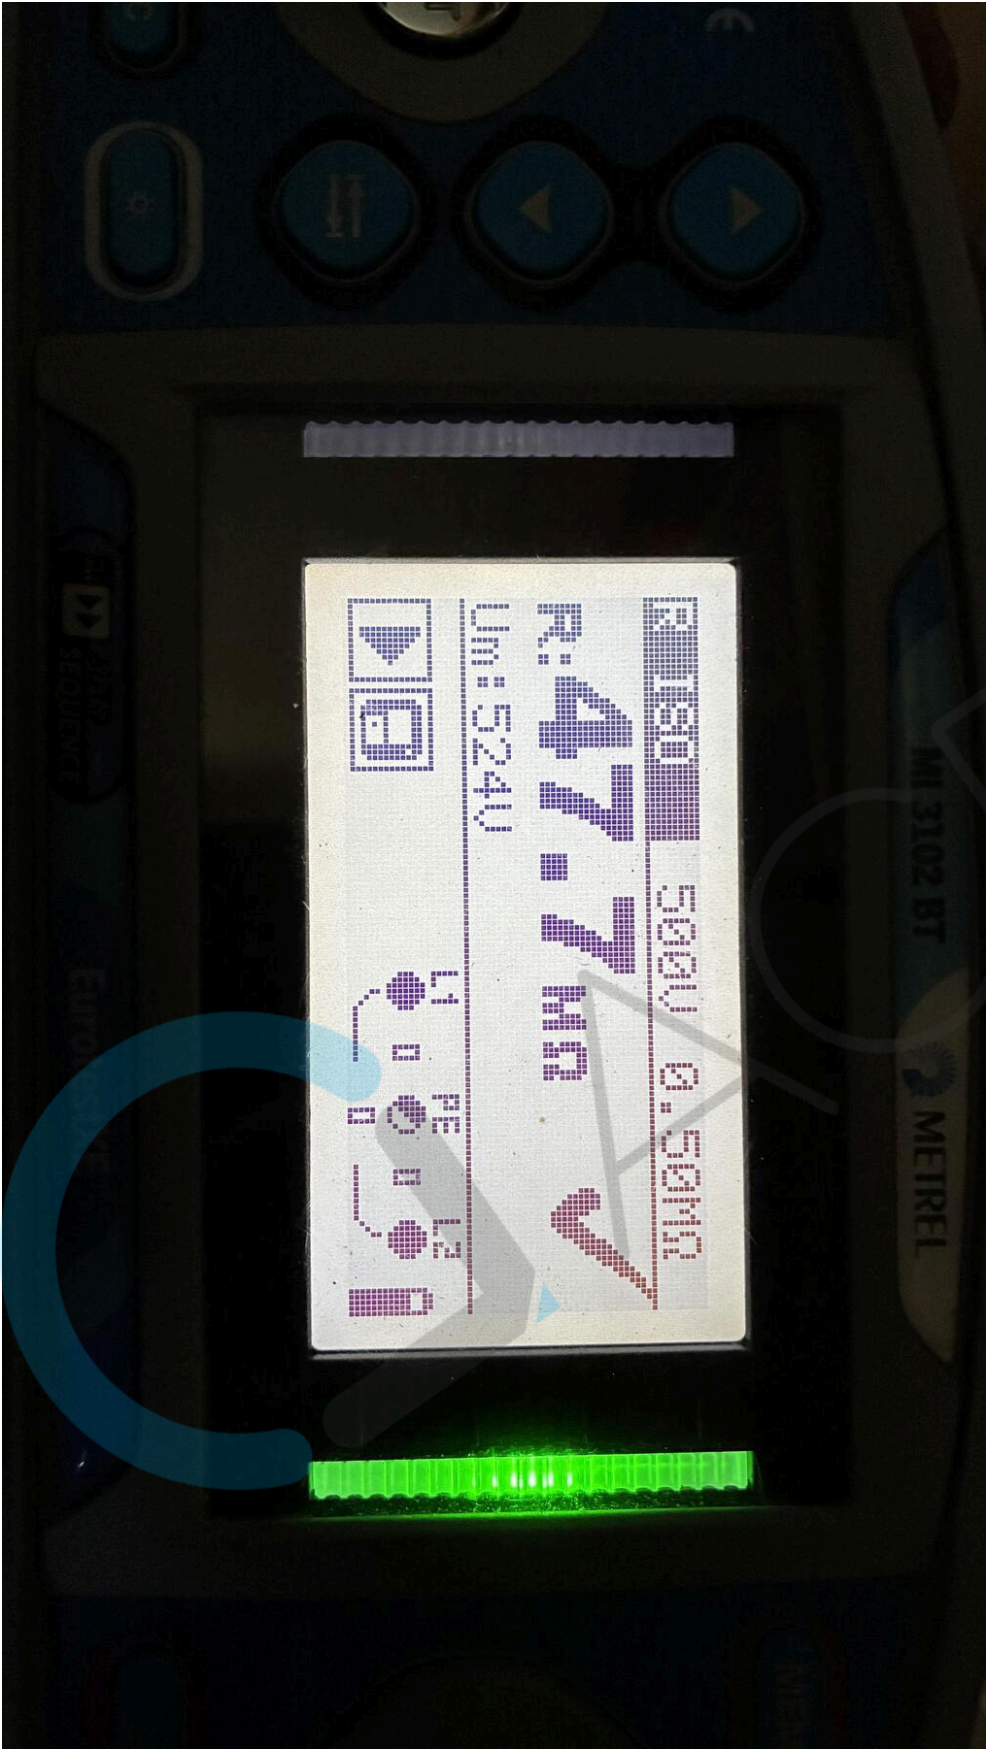


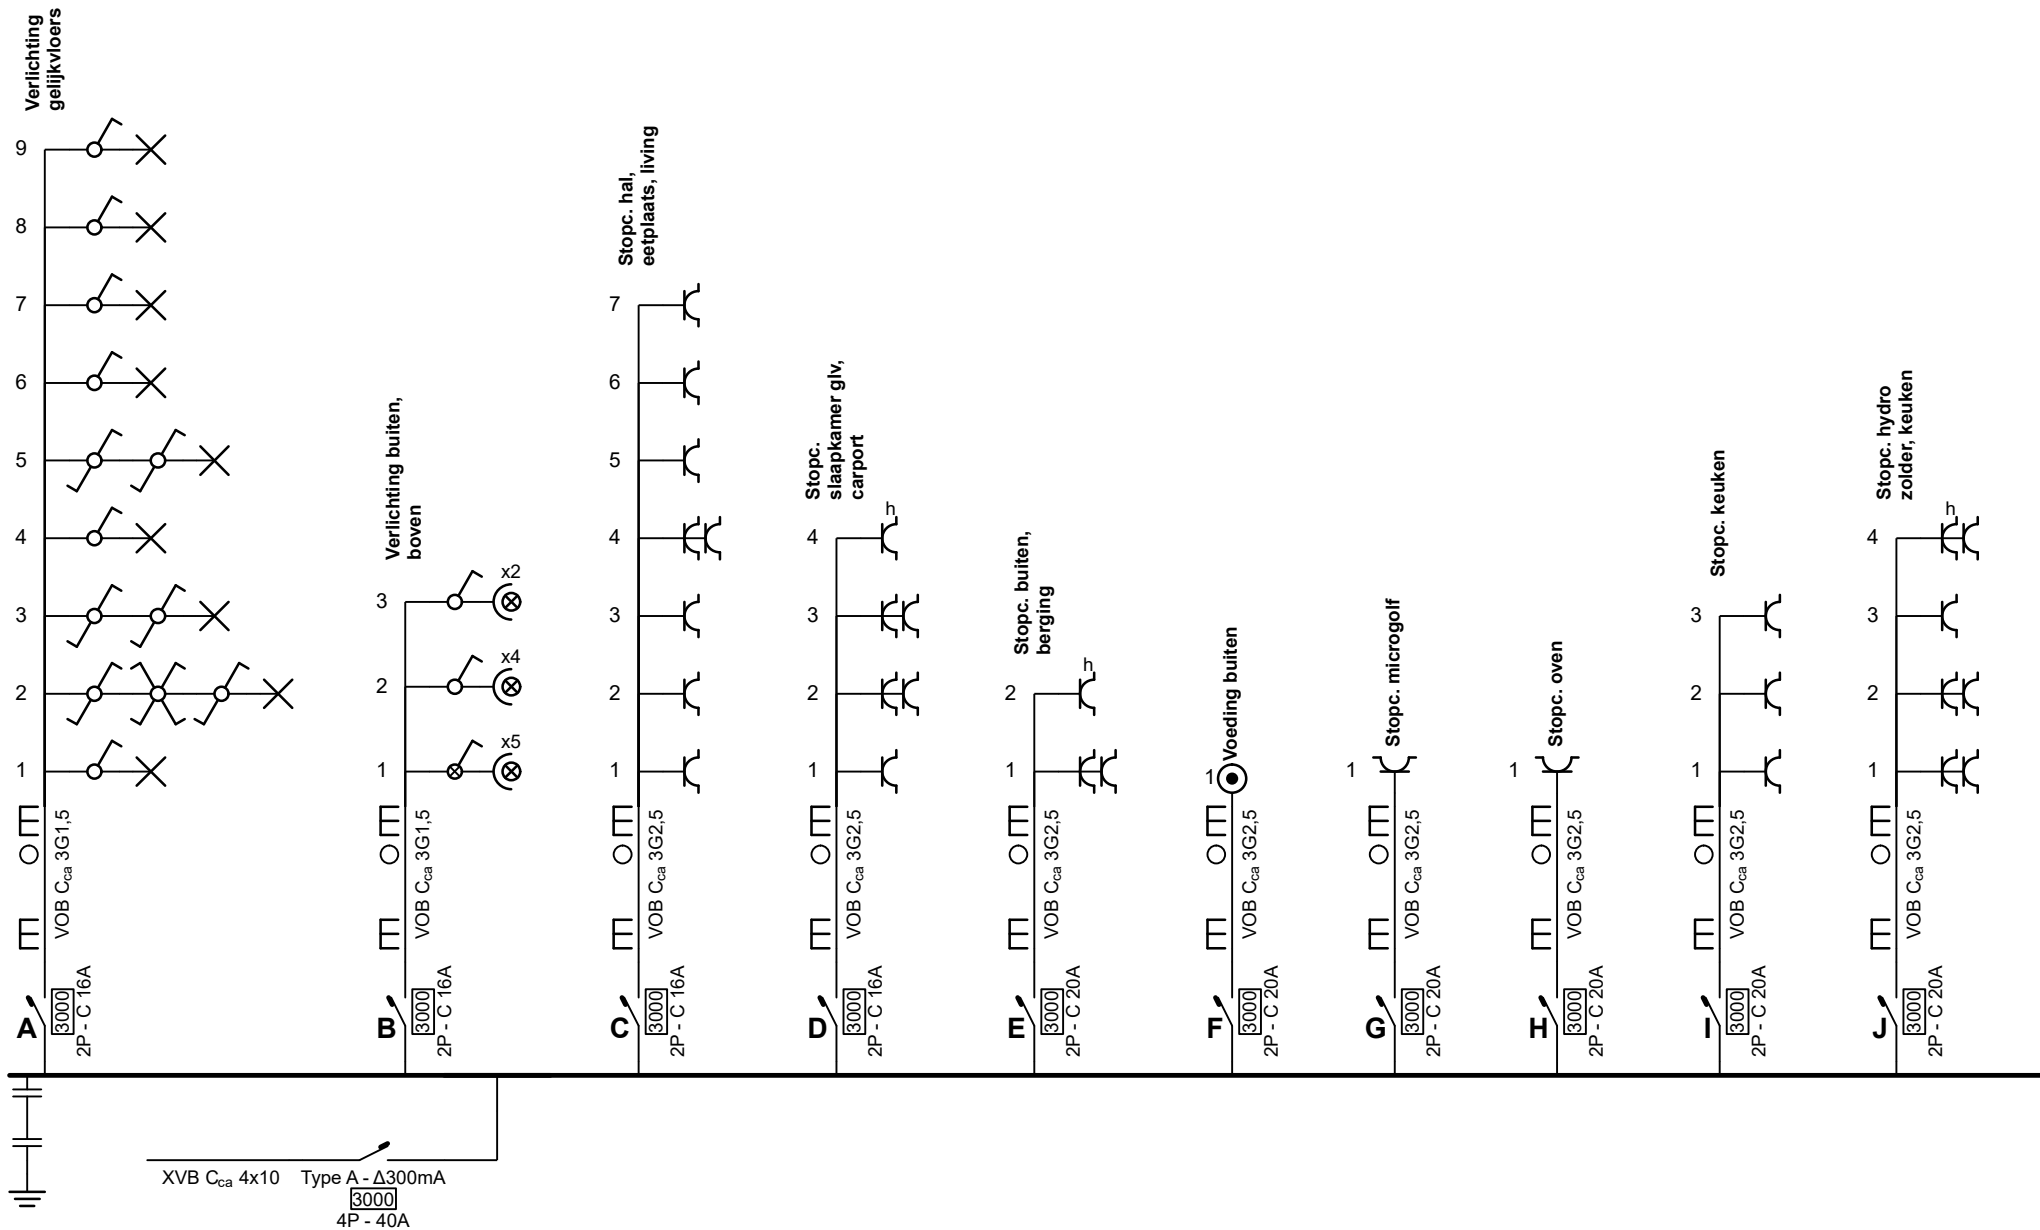

ACEG
12W 473

5/11/25


Plaats van de elektrische installatie Van Der Maelen Katelijnestraat 2 9308 Hofstade	Installateur	p. 1/5 Eendraadschema 1 x 400V + N ~ 50Hz
--	---------------------	---

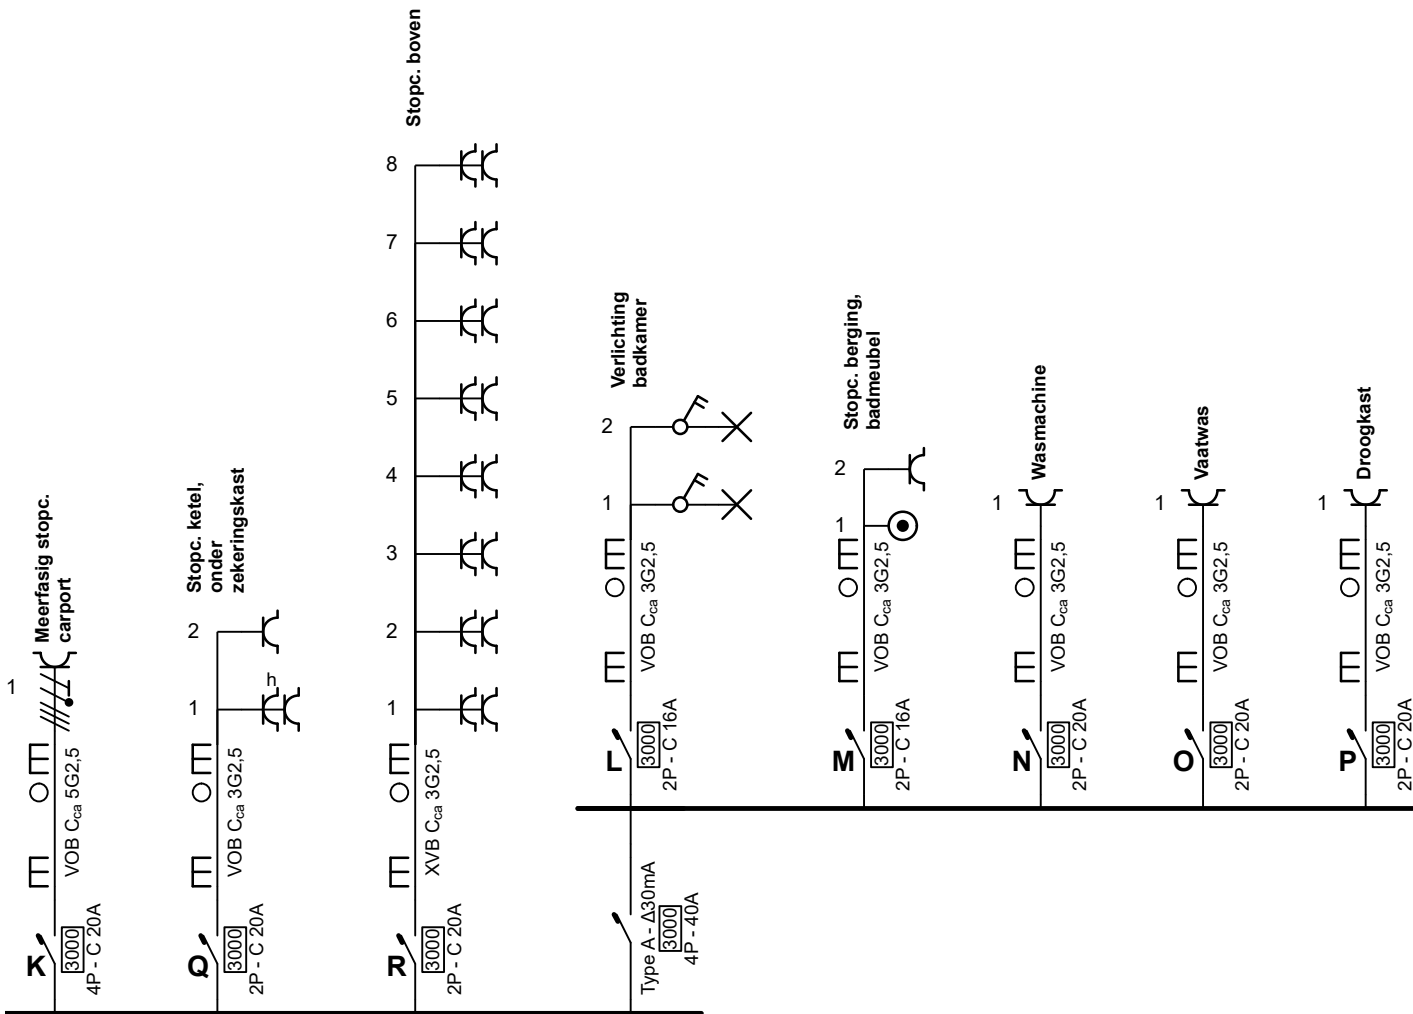


ACEG
12W473
5/11/25

Plaats van de elektrische installatie Van Der Maelen Katelijnestraat 2 9308 Hofstade	Installateur	p. 2/5 Eendraadschema
		1 x 400V + N ~ 50Hz

Gelijkvloers

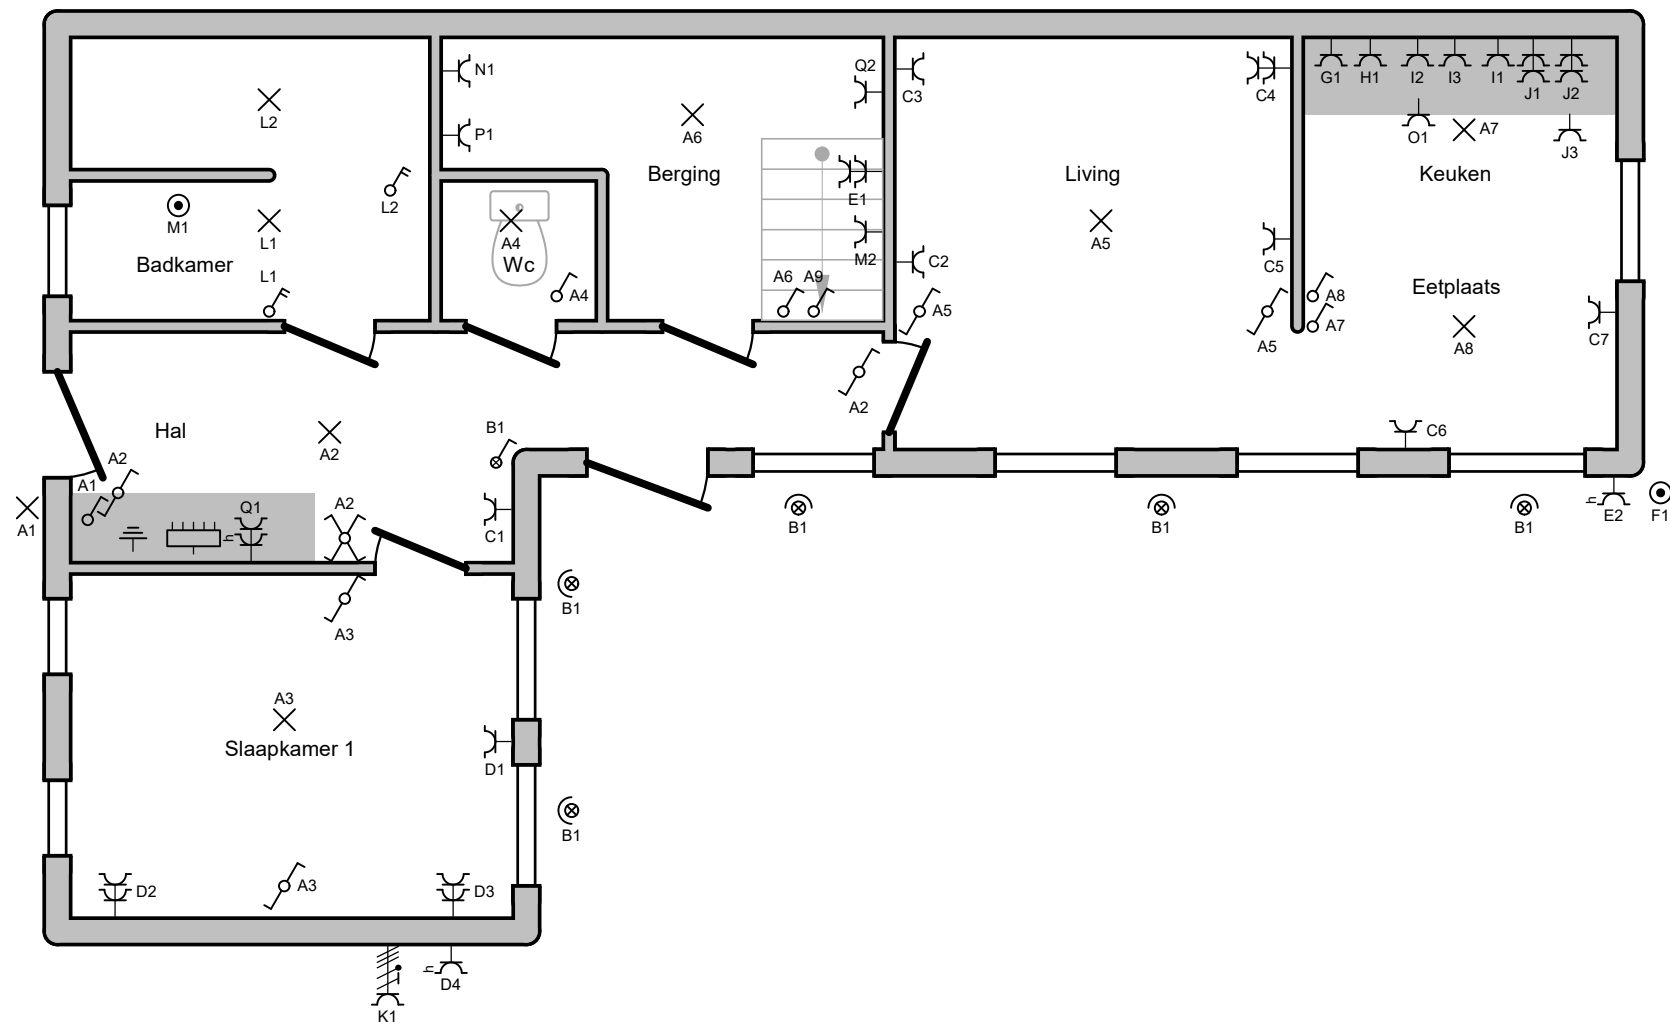

ACEG
12W473

5/11/25

Plaats van de elektrische installatie


Van Der Maelen
Katelijnestraat 2
9308 Hofstade

Installateur

p. 3/5 Situatieplan

1 x 400V + N ~ 50Hz

Verdieping

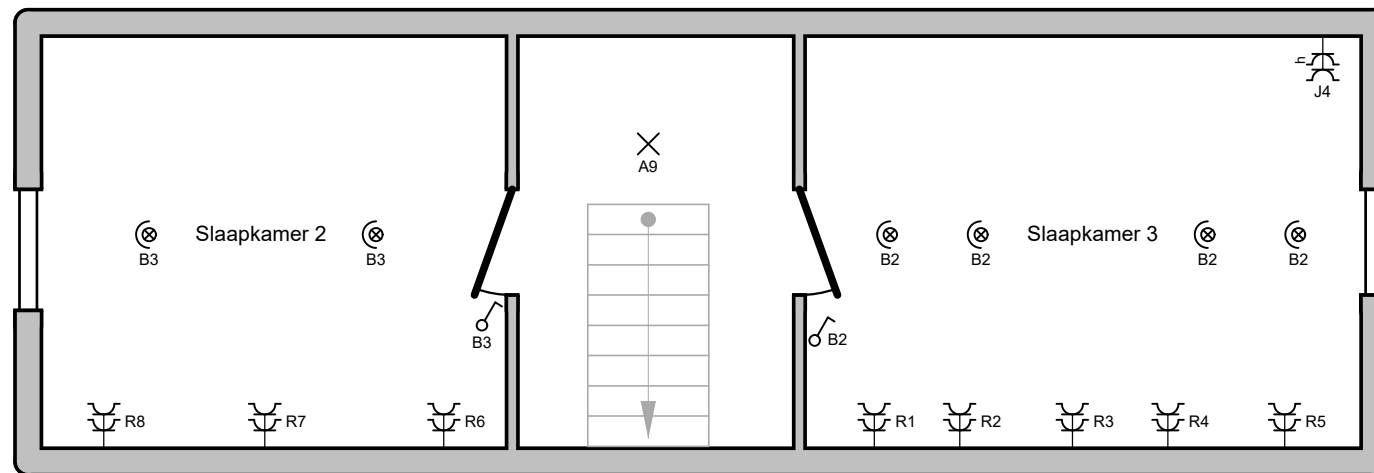

Plaats van de elektrische installatie

Van Der Maelen
Katelijnestraat 2
9308 Hofstade

Installateur


**p. 4/5
Situatieplan**

1 x 400V + N ~ 50Hz

[Handwritten signature]
ACEG
12W473

5/11/25

A	Verlichting gelijkvloers
B	Verlichting buiten, boven
C	Stopc. hal, eetplaats, living
D	Stopc. slaapkamer glv, carport
E	Stopc. buiten, berging
F	Voeding buiten
G	Stopc. microgolf
H	Stopc. oven
I	Stopc. keuken
J	Stopc. hydro zolder, keuken
K	Meerfasig stopc. carport
Q	Stopc. ketel, onder zekeringskast
R	Stopc. boven
L	Verlichting badkamer
M	Stopc. berging, badmeubel
N	Wasmachine
O	Vaatwas
P	Droogkast



ACEG
12W473 5/11/25

Plaats van de elektrische installatie Van Der Maelen Katelijnestraat 2 9308 Hofstade	Installateur	p. 5/5 Lijst Kringen
		1 x 400V + N ~ 50Hz
