

PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

EXEMPLAIRE ORIGINAL



RÉF. 01/2017/24761/01:1

DATE DU CONTRÔLE 28/12/2017

AGENT VISITEUR Jean-Paul Simonis

ADRESSE DU CONTRÔLE rue de rechain 60-62 - 4820 Dison

TYPE DE CONTRÔLE visite périodique (Art. 271)

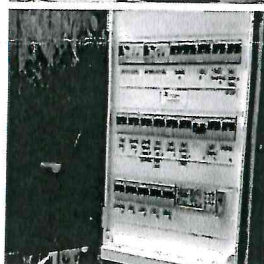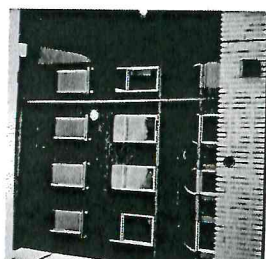

> DONNÉES GÉNÉRALES

Adresse de l'installation rue de rechain 60-62 - 4820 Dison
Type de locaux unité d'habitation (maison)
Propriétaire Mr Pascal Reip
Responsable des travaux s/o
Carte ID - #TVA non communiqué - sans objet
Revisite Certinergie Revisite Certinergie
Références du PV précédent 01/2017/14559/01

> DONNÉES DU RACCORDEMENT

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD) NETHYS
Code EAN non communiqué
Numéro du compteur 58488213
Index jour/nuit 85333,0
Type de raccordement aérien
Câble compteur - tableau EXVB 4 x 10 mm²
Tension nominale de service 3x230V - AC
Courant nominal de la protection de branchement 25A

> CONTRÔLE

Conformité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) de position	OK	Nombre de tableaux	1	Nombre de circuits	18
Description tableau(x) voir plan(s) dans annexe(s)					
Les fondations datent d'avant le 1/10/1981		Dispositif différentiel de tête	ID - 40A - 300mA - type A - test OK		
Prise de terre piquets		Dispositif différentiel "sdb"	ID - 40A - 30mA - type A - test OK		
Résistance de dispersion de la prise de terre (Ω) 22,3		Raccordement	OK		
Conformité des liaisons équipotentielle et des PE OK		Eclairage/machines	OK		
Test de continuité concluant		Contrôle visuel appareils fixes et/ou mobiles	OK		
Contrôle boucle de défaut concluant		Protection contre les contacts directs	OK		
Protection contre les contacts indirects OK		Résistance minimale d'isolement mesurée (MΩ)	9,7		

CONCLUSION : CONFORME



A la date du 28/12/2017, l'installation électrique de rue de rechain 60-62 - 4820 Dison est conforme au Règlement Général des Installations Electriques.
Le contrôle réalisé par Certinergie a porté sur les parties visibles de l'installation et normalement accessibles.
Un plombage en amont et en aval du dispositif de protection à courant différentiel résiduel est placé afin de rendre inaccessible ses bornes.
Le ou les schémas unifilaires et de position ont été contrôlés et sont conformes à l'installation.
Le prochain contrôle périodique est à effectuer, sans modification importante de l'installation électrique, avant le 28/12/2042.

Signature de l'agent

Signature du propriétaire

PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 01/2017/24761/01:1

› DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE DE L'INSTALLATION :

Il a pour obligation de conserver le procès-verbal de conformité ou de contrôle dans le dossier de l'installation électrique, de renseigner dans le dossier les modifications apportées à l'installation électrique, en cas d'accident aux personnes dû à l'électricité de prévenir le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, d'assurer ou de faire assurer l'entretien de l'installation et de veiller à ce que l'installation reste conforme en tout temps, de refaire contrôler l'installation en cas d'infraction(s) avant un délai d'un an et par le même organisme en cas de visite de contrôle, et si suite à un contrôle pour la vente d'une installation électrique datant d'avant le 1^{er} octobre 1981, avant un délai de 18 mois à dater du jour de l'acte de vente par l'organisme de son choix. Dans le cas où, lors de la seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques. Le Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, est informé, par l'organisme agréé qui a effectué la visite de contrôle, de l'existence d'infractions au cas où il n'est pas donné suite à la remise en ordre de l'installation.

En résumé, quelles sont les mesures à prendre **si l'installation électrique est conforme ?**

1	2	3	4
Lisez attentivement ce procès-verbal	Lors d'extensions, de modifications importantes de l'installation, faites la reconstruire	Au terme de la validité du rapport, faites reconstruire votre installation	Certinergie est à votre service 0800 82 171


PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

EXEMPLAIRE ORIGINAL


RÉF. 01/2017/24761/01:1

ANNEXES

Schéma(s) unifilaire(s) de l'installation

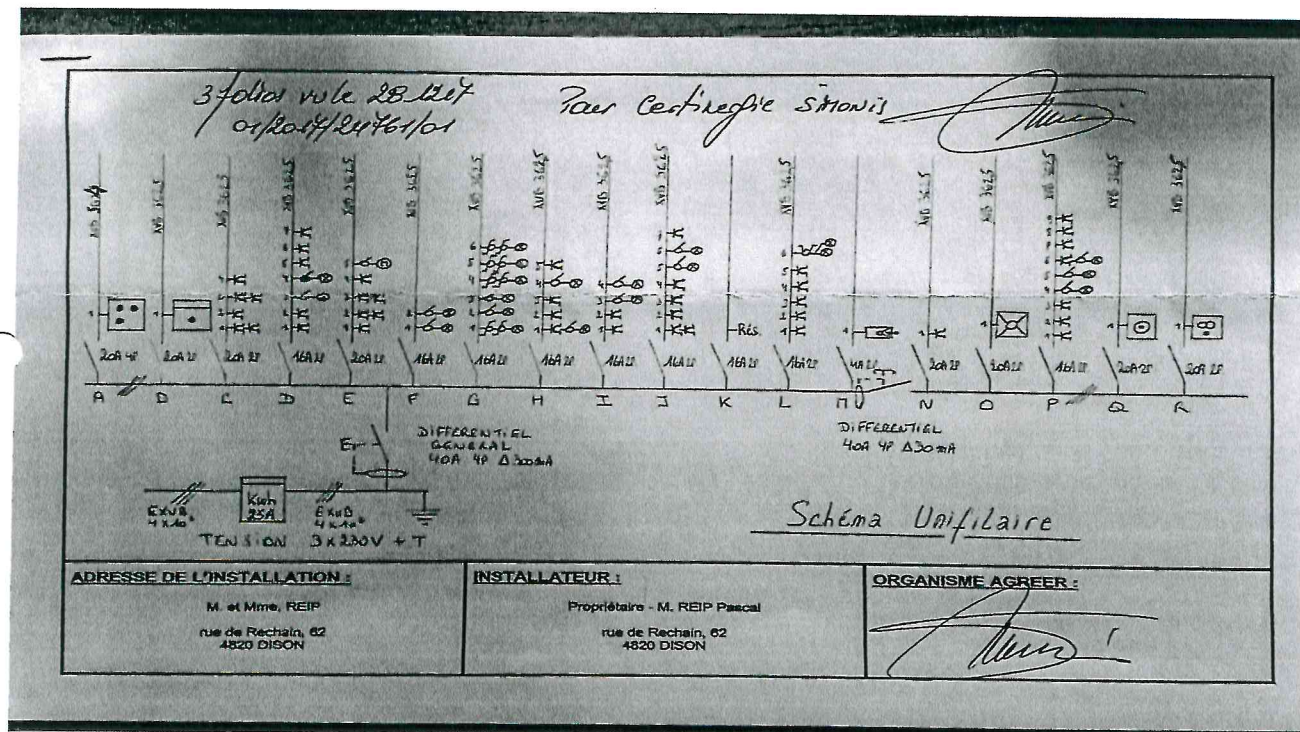

Plan(s) de position de l'installation

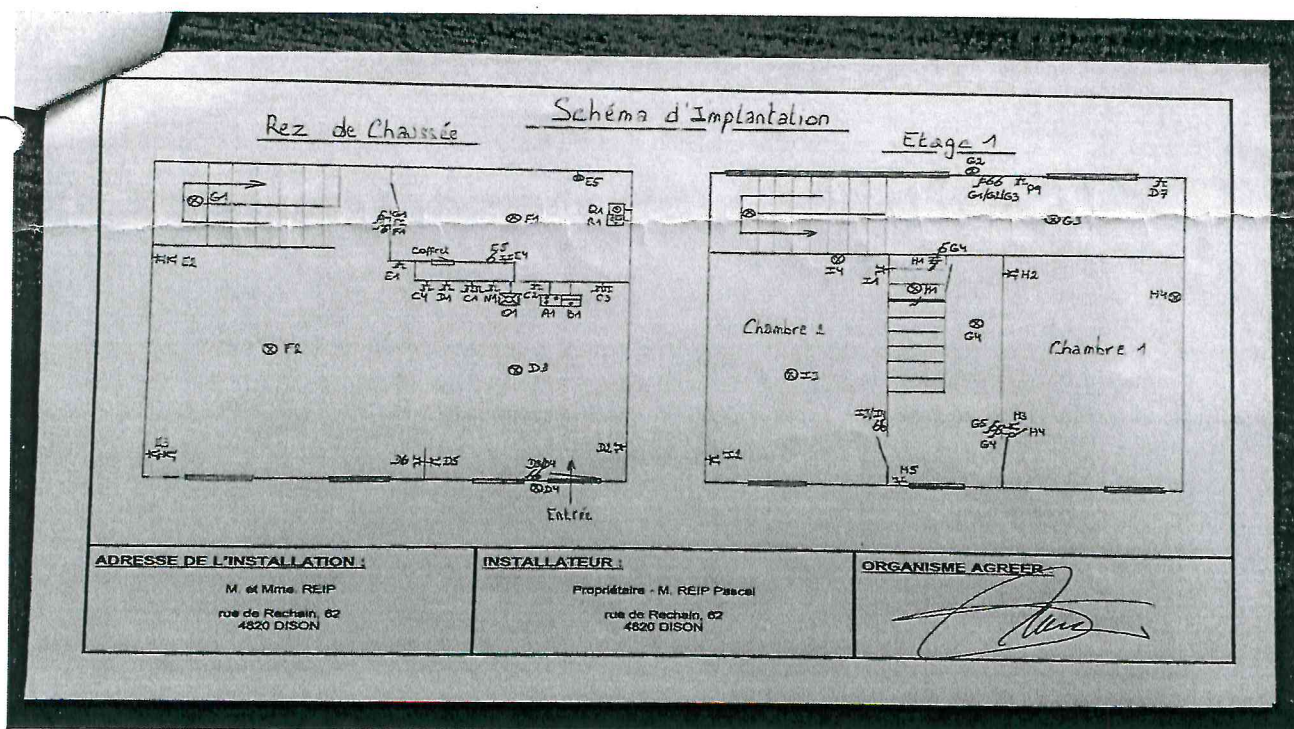


PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 01/2017/24761/01:1

ANNEXES

Plan(s) de position de l'installation

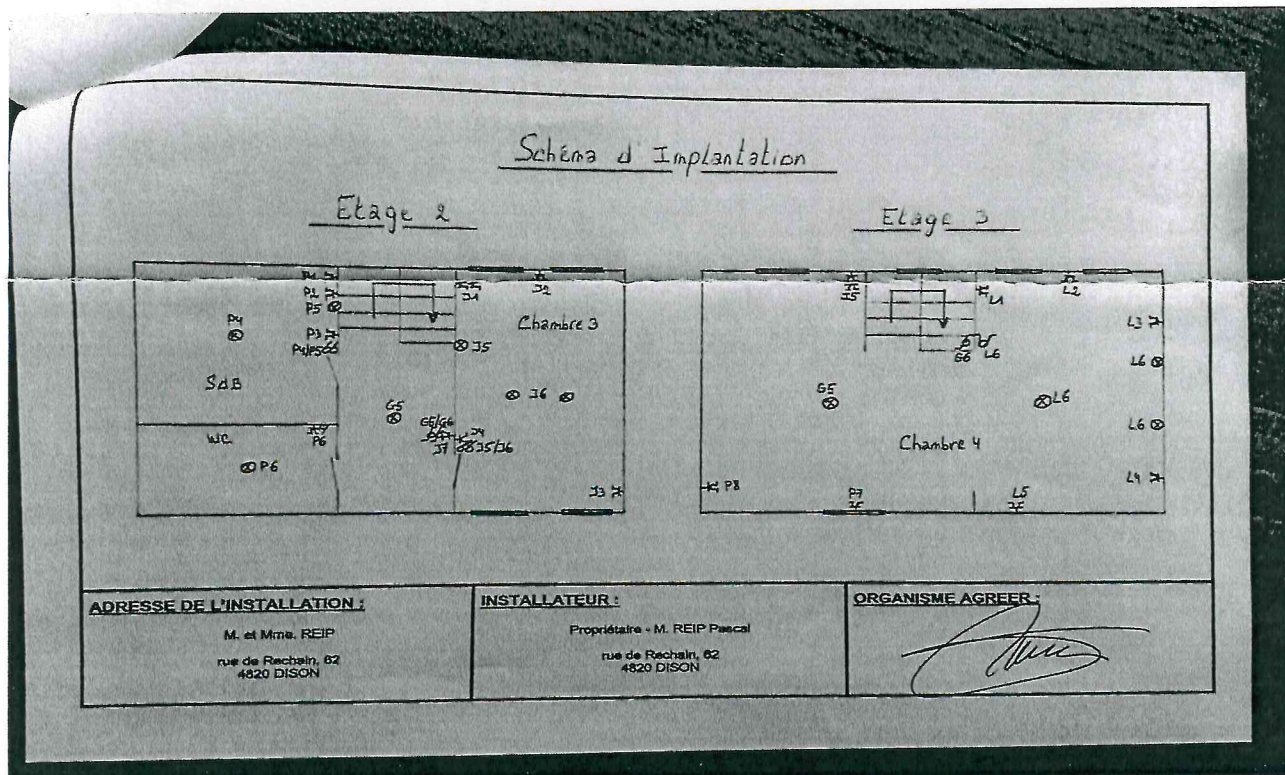

Four Certificate shows

Schéma Unilaire

INSTALLATEUR:


Propriétaire - M. REIP Pascal
rue de Rechain, 62
4820 DISON

ORGANISME AGREER :


Mr. J.

Schéma d'implantation

Rez de Chaussée

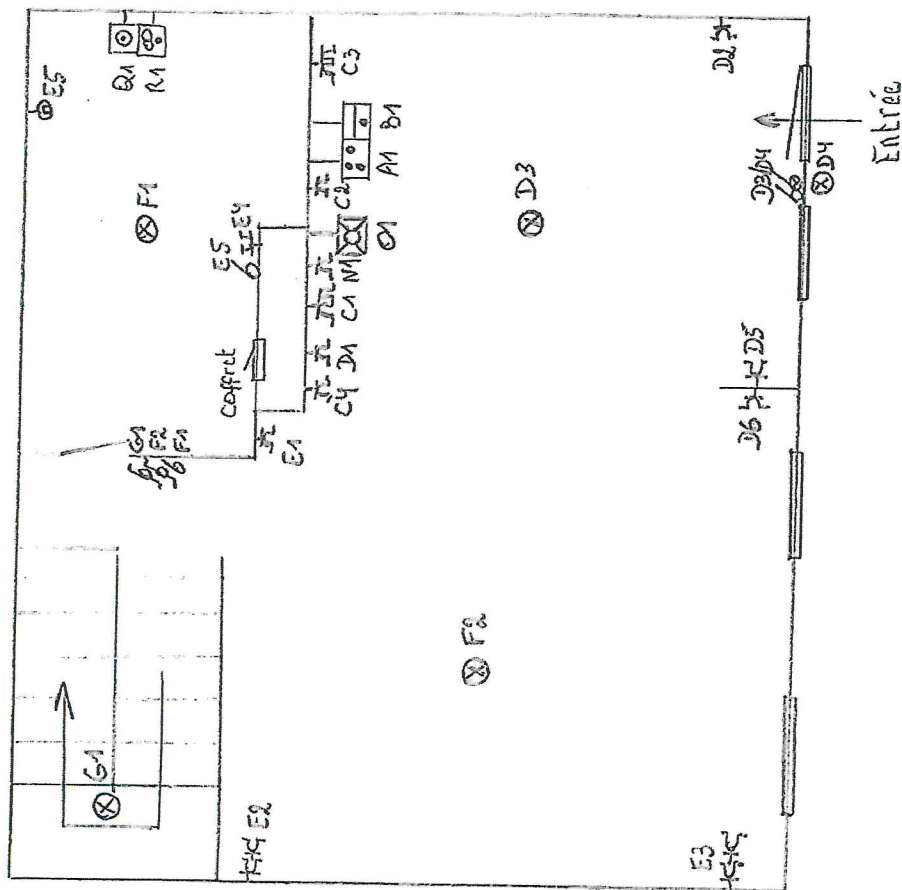

Etage 1

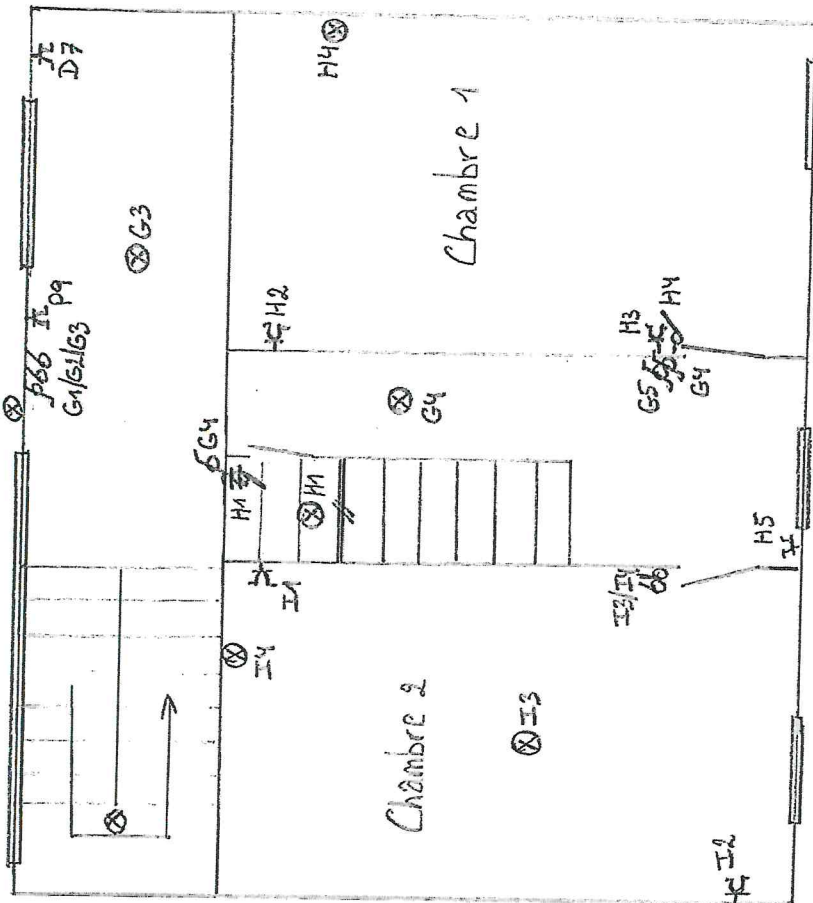

ADRESSE DE L'INSTALLATION :

M. et Mme. REIP
rue de Rechain, 62
4820 DISON

INSTALLATEUR :


Propriétaire - M. REIP Pascal
rue de Rechain, 62
4820 DISON

ORGANISME AGREER :


[Signature]

Schema d'Implantation

Etage 2

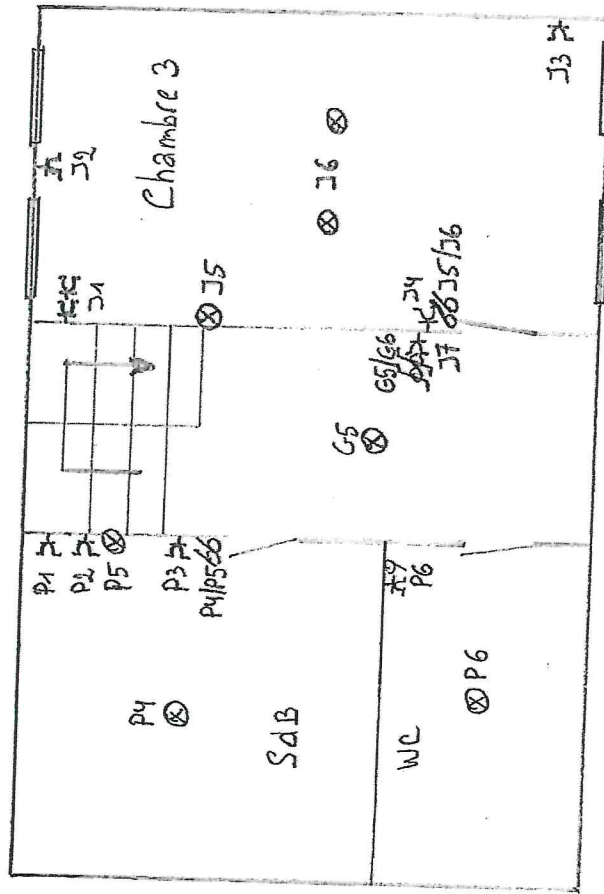

Etage 3

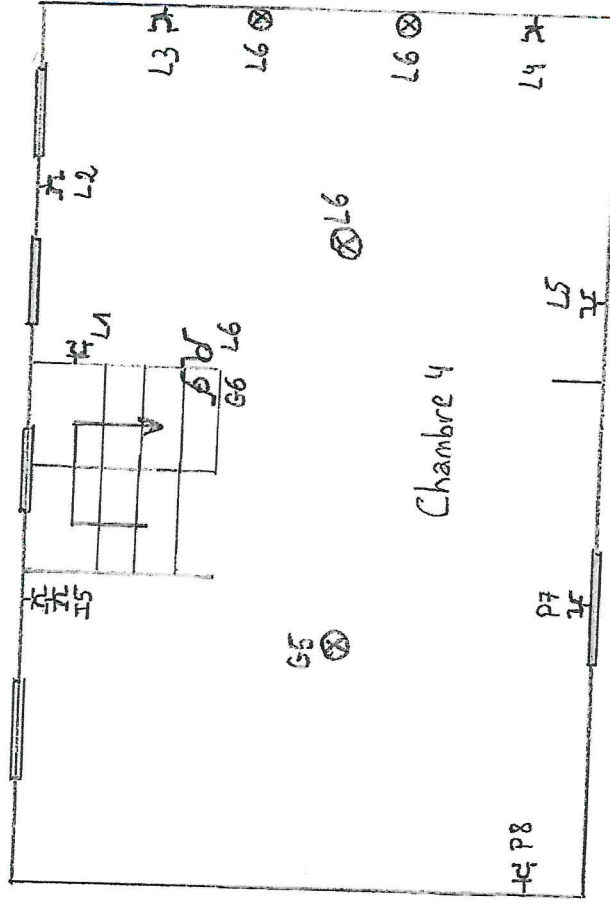

ADRESSE DE L'INSTALLATION :

M. et Mme. REIP
rue de Rechain, 62
4820 DISON

INSTALLATEUR :

Propriétaire - M. REIP Pascal
rue de Rechain, 62
4820 DISON

ORGANISME AGREER :

[Signature]

