

Keuringsrapport

Elektrische installatie

Rapportnummer: RAP.1002.004.1717229.REV0

Pagina 1 van 1

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Landuitstraat 165 te 9470 Denderleeuw
 Naam eigenaar
 Adres eigenaar
 Type object Eengezinswoning
 EAN-code niet beschikbaar
 Aard installatie nieuw
 Doel onderzoek in dienststelling



Het onderzoek is verricht op 13/09/2010 volgens artikel art 270 van het AREI en onze procedure(s) TP1.

Installatiegegevens

Spanning (V) 230 (1f+N)
 Type elektrode lus
 Ø voedingsleiding (mm²) 10
 Waarde hoofdschakelaar (A) 40

Gegevens hoofdbeveiliging (A) 40
 Waarde differentiële schakelaar(s) (mA) 300 en 30
 Aantal verdeelborden 2
 Aantal stroombanen per verdeelbord 8

Metingen

RA / ZS (Ω) 13,2 /
 Continuïteitsmeting goed

ΔI differentiële schakelaar(s) (mA) goed
 Isolati weerstand van de installatie (MΩ) >0,5

Inbreuken

1. nihil

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.

Opmerkingen

(Ver)bouwjaar: na okt 1981
 Voor de omschrijving van de installatie zie schema's

Besluit

De installatie is conform het AREI.
 De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraad- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd
 De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 13/9/2035.

Voor de directeur, op 13/9/2010


Naam agentonderzoeker: Davy Defour

Handtekening:




Raadgevingen

1. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
2. In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
3. Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtsreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
4. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

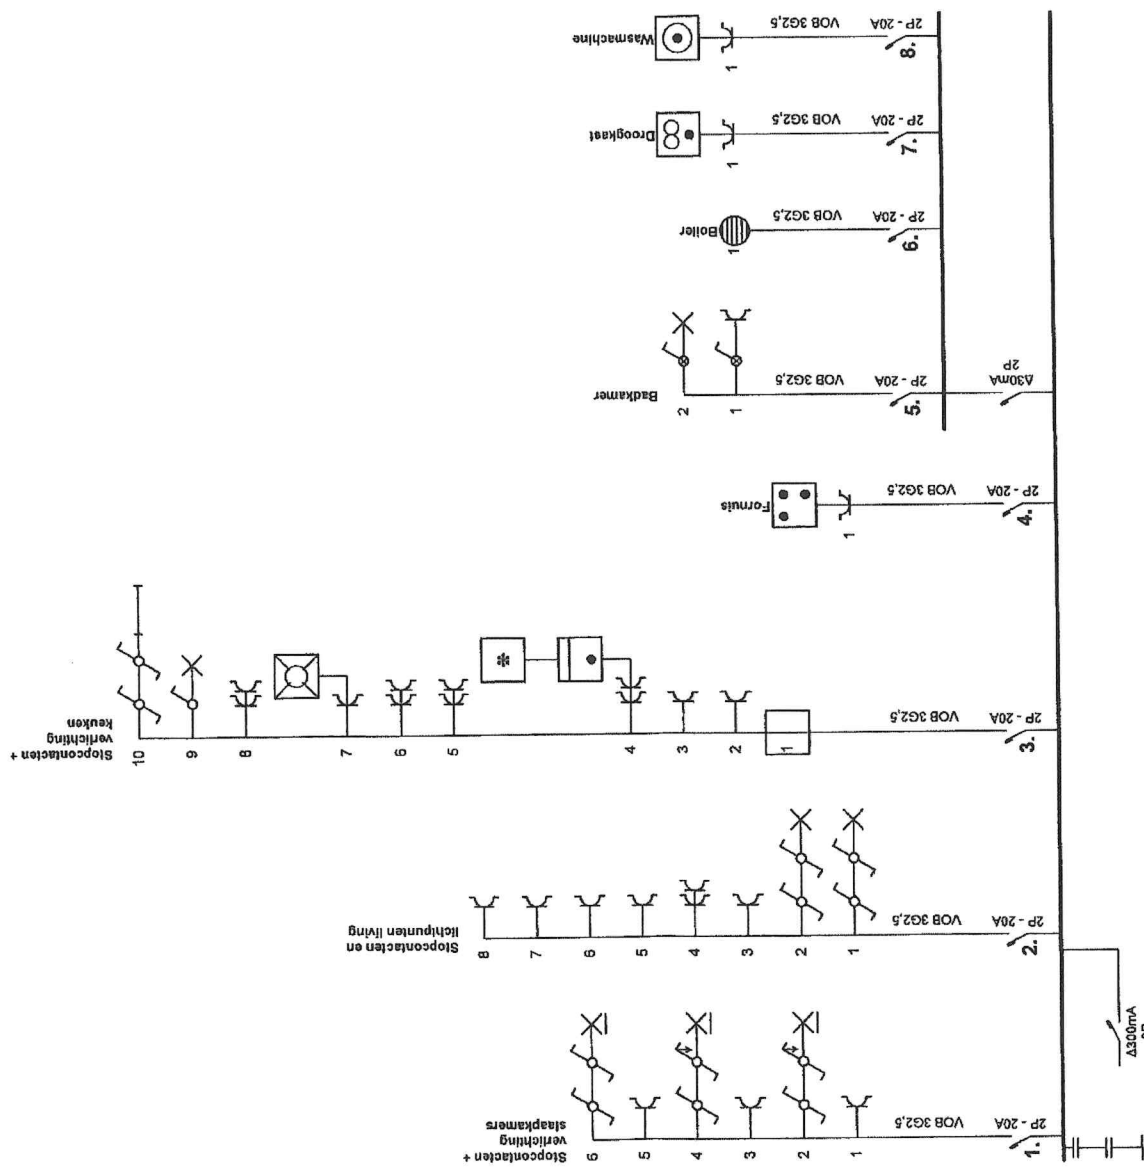

Installateur Casa Sinove B.V.B.A. Molensstraat 51 9340 Impe Tel.: - GSM: - Fax: 0495 60 13 06 e-mail: info@casasinove.be BTW BE 0809.948.515	Plaats van de elektrische installatie Van Cleemputte Timmy Landuitstraat 165 9470 Denderleeuw Tel.: - GSM: - Fax: - e-mail: -	Controleorganisme Keurtech Tel.: - GSM: 0495 60 13 06 Fax: - e-mail: info@casasinove.be
p. 1/4 Eendraadschema 2 x 230V ~ 50Hz		

Gelijkvloers

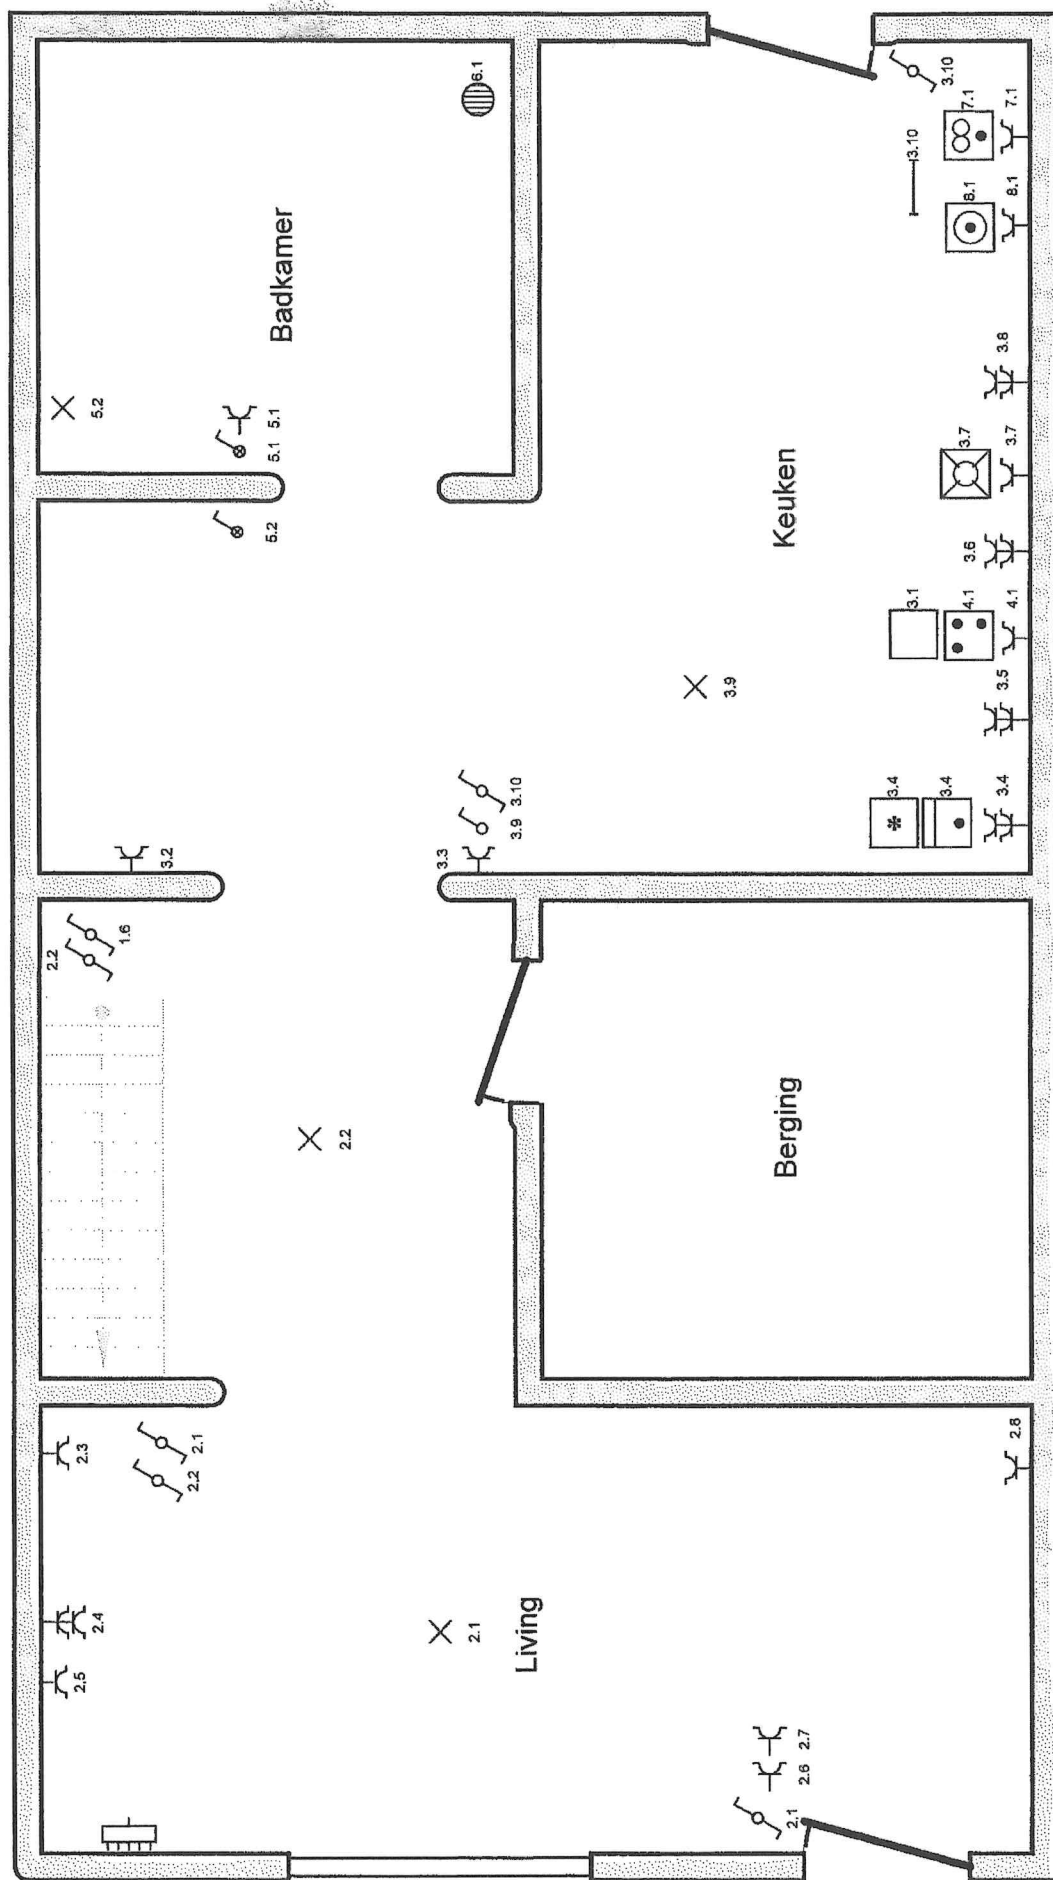

Controleorganisme
Keurtech

Tel.: - GSM: 0495 60 13 06
Fax: -
e-mail: info@casasinove.be

Plaats van de elektrische installatie

Van Cleemputte Timmy
Landuitstraat 165
9470 Denderleeuw
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Casa Sinove B.V.B.A.
Molenstraat 51
9340 Impe
Tel.: - GSM: -
Fax: 0495 60 13 06
e-mail: info@casasinove.be
BTW BE 0809.948.515

p. 2/4
Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

1.:	Stopcontacten + verlichting slaapkamers
2.:	Stopcontacten en lichtpunten living
3.:	Stopcontacten + verlichting keuken
4.:	Fornuis
5.:	Badkamer
6.:	Boiler
7.:	Droogkast
8.:	Wasmachine

Controleorganisme Keurtech Tel.: - GSM: 0495 60 13 06 Fax: - e-mail: info@casasino.be	Plaats van de elektrische installatie Van Cleemputte Timmy Landuiststraat 165 9470 Denderleeuw Tel.: - GSM: - Fax: - e-mail: -	Installateur Casa Sinove B.V.B.A. Molenstraat 51 9340 Impe Tel.: - GSM: - Fax: 0495 60 13 06 e-mail: info@casasino.be BTW BE 0809.948.515	p. 4/4 Lijst Kringen 2 x 230V ~ 50Hz
--	---	---	---
