

RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE A BT/TBT (A.R. DU 08/09/2019 - LIVRE 1 - 4.2.3.2 - 4.2.4.3 - 5.3.5.2 - 5.4.2.1 - 5.4.3.6 - 5.4.4 - 7.1 - 7.2.5.1)

VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION EXISTANTE (A.R. DU 08/09/2019 - LIVRE 1 - 2.11.2 + 6.5)

Objet	Habitation	Maison
	Adresse	Lognoul 28, 4190 Ferrières
	Propriétaire	ANGEL VANDESCHRIK
	Demandeur	AUTOMATION BY RITON (installateur)
	Téléphone	0494384027
	A.R. du 08/09/2019 - Livre 1:	6.5 - Contrôle périodique Dérogations appliquées : 8.2.2 - Date d'installation comprise entre le 1/10/81 et le 31/5/2020



Installation	Tension actuelle	3N400V
	Code EAN	Non communiqué
	Protection gén.	20A
	Qté tableaux	2
	Qté circuits	19 +
	Câble compteur-tableau	Vfwb 4x10mm ²
	Conducteur principal de terre	16mm ²
	Diff. gén. ≤ 300 mA (DDRG)	• 40A 300mA
	Diff. suppl. ≤ 30 mA (DDRS)	• 40A 30mA

Mesures			
Résistance de dispersion de prise de terre (PDT)		Isolement général par rapport à la PDT	
15.6Ω		1.28MΩ	
Appareil utilisé		MES012	
Critère		Critère	
1. Résistance de dispersion de prise de terre (PDT)	OK	6. Protection contre contacts indirects	OK
2. Isolement général par rapport à la PDT	OK	7. Appareillage fixe et à poste fixe	OK
3. Continuité de terre	OK	8. Canalisations électriques (fils, peignes, câbles, conduits)	OK
4. Différentiel(s) général(aux) (DDRG)	OK	9. Repérages et/ou schémas unifilaire et de position	OK
5. Protection contre contacts directs	OK		

CONFORME

Installation conforme aux prescriptions de l'A.R. du 08/09/2019 - Livre 1.

Schémas unifilaires et plans de position contrôlés conformes, datés et signés

Installation à faire de nouveau contrôler avant

25 ans après émission du rapport conforme (avant le 23/11/2047)

Renforcement de puissance du raccordement au réseau public

Permis (maximum : 20A / Nouvelle tension :)

Bornes amont de la protection différentielle générale scellées ?

Oui

Pour CERTIGREEN test, l'inspecteur



CERTIGREEN test - asbl de contrôle agréé

Adresse Rue de la Vecquée 170
B-4100 Seraing
Tél +32 471 58 07 08
E-mail info@certigreen.be
TVA BE 0650 647 987
www.certigreen.be



P.V. N° SGE-BTD-23-11-22-10237-CP

Date de visite : 23/11/2022

1^{re} visite


Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation, et uniquement sur les installations domestiques concernées par la demande qui nous a été adressée. Aucune modification apportée à l'installation après le passage de l'agent-visiteur n'est prise en compte dans ce rapport. Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Toute réclamation est à transmettre à la société par écrit. Il peut être fait appel aux résultats d'inspection via recours au SPF Economie Direction générale de l'Energie. Toute information contenue dans le présent rapport est confidentielle et ne peut être divulguée qu'au demandeur et au propriétaire. Seul le service du ministère fédéral de l'économie en charge de la surveillance des organismes de contrôle agréé peut avoir accès, à sa demande, à ces informations. En cas de non-conformité persistante à la seconde visite, une copie du rapport est d'office transmise au SPF Economie Direction générale de l'Energie par CERTIGREEN test.

Obligations du propriétaire (AR du 8/9/19 - Livre 1 - 9.1.2 + 3.1.2 + 6.5.7.2.b7) : 1. Conserver, dans le dossier de l'installation électrique, ce procès-verbal, les plans et toute notice décrivant les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils ou canalisations électriques (nous conseillons de placer une copie de ces documents à proximité du tableau électrique principal) - 2. enseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique - 3. Aviser immédiatement le Ministre des affaires économiques, Direction générale de l'Energie, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité - 4. Entretenir ou faire entretenir son installation (tester régulièrement toutes les protections à courant différentiel résiduel via leur bouton de test, resserrer les bornes des tableaux une fois par an, dépoussiérer,...) - 5. Prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions de l'AR du 8/9/19 - Livre 1 soient en tout temps observées - 6. Transmettre au locataire, nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant le dossier de l'installation électrique.

Infractions

Informations complémentaires

Test de déclenchement de la (des) protection(s) différentielle(s) effectué par bouton de test et par injection de courant OK

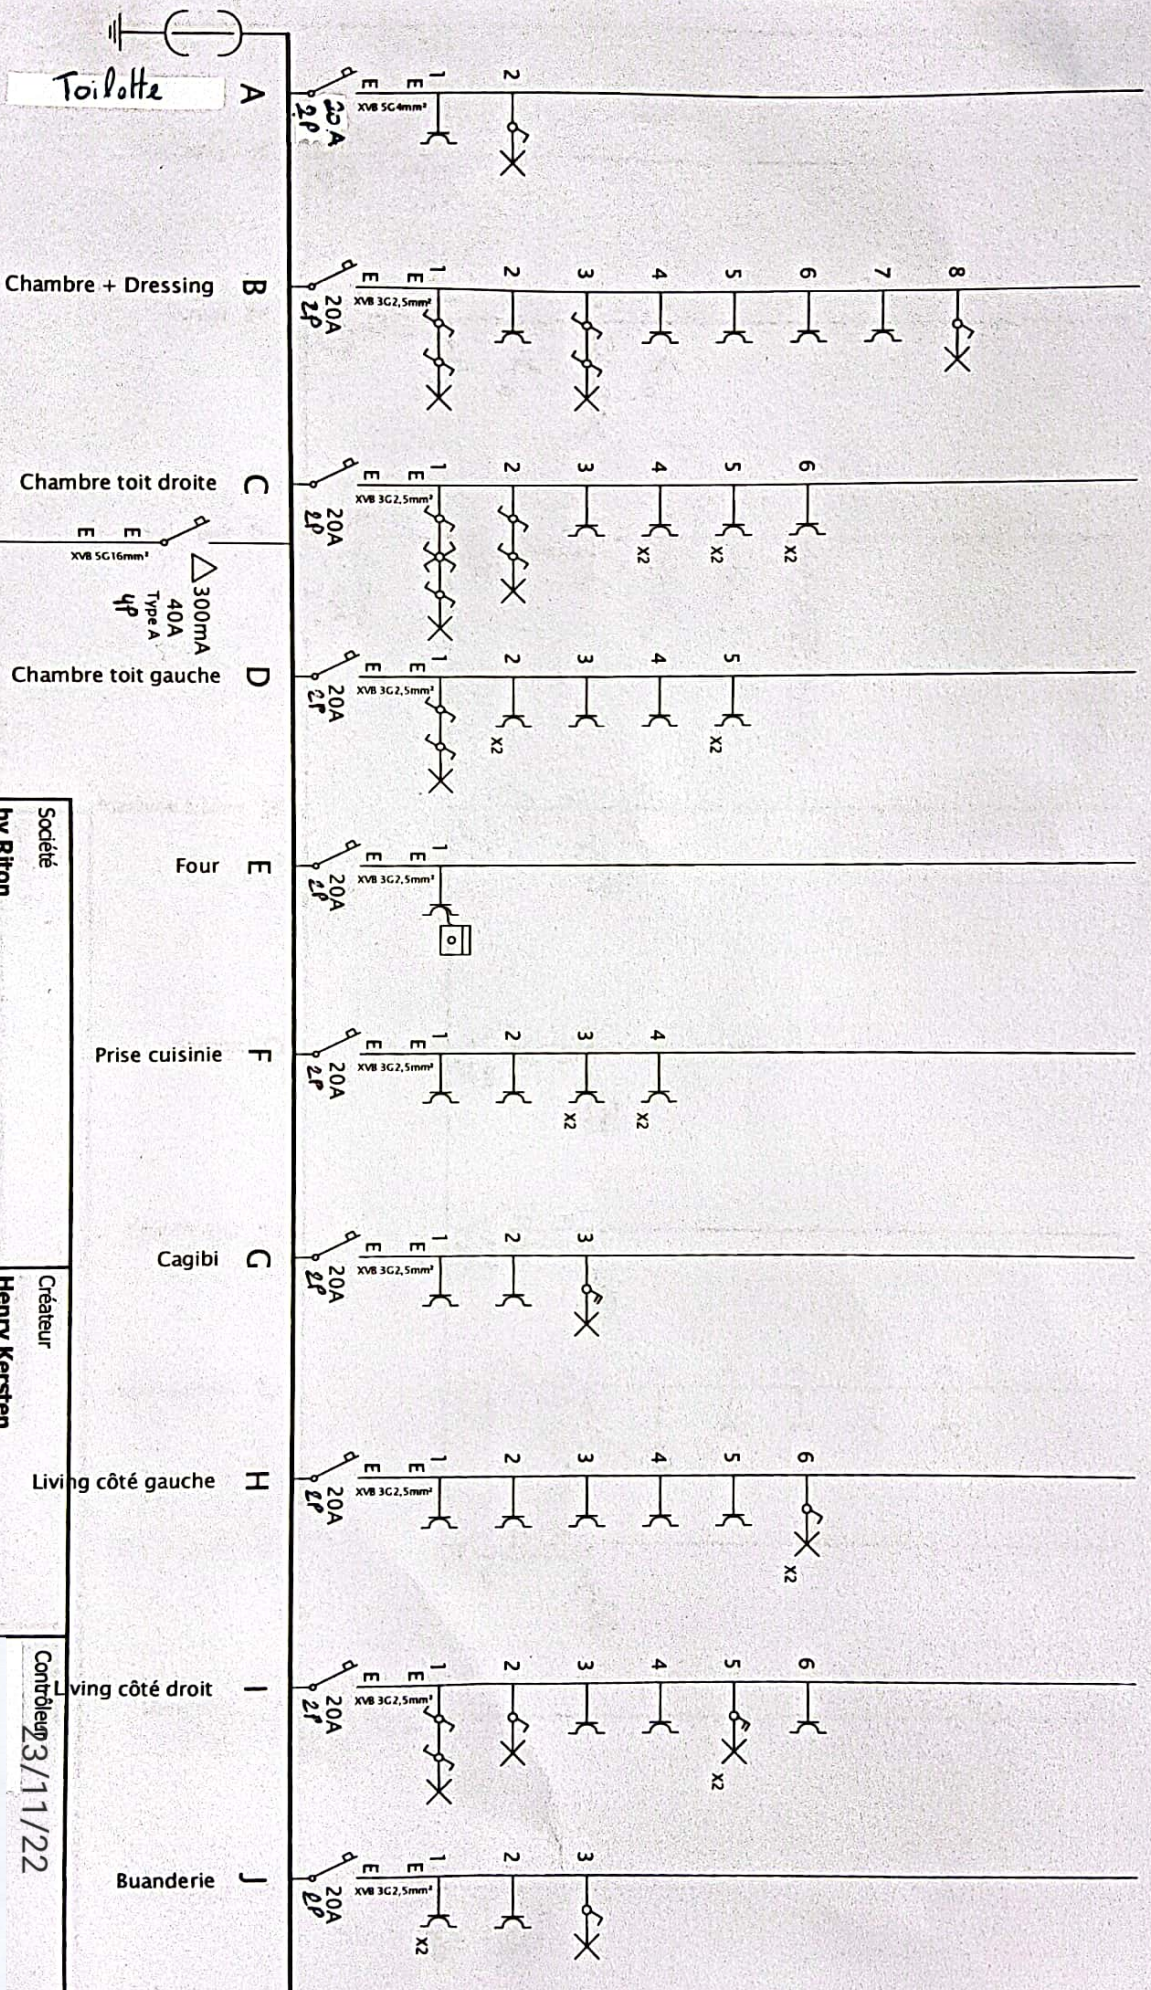

Toi botte

kWh

Chambre + Dressing

Chambre toit droite

Chambre toit gauche

Four

Prise cuisine

Cagibi

Living côté gauche

Living côté droit

Buanderie

Société
by Riton

Créateur
Henry Kersten

Type de document
Schéma unifilaire

Titre, titre supplémentaire

Lognoul 28 4190 Ferrières

Schéma unifilaire 1/2

Contrôleur
23/11/22

SCIOUX
Gautier
06 71 93 44 02

Rév.


Date de publication

Lang.


Page
7/8

RITON

RITON

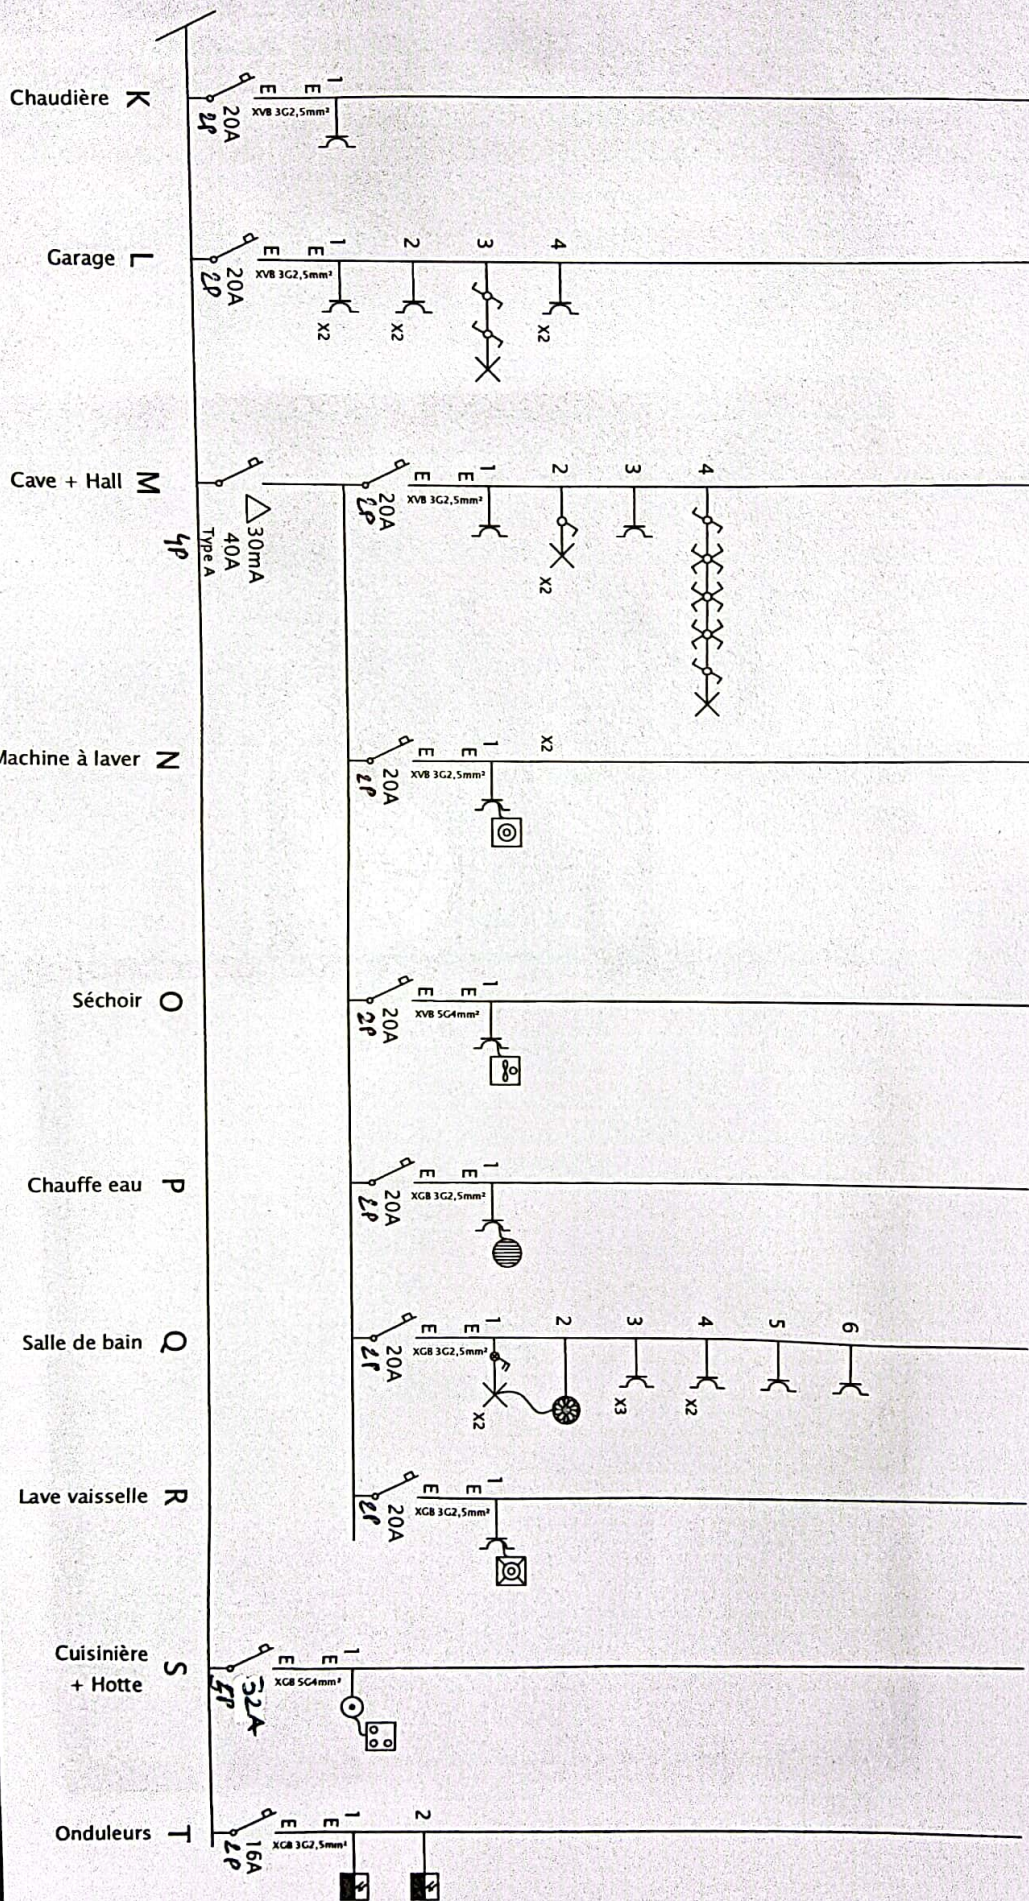

Société by Riton		Créateur Henry Kersten		Contditeur 	
Type de document Schéma unifilaire		Titre, titre supplémentaire Lognoul 28 4190 Ferrières		Rév.	
Schéma unifilaire 2/2		Date de publication 10-06-22		Lang.	
				Page 8/8	

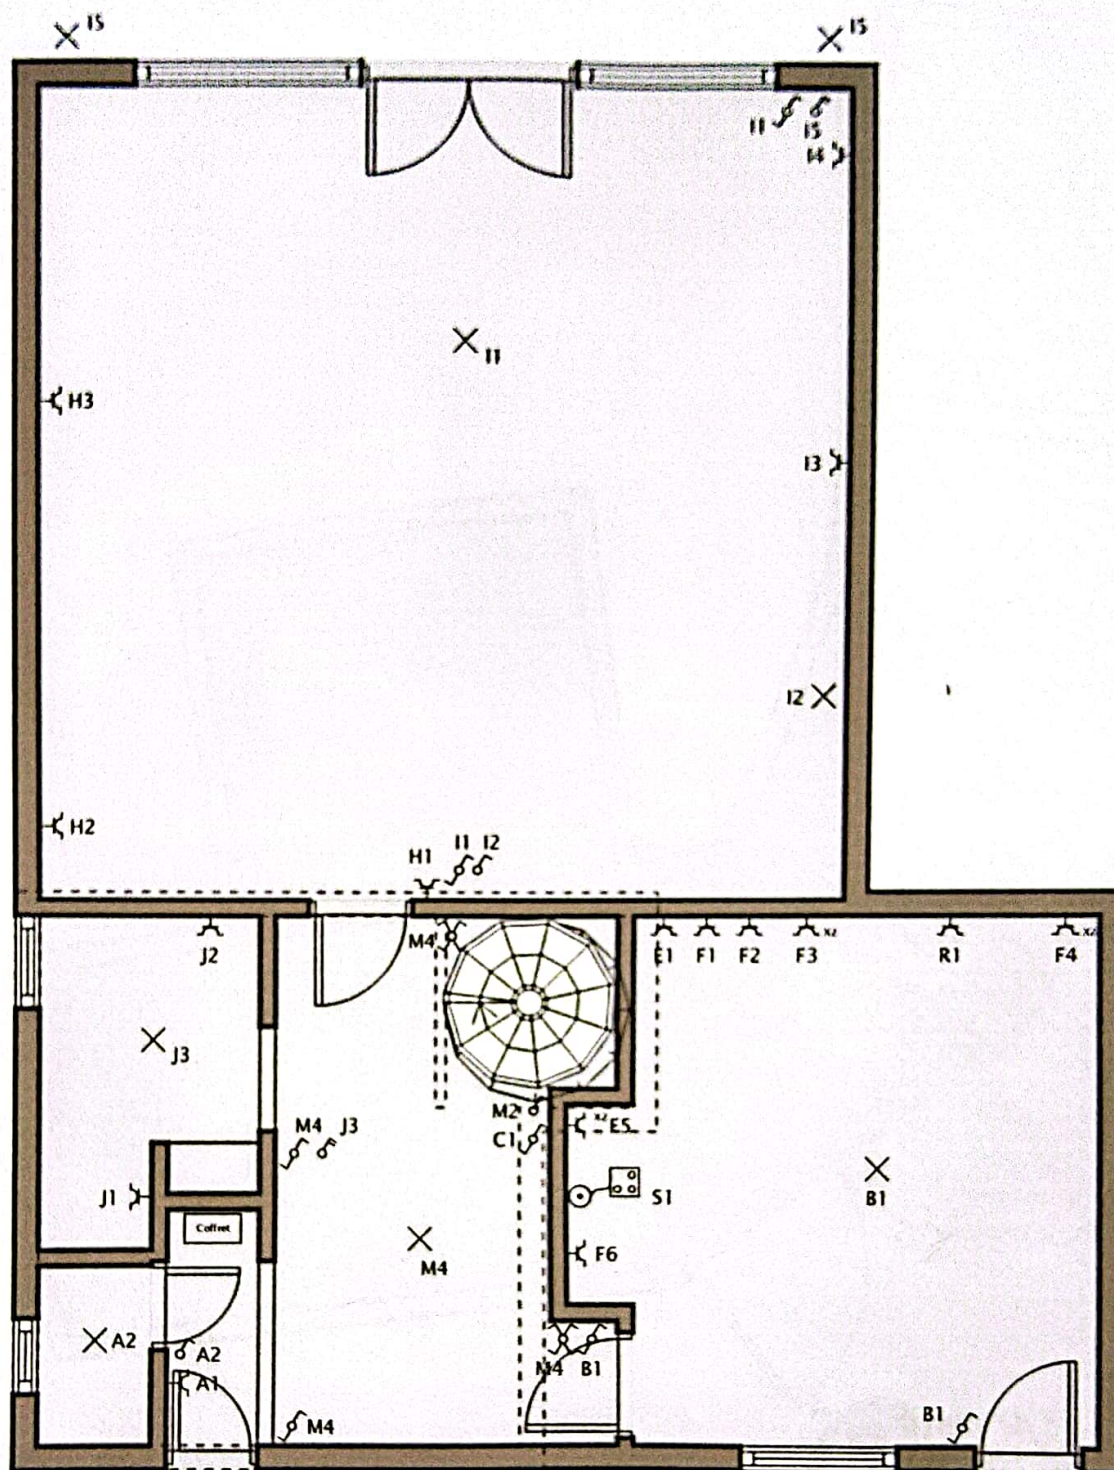

RITON *Kersten*

Société by Riton	Créateur Henry Kersten	Contrôleur  Sarah Geutzen 0471 93 44 02 <i>[Signature]</i>
	Type de document Schéma de position	Rév. Date de publication 10-06-22 Lang. Page 2/8
	Titre, titre supplémentaire Lognoul 28 4190 Ferrières Rez-de-chaussée	



Société
by Riton

Créateur
Henry Kersten

Type de document
Schéma de position
Titre, titre supplémentaire
Lognoul 28 4190 Ferrières
Buanderie et Garage


Date de publication

Lang.


Page
3/8


CERTIGREEN
Geuzen
0471 93 44 02
Scorh

Contrôleur


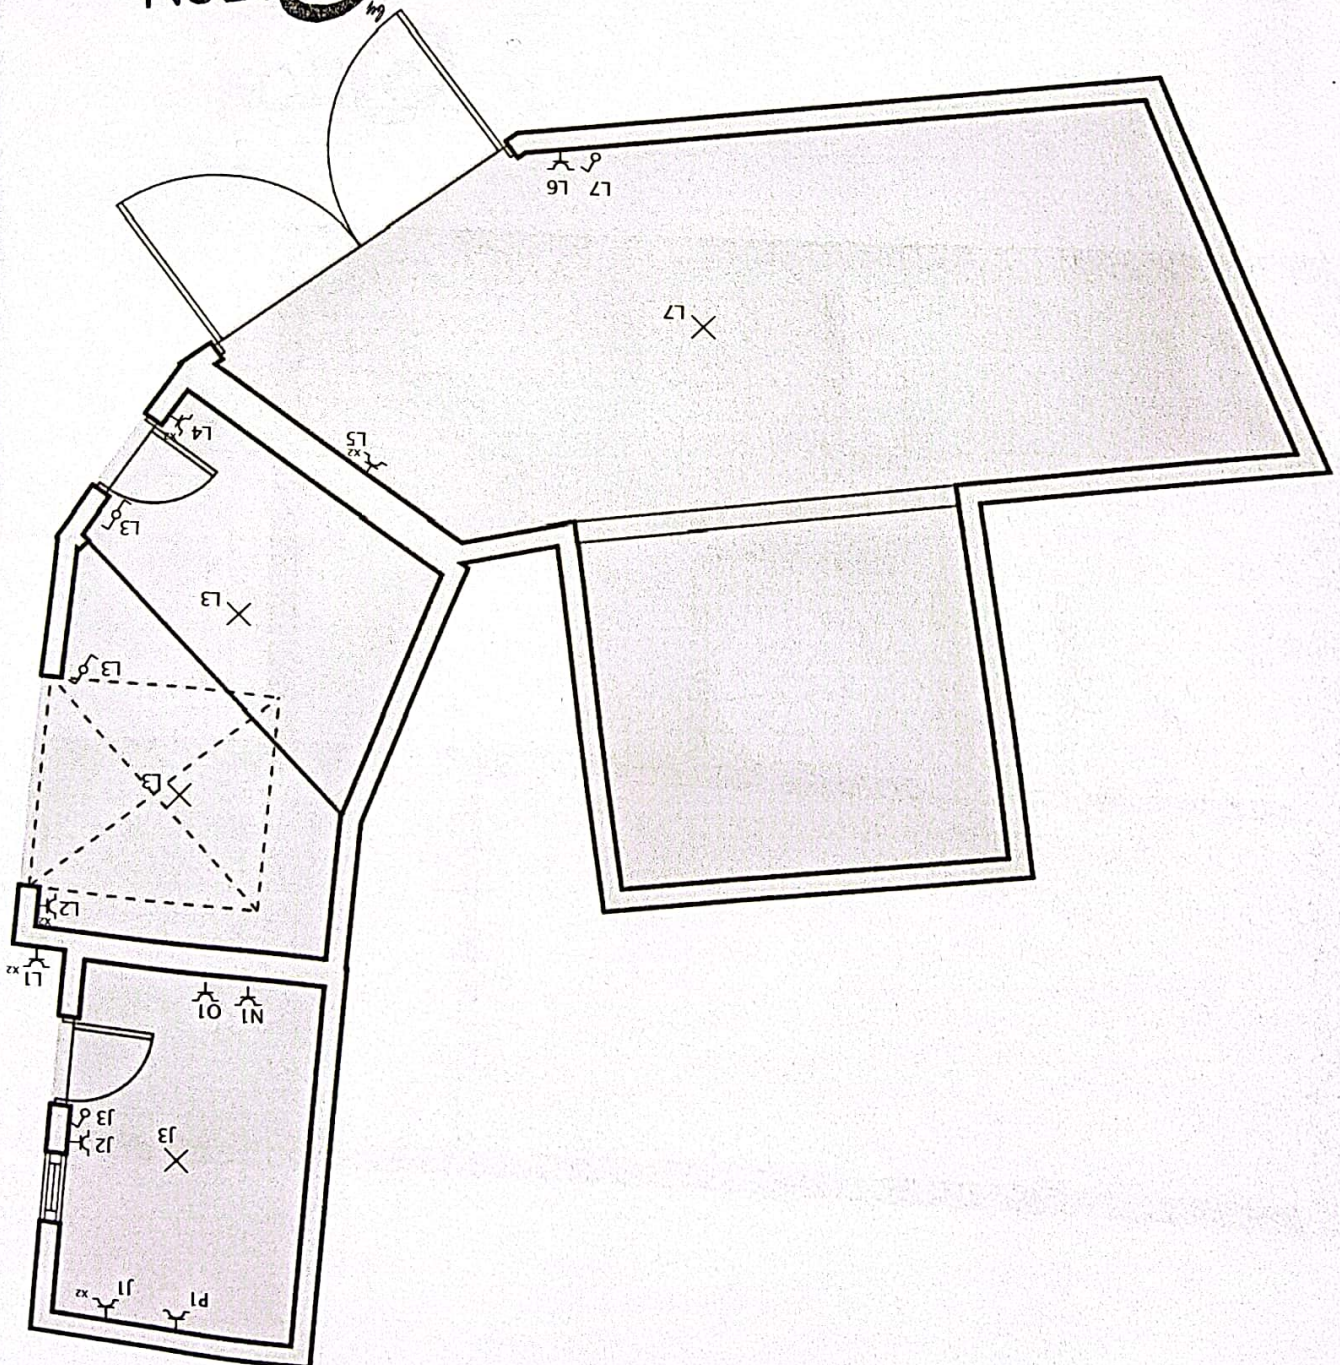


Société by Riton		Créateur Henry Kersten		Contrôleur 	
Logo 		Type de document Schéma de position		CERTIGREEN Geuzen 0471 93 44 02 10-06-22	
Titre, titre supplémentaire Lognouil 28 4190 Ferrières		1er étage		Date de publication 10-06-22	
Page 4/8		Lang.			



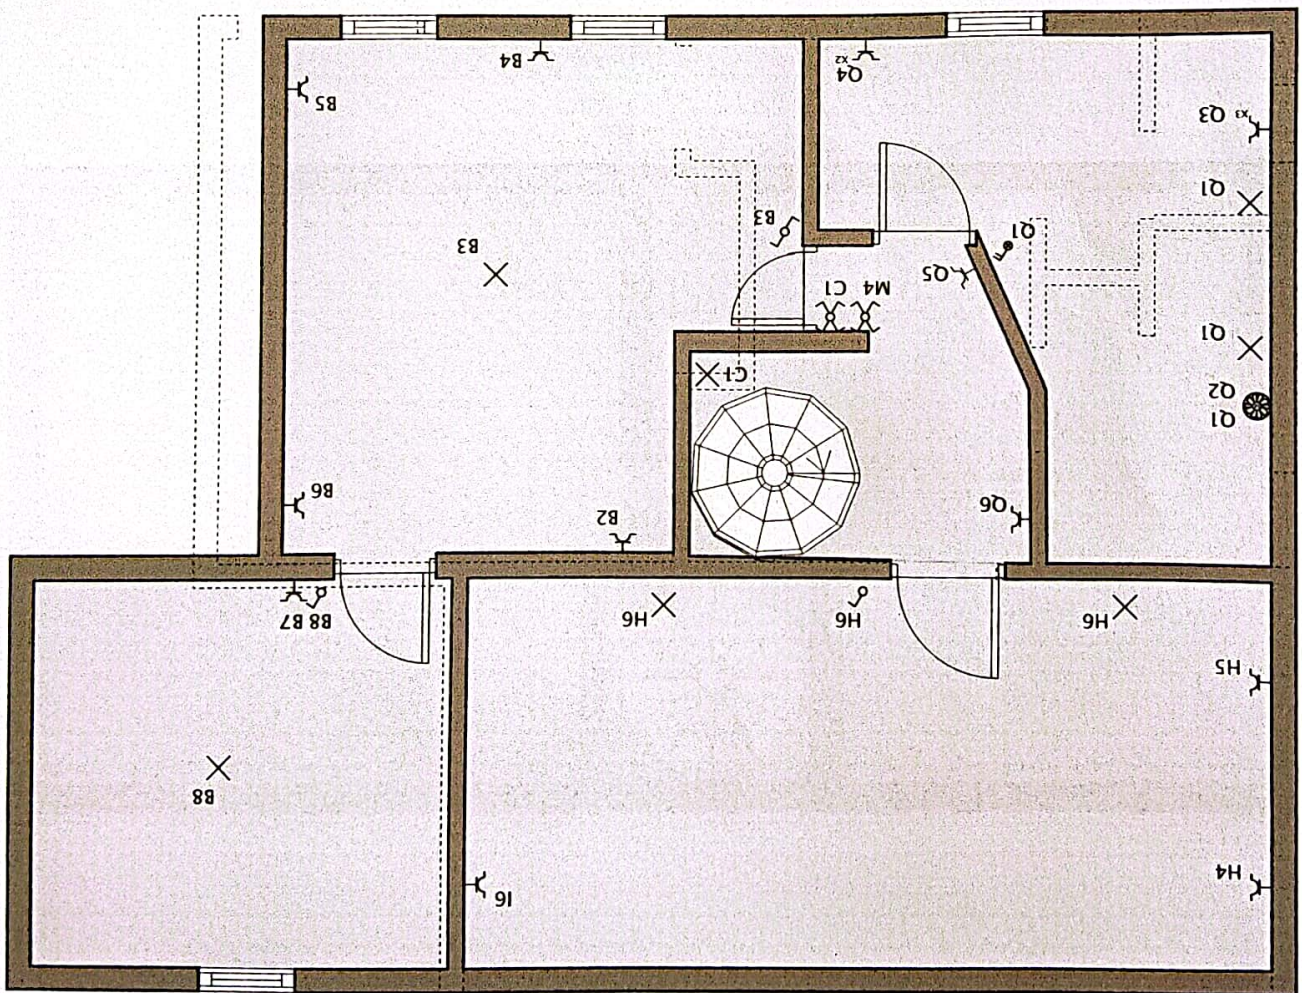Société		Créateur		Henry Kersten		Contrôleur	
by Riton		Type de document		Schéma de position		Titre, titre supplémentaire	
Lognoui 28 4190 Ferrières		Cave		Date de publication		Lang.	
10-06-22		Page		6/8			

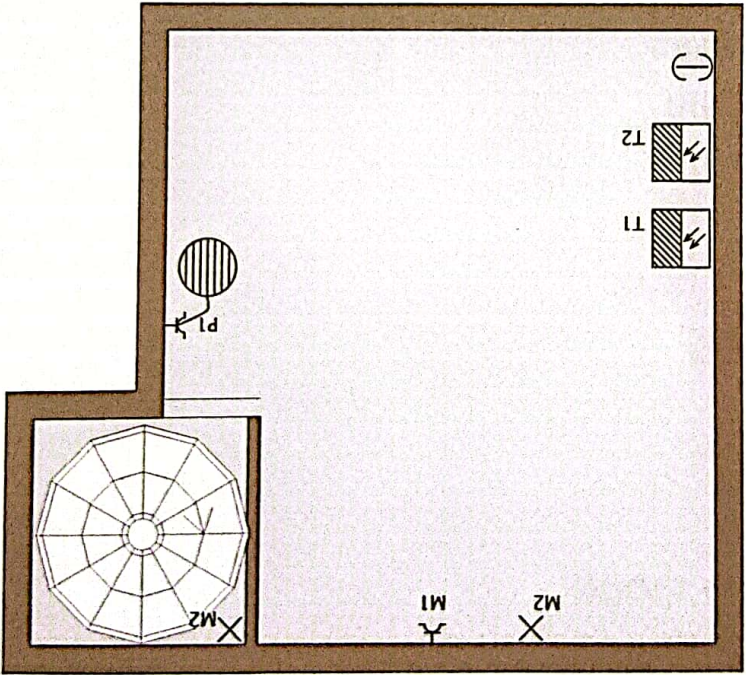

Société by Rilton		Créateur Henry Kersten		Contrôleur	
		Type de document Liste des circuits		 SORAH GEUTZEN 0471 93 44 02	
		Titre, titre supplémentaire Lognou 28 4190 Ferrières		Date de publication 10-06-22	
				Page 1/8	



A	Toilette
B	Chambre + Dressing
C	Chambre toit droite
D	Chambre toit Gauche
E	Four
F	Prise Cuisine
G	Cagibi
H	Living côté gauche
I	Living côté droite
J	Buanderie
K	Chaudière
L	Garage
M	Cave + Hall
N	Machine à laver
O	Séchoir
P	Chauffe eau
Q	Salle de bain
R	Lave vaisselle
S	Cuisinière + Hotte
T	Onduleurs
