

KEURINGSORGANISATIE

IBAN:

http://www.inspectbelgium.be

Opdracht: 60206

Klant / Bedrijf: De Luca Enrico

ID Extern:

Verslagnr: 20230023915-V.1

INSPECT BELGIUM asbl/vzw

BTW BE0647601296

Chaussée de Tienenmont, 5

Klantnr.: 00076998

Adres: 19, Lindeveldstraat, 1930

Nossegem

Voorl.verslagnr:

TEL: +32 10 280 577 - +32 15 860 460

info@inspectbelgium.be

Contactpersoon:

BTW:

Uitgiftedatum: 2023-12-28

SO/23027445

ORIGINEEL EXEMPLAAR

**INSPECT
BELGIUM**

VZW 1988

VERSLAG VAN HET CONTROLEBEZOEK VAN EEN BESTAANDE ELEKTRISCHE L.S. en Z.L.S INSTALLATIE

ALGEMEENHEDEN

Aard installatie: Bestaande

Plaats van onderzoek: 1930 Nossegem, 19, Lindeveldstraat

Verdieping: /

Referentie: Boek I Hoofdstuk 6.5. Boek I Afdeling 8.2.2.

Inspectiedatum: 28-12-2023

Inspecteur: Nabil ACHITE

Elgenaam: De Luca Enrico

Cont.Pers.:

Referentie documenten: Schémas

Type lokalen: Huis

Aard onderzoek: Controlebezoek

Andere reglement:

Volgende controle op: 28-12-2048 of binnen de: 300 maanden

Installateur: /

B.T.W.:

tel.:

BESCHRIJVING ELEKTRISCHE AANSLUITING

Benaming van de onderneming die de elektriciteit verdedt: FLUVIUS

EAN nr.: 541448820055453736

Teller: 3100407652

Aansluiting: Souterrain ou aérien (Ondergronds of bovengronds)

Dienstspanning: 3N400V

I max. aansluiting: 32A

Merk: Siconia

Type stroom: Wisselspanning

Stand I: 003910,457

Stand II: 003271,255

Bescherming van de hoofdaansluiting:

4P32A

Aantal geleiders: 4

Doorsnede: 10 mm²

Meter-bordverbinding:

Kabeltype: XVB

VISUELE CONTROLES - METINGEN - TESTEN

Geveiseerd en conforme schema's: JA

Beschrijving installatie:

☒ zie schema in bijlage

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde

Bescherming tegen elektrische schokken:

Differentiële testen per testknop: in orde

Foutlus controleren: in orde

Aardelektrode:

type: Ius

Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding in orde

Diff.algemene schak.: 4p 40A/300mA

Bijkomende differentieel: 4p 40A/30mA

Differentieelstroombeveiligingsinrichtingen

Nog niet geplaatst:

Aantal borden: 1

Geschiktheid tussen beveiligingsinrichtingen en doorsnede sectie: in orde

Diff-test, via foutstroom (2,5 tot 2,75 I_{Δn}): in orde

Visuele inspectie van gevaarlijke vaste of stationaire apparatuur: In orde

Hoofddifferentiële ingangsaansluitingen verzegeld door mij opgesteld: Ja

De ééndraads- en situatieschema(s) moeten opnieuw worden ondertekend: Ja

Geschiktheid tussen het differentieel en de waarde v/d aardspreidingsweerstand: in orde

BESLUIT



DE INSTALLATIE IS CONFORM

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. Het volgende controlebezoek moet worden uitgevoerd binnen de door dit Boek Voorgeschreven termijn (zie hierboven).

Voor de Technisch Directeur,
De Inspecteur,

[Handwritten signature]

VASTSTELLINGEN

Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk op boek 1 (I) - de nummers die verwijzen naar de standaard Inbreuken

KEURINGSORGANISATIE

INSPECT BELGIUM asbl/vzw

+32 10 280 577 - +32 15 860 460

1 3

KEURINGSORGANISME

IBAN:

<http://www.inspectbelgium.be>

Opdracht: 60206

Klant / Bedrijf: De Luca Enrico

ID Extern:

Verslagnr: 20230023915-V.1

INSPECT BELGIUM afd. VZW

BTW BE0697601296

Chaussée de Tirlumont, 5

Klantnr.: 00076998

Adres: 19, Lindeveldstraat, 1930

Nossegem

Voorl.verslagnr.:

TEL +32 10 260 577 - +32 15 860 460

info@inspectbelgium.be

Contactpersoon:

BTW:

Uitgiftedatum: 2023-12-28

SO/23027445

ORIGINEEL EXEMPLAAR

**INSPECT
BELGIUM**

VZW ARSO

- N11 () - Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
N12 () - Het onderzoek beperkt zich tot de gemak, toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de instal. en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.
N13 () - Tenzij anders vermeld, betreft het onderzoek de goede staat en/of werking van de installatie, de opvatting is niet van toepassing.

De Inspecteur verklaart dat hij al de stappen van de procedure heeft gevolgd. JA

OPMERKINGEN:

Volgens de onderafdeling 6.5.7.2.b.7. van het Boek 1 is het verplicht te herinneren:

- a) de verplichting het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Boek 1: AREI

goedgekeurd (of ingevoegd) door het koninklijk besluit van 8/09/2019

Volgens de onderafdeling 3.1.2.1. van het Boek 1 is het belangrijk te herinneren:

Het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen van de elektrische installatie worden aan de eigenaar, de uitbater of de beheerder van de elektrische installatie overhandigd om deel uit te maken van het dossier van de elektrische installatie. Een kopie van het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen worden bewaard gedurende vijf jaar door voormeld erkend organisme zoals vermeld in onderafdeling 6.4.6.1. Gedurende de voormelde periode, kan de eigenaar, de uitbater of de beheerder van de elektrische installatie bij het betrokken erkend organisme verzoeken om een duplicaat van het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen te krijgen. Voor het ter beschikking stellen van een kopie van het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen mag een vergoeding worden gevraagd, waarvan het bedrag door het erkend organisme wordt vastgelegd. De vergoedingen die eventueel worden aangerekend voor het ter beschikking stellen ervan mogen de kostprijs van een controle niet overschrijden.

Livre 1: RGIE approuvé (ou introduit) par l'arrêté royal du 08/09/2019.

ORGANISME DE CONTRÔLE

IBAN:

http://www.inspectbelgium.be

Mission: 60206

Client / Entreprise: De Luca Enrico

ID Externe:

INSPECT BELGIUM asbl/vzw

TVA BE 047601396

Chaussée de Tufemont, 5

No Client: 00076998

Adresse: 19, Lindeveldstraat, 1930

Nossegem

Ref. PV précédent:

Tél: +32 10 280 577 - +32 15 860 460

info@inspectbelgium.be

Contact:

TVA:

Date d'émission: 2023-12-28

SO/23027445

EXEMPLAIRE TRADUIT

**INSPECT
BELGIUM**

VZA 4356

Num. rapport: 20230023915-V.1

RAPPORT DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT & TBT DOMESTIQUE EXISTANTE**GENERALITE**

Type d'installation: Existante

Lieu d'inspection: 1930 Nossegem, 19, Lindeveldstraat

Étage: /

Référence: Livre I Chapitre 6.5., Livre I Section 8.2.2.

Date d'inspection: 28/12/2023

Inspecteur: Nabil ACHITE

Propriété de: De Luca Enrico

Pers. Cont.:

Documents de référence: Schémas

Type de locaux: Maison

Type d'inspection: Visite de contrôle

Autres Règlements:

Prochain contrôle au plus tard le: 28/12/2024 ou dans un délai de: 300 mois

Installateur: /

T.V.A.:

tel.:

DETAILS DU POINT DE FOURNITURE

Nom de l'entreprise distributrice d'électricité: FLUVIUS

Numero EAN: 541448820055453736

Compteur: 3100407652

Raccordement: Souterrain ou aérien (Ondergronds of bovengronds)

Tension de serv.: 3N400V

I max. instal.: 32A

Liaison comptage-coffre de repart.

Type de câble: XVB

Marque: Siconia

Nature du courant: Alternatif

Index I: 003910.457

Index II: 003271.255

Prot. princ. branchement: 4P32A

Nombre de cond.: 4

Section: 10 mm²**CONTROLES VISUELS - MESURES - ESSAIS**

Schémas conformes et signés: OUI

Description Installation:

☒ voir les schémas en annexe

Installation exécutée conformément aux schémas: en ordre

Protection contre les chocs électriques:

Différentiels essai par bouton test: en ordre

Contrôle des boudes de défaut: en ordre

Electrode de terre:

type: boucle

Continuité PE et liaison équipotentielle: en ordre

Inter. Diff. General: 4p 40A/300mA

Diff. supplém.: 4p 40A/30mA

Différentiels:

Pas encore placés:

Nombre de tableaux: 1

☒ Le différentiel en-tête d'installation est scellé☒ schéma unifilaire et plan de position ont été signés pour approbation

Etat du matériel électrique (fixation, dégradation...): en ordre

Contact direct: en ordre

Contact indirect: en ordre

Resist. d'isolement general: 378 Mohm

Section: 35 mm²

Resistance de dispersion: 14,55 Ohm

Nombre de circuit:
15

Matériel de classe I et liaison équipotentielle: En ordre

Contrôle visuel du matériel mobile à poste fixe dangereux: Pas d'application

Adéquation entre les dispositifs de protection et la section des conducteurs: En ordre

Test du dif. via courant de défaut (2,5 à 2,75 IΔn): En ordre

Contrôle visuel du matériel fixe ou à poste fixe dangereux: En ordre

Borne d'entrée du différentiel d'en-tête scellé par mes soins: Oui

Les schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) de position sont à re-signer: Oui

Adéquation entre le différentiel et la valeur de la résistance de dispersion de terre: En ordre

CONCLUSION**L'INSTALLATION EST CONFORME**

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre I concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. La prochaine visite de contrôle est à effectuer dans le délai prescrit par le Livre I (voir ci-dessus).

Pour le Directeur Technique,
L'inspecteur,**CONSTATATIONS**

Note (N) - Remarque (O) - Infraction au Livre I (I) - Dérogation (D) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

ORGANISME DE CONTRÔLE

IBAN:

<http://www.inspectbelgium.be>

Mission: 60206

Client / Entreprise: De Luca Enrico

ID Externe:

INSPECT BELGIUM afd/vzw

TVA BE0617601296

Chaussée de Tillemont, 5

No Client: 00076998

Adresse : 19, Lindeveldstraat, 1930

Nossegem

Ref. PV précédent:

TEL +32 10 280 577 - +32 15 860 460

info@inspectbelgium.be

Contact:

TVA:

Date d'émission: 2023-12-28

SO/23027445

EXEMPLAIRE TRADUIT

**INSPECT
BELGIUM**

vzw afd

Num. rapport: 20230023915-V.1

- N11() - Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.
- N12() - Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.
- N13() - Sauf stipulation contraire, l'examen porte exclusivement sur l'état et le bon fonctionnement de l'installation. Sa conception sort du cadre de la mission.

L'inspecteur certifie avoir suivi toutes les étapes de la check-list: OUI

CONSEILS/REMARQUES:

Suivant la sous-section 6.5.7.2.b.7. du Livre 1, il est obligatoire de rappeler :

- a) l'obligation de conserver le rapport de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique ;
- b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique ;
- c) l'obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques;
- d) L'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du rapport de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Suivant la sous-section 3.1.2.1. du Livre 1, il est important de rappeler :


Le rapport de contrôle, les schémas unifilaires et les plans de position signés sont remis au propriétaire/gestionnaire ou exploitant de l'installation électrique pour faire partie du dossier de l'installation électrique. Une copie du rapport de contrôle, des schémas unifilaires et des plans de position signés sont conservés par l'organisme agréé précité pendant une période de cinq ans comme mentionné dans la sous-section 6.4.6.1. Durant la période précitée, le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant de l'installation électrique peut s'adresser à l'organisme agréé concerné pour obtenir un duplicata du rapport de contrôle, des schémas unifilaires et des plans de position signés. La délivrance d'une copie du rapport de contrôle, des schémas unifilaires et des plans de position signés peut être soumise au paiement d'une rétribution dont le montant est fixé par l'organisme agréé. Les rétributions éventuellement demandées pour la délivrance de la copie ne peuvent en aucun cas excéder le prix coûtant d'un contrôle.

Livre 1: RGIE approuvé (ou introduit) par l'arrêté royal du 08/09/2019.




TD1

TD1

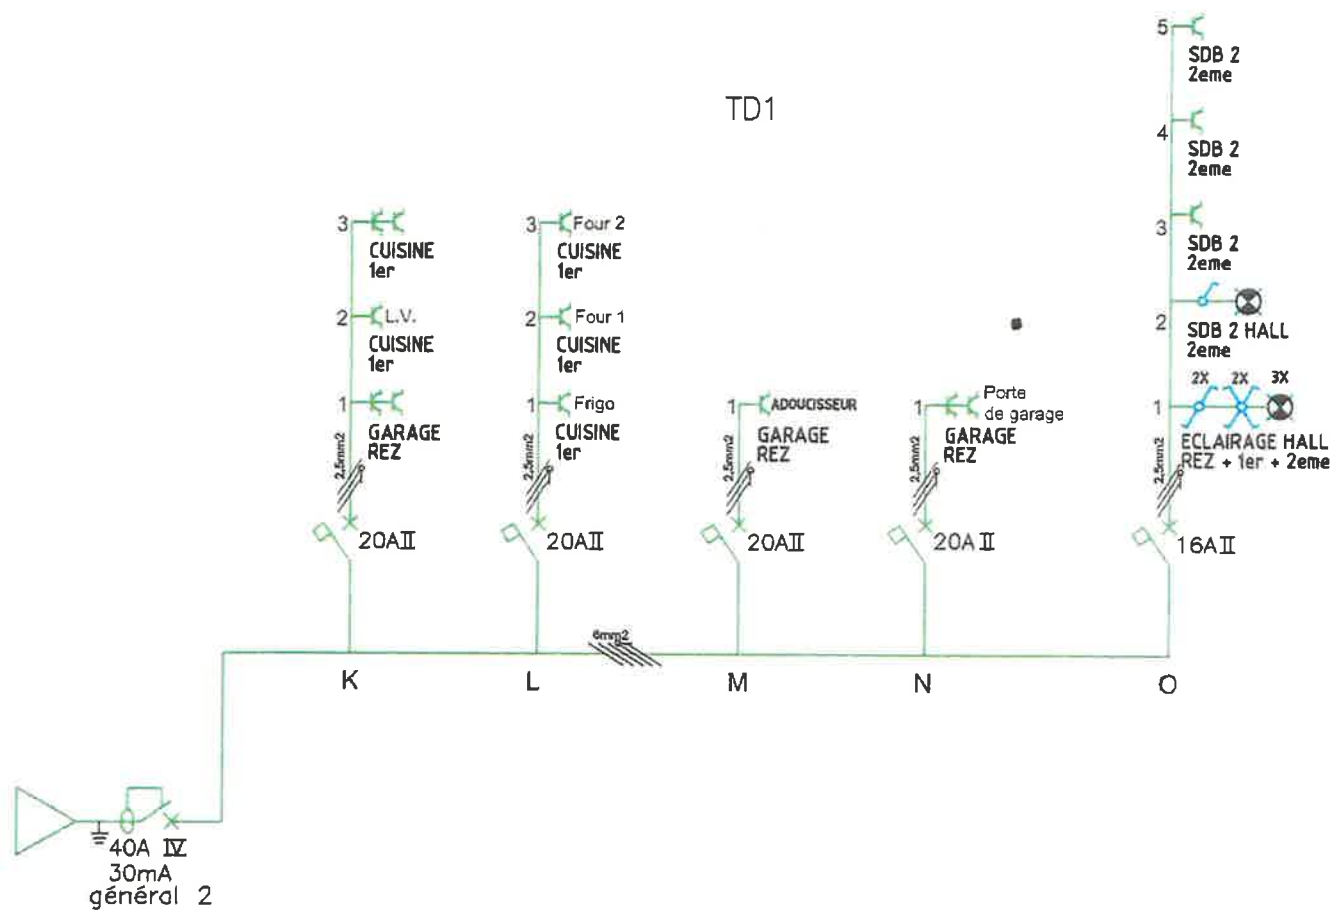


De Luca Enrico
19, Lindeveldstraat
Nossegem

SCHEMA TD1
2/2

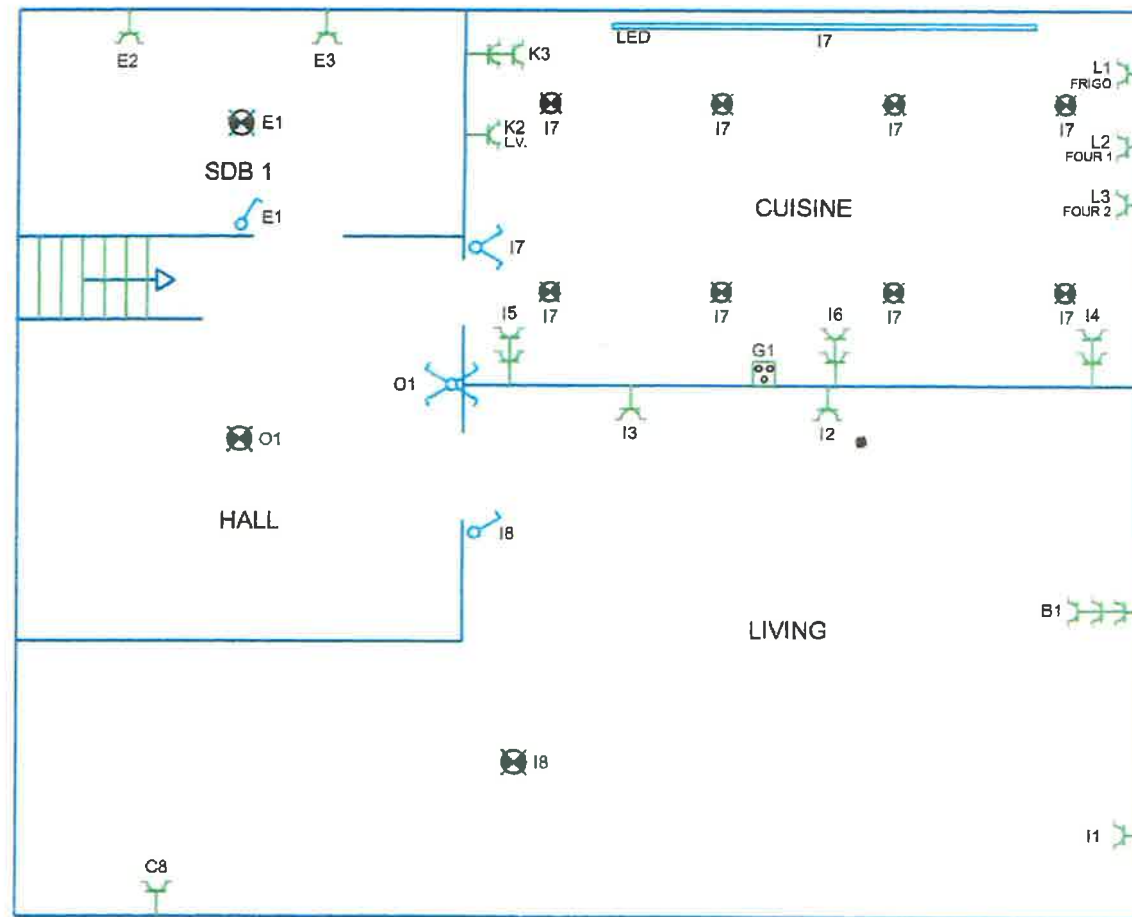

De Luca Enrico
19,Lindeveldstraat
Nossegem

PLAN ELECTRIQUE
ETAGE 1

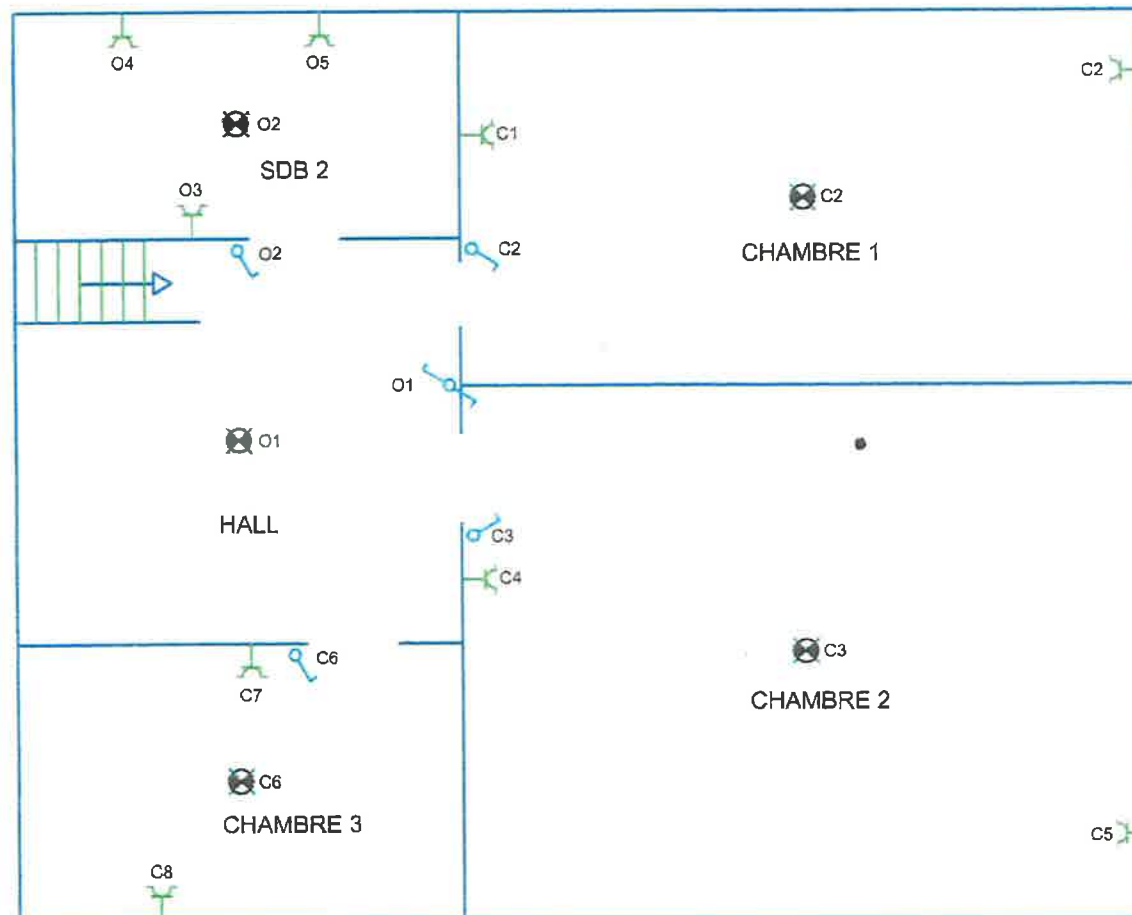

De Luca Enrico
19, Lindeveldstraat
Nossegem

PLAN ELECTRIQUE
ETAGE 2
