

**AUTONOME SECURITY CONTROLE VZW**Erkend **CONTROLEORGANISME**

Maatschappelijke zetel : Ketelstraat 111 – 3454 Rummen

Tel. 0483/429830

E-mail bureel@asc-controle.be

BTW BE 0826-131-776

IBAN BE 32 7512 0493 7802

Agent-bezoeker belast met het onderzoek: **VAN EECKHOUDT B.****VERSLAG VAN EEN niet-HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

1.- IDENTIFICATIE - INLICHTINGEN					
* Datum onderzoek		11/05/2021	Verslag nummer		BV 2021-0097
* Plaats van het onderzoek		Statielei 19 Mortsel 2640			
* Gebruiker van de installatie		VONCKX			
* Aanwezige personen		Stéphane Pillet			
* Installateur		Pro-technic BV Witvenstraat 84 2940 Hoevenen			
* DNB	Fluvius	EAN	/		
* Teller N°	50414125	Index dag	383789,8	Index nacht	131118,7
* Volgende controle uiterlijk voor		11/05/2026	BTW nr.		BE 0651 590 966

2.- VOORSCHRIFTEN				
2.1.-	Algemeen reglement voor elektrische installaties	BOEK 1 + 3 - KB 08/09/2019		
	Gelijkvormigheidscontrole	BOEK 1 - 6.4		
	Controlebezoek	BOEK 1 - 6.5		
	Eventuele afwijkende beschikkingen voor bestaande niet-huishoudelijke installaties (schrappen wat niet van toepassing is)			
	Oude n HHI zonder tewerkgesteld personeel	BOEK 1 — 8.3.1		
	Oude n HHI — oud AREI	BOEK 1 — 8.3.2		
	Referentie RA:			
	Oude n HHI zonder tewerkgesteld personeel	BOEK 1 — 8.4.4		
	Bestaande elektrische installaties — oud AREI	BOEK 3 — 8		
	Referentie RA:			
2.2.-	Toepassing v.d CODEX over welzijn op het werk	Boek III – Titel II	V. t. *	N.v.t. *
2.3.-	Bijzondere voorschriften distributienetbeheerder		V. t. *	N.v.t. *

* V. t. = Van toepassing

* N. v. t. = Niet van toepassing

3.- ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE			
Nominale spanning in Volt	3N400 V	Algem. isolatieniveau R_i in $M\Omega$	>500
Automaat DNB	MAX 63A – gi 4P	Isolatieniveau per stroombaan	/
Verspreidingsweerstand aardinrichting R_A in Ω	1,3	Systeem v. d. aardverbinding	TT
Type aardelektrode	PENNEN	Voedingskabel hoofdbord $\varnothing$	EXVB 4 x 16 mm ²
Bescherming van de aansluiting	40A/300mA/4P	Aantal borden	1
		Aantal eindstroombanen	28
Werking van de differentieelstroominrichtingen		In regel	
Document met uitwendige invloedsvoorwaarden		Zie schema's bijlage	
Toepassing van het Codex – Boek III - Titel II: Risicobeoordeling en algemene preventiemaatregelen			
Art.III.2-3	Risico beoordeling	Risicoanalyse : Niet aanwezig	
Art.III.2-21	Documentatie	Dossier van de elektrische installatie conform bijlage III.2-2 : Niet aanwezig	

4.- NOTA'S	
4.1.-	Onderzoek conform interne procedures 23 en werkinstructie E006 op basis van de onder punt 2 vermelde voorschriften bij het uitvoeren van het gelijkvormigheidsonderzoek of controlebezoek van niet-huishoudelijke elektrische LS-installaties. Identificatie meettoestel : Metrel 3102
4.2.-	Deze keuring betreft een controle van een vernieuwde installatie.
4.3.-	Door het ontbreken van de tabel van de uitwendige invloedsfactoren , werd met de waarde in de tabel in de bijlage rekening gehouden werd bij controle .

5.- VASTGESTELDE INBREUKEN	
	GEEN

6.- BESLUITVORMING.	
6.1.	De elektrische installatie is conform met de onder punt 2 vermelde voorschriften en mag in dienst gesteld worden of blijven.

7.- MEDEDELINGEN	
7.1.	Kopieën : Onderhavig verslag mag uitsluitend in zijn geheel gereproduceerd worden na toestemming van de opdrachtgever en A"S"C
7.2.	Ter beschikking stelling van het verslag : Onderhavig verslag mag alleen in zijn geheel ter beschikking gesteld worden aan de met toezicht belaste ambtenaren.
7.3.	Betekenis van de nota's: het betreft gebreken die werden vastgesteld tijdens het onderzoek, maar die geen gevaar inhouden voor de veiligheid, maar waarvan wij wel melding willen maken, of organisatorische gegevens.
7.4.	Onderhavig verslag : heeft uitsluitend betrekking op de elektrische installaties die door A"S"C werden onderzocht en waarvan de beschrijving op de volgende pagina's wordt weergegeven.
7.5.	Periodieke controles : overeenkomstig de voorschriften van art.6.5.2 AREI – BOEK 1 en art. 6.5.2.1 – Boek 3 moet de onderzochte installatie het onderwerp uitmaken van een 5 jaarlijks controlebezoek.
7.6.	Wijzigingen aan de installaties : bij iedere belangrijke wijziging of omvangrijke toevoeging aan de elektrische installatie dient een gelijkvormigheidscontrole te gebeuren op aanvraag van de eigenaar.

8.- DE INSPECTEUR BELAST MET HET ONDERZOEK

De inspecteur

VAN EECKHOUDT BART - BV

Bijlage : Zie schema's in de bijlage

Onderzochte LS-installatie	
Betreft:	Verdeelborden en LS-installaties opgebouwd als volgt : Zie principeschema in bijlage; Zie situatieplan in bijlage .


Uitwendige invloedsfactoren (waarmee rekening gehouden bij uitvoering keuring & bij ontstentenis van de specifieke voorwaarden)													
AANDUIDING VAN HET LOKAAL OF VAN DE PLAATS	UITWENDIGE INVLOEDEN												
	AA	AD	AE	AF	AG	AH	BA	BB	BC	BD	BE	CA	CB
Magazijn	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bureau	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Keuken	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



10/05/2021
BV2021-0077
Van Eeckhoudt Bart-ASC

10/05/2021
BV2021-0077

Schema's getekend door: B.E.W. - BTW BE 0860.775.327

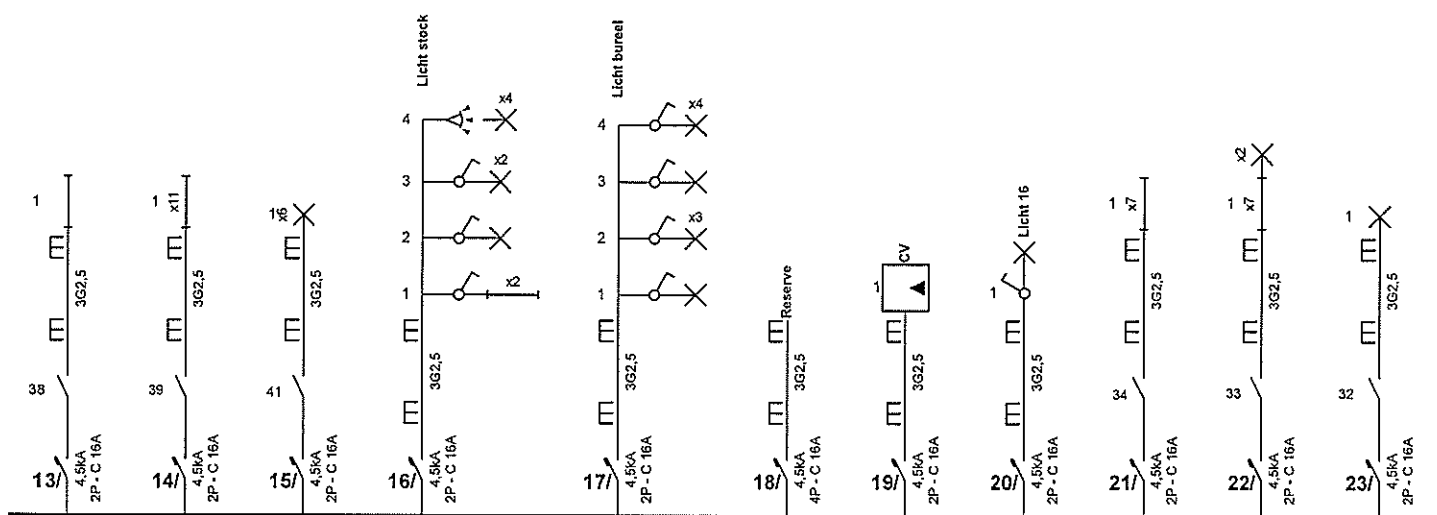


Plaats van de elektrische installatie
Vonckx
Stallelei 19
2640 Mortsel

Installateur
Pro-technic bv
Witvenstraat 84 Bus 1
2940 Hoevenen



p. 2/4
Eendraadschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

Schema's getekend door: B.E.W. - BTW BE 0860.775.327

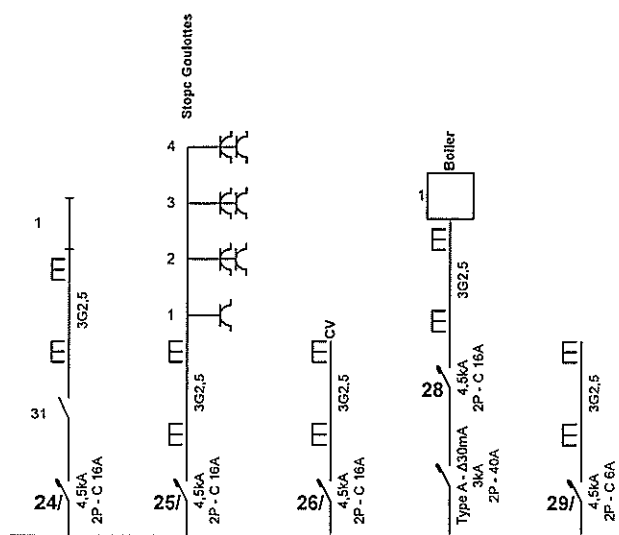


Plaats van de elektrische installatie
Vonckx
Stallelei 19
2640 Mortsel

Installateur
Pro-technic bv
Witvenstraat 84 Bus 1
2940 Hoevenen



p. 3/4
Eendraadschema
3 x 400V + N - 50Hz

Schema's getekend door: B.E.W. - BTW BE 0860.775.327

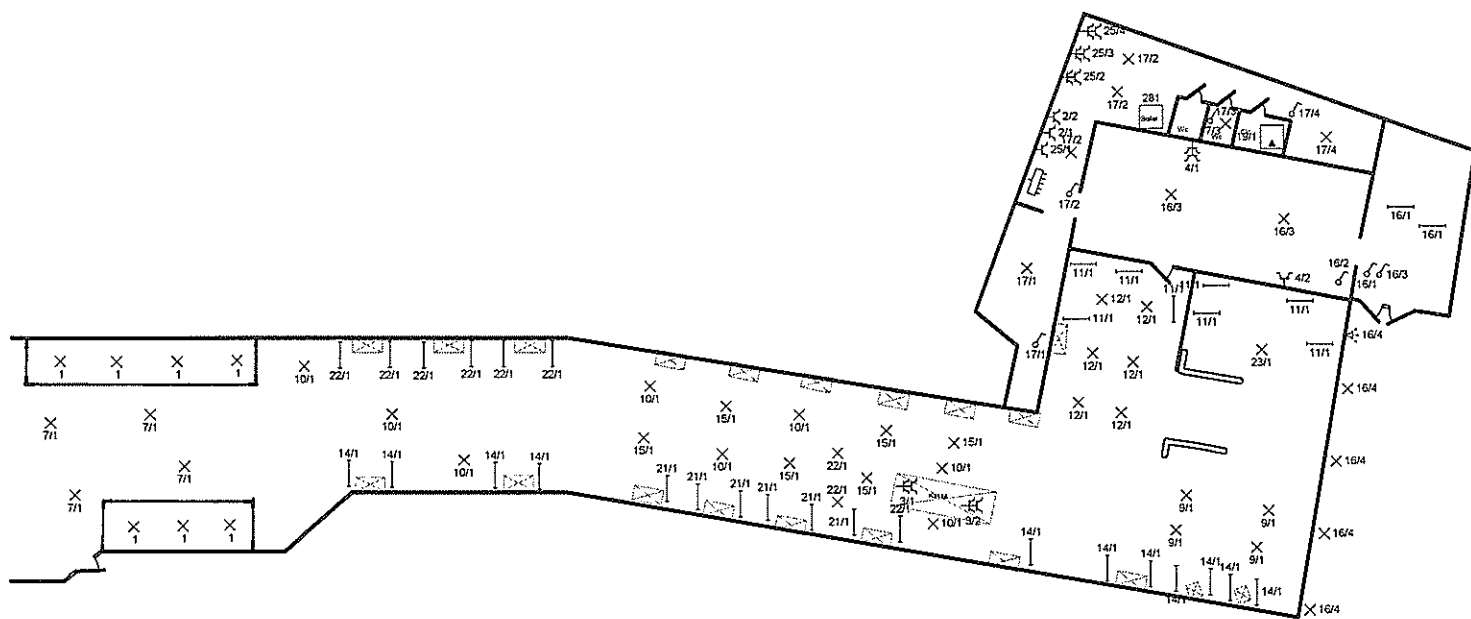

Plaats van de elektrische installatie
Vonckx
Stalielei 19
2640 Mortsel

Installateur
Pro-technic bv
Witvenstraat 84 Bus 1
2940 Hoevenen



p. 4/4
Situatieschema
3 x 400V + N - 50Hz

Schema's getekend door: B.E.W. - BTW BE 0860.775.327
