



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

☒ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02/380.52.71 - fax 02/380.89.86

☐ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056/35.76.76 - fax 056/35.68.87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. 197760

Ref. verslag RAP EH/20160526-4A









Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties


- ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270)
- ☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	BREEFAST DEVELOPMENT BELGIUM		Voornaam		Postnr	2020
Adres	JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 162/1		Gemeente	ANTWERPEN		
Installateur	GEENS EL CO		Gemeente	DUFFEL		
BTW-nummer	BE- 0460909554					
of identiteitskaartnr.	-	Uitreikingsdatum	- / - / -	Gemeente		
Plaats van onderzoek	MALTERIE W6 APP. 4.1		Postnr.	3190		
Adres	MOUTERIJ 12 / 401		Gemeente	BOORTMEERBEEK		
EAN-code	541448860014793978		Elektriciteits verdelers	netmanagement		
Type installatie	☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten ☒ wooneenheid (huis, appartement, andere) ☐ huishoudelijke werkeenheden ☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid					
Algemene beschrijving van de aansluiting						
U _{nom} (V ac/dc)	2X230V	4 x	2P-AUTOM 16A - 1.5/2.5 mm ²			
Ø voedingskabel (mm ²)	4x10 mm ²	6 x	2P-AUTOM 20A - 2.5 mm ²			
I _{nom} aansluiting (A)	40A	1 x	2P-AUTOM 32A - 8 mm ²			
Type alg. schakelaar	DIFF.	VIA DIFF 30 mA				
Aantal borden	1	1 x	2P-AUTOM 16A - 2.5 mm ²			
Aantal eindstroombanen	15	3 x	2P-AUTOM 20A - 2.5 mm ²			
Type aardelektrode	LUS					
Algemene diff.stroom.inr.	40/0.3A					
Bijkomende diff.stroom.inr.	40/0.03A					
Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :						
Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen						
Metingen	Meetapparaat :		apparaat waarvan de inspecteur titularis is		Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig :	
Aardspreidings- weerstand :	3.5 Ω	Isolatiestand (250/500/1000V) :	5 MΩ	Werking differentieel- stroominrichting :	OK / NOK	Continuïteit PE- geleiders & equipot. :
OK / NOK						
Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)						
GEEN						
OPM. : CV installatie niet afgewerkt						
Verlichting / bad en keukenmeubels niet aanwezig						
☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP - / - - - - -						
Besluit						
☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïnstalleerd. De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)						
☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór :						
Volgend controle- bezoek uiterlijk op:	26/05/2041	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	HUS ERIC (24)		Datum onderzoek:	26/05/2016

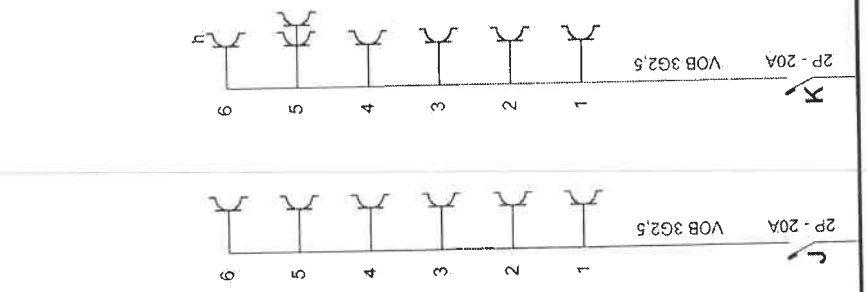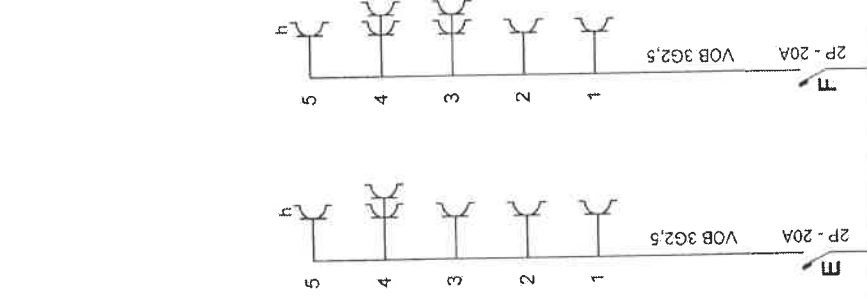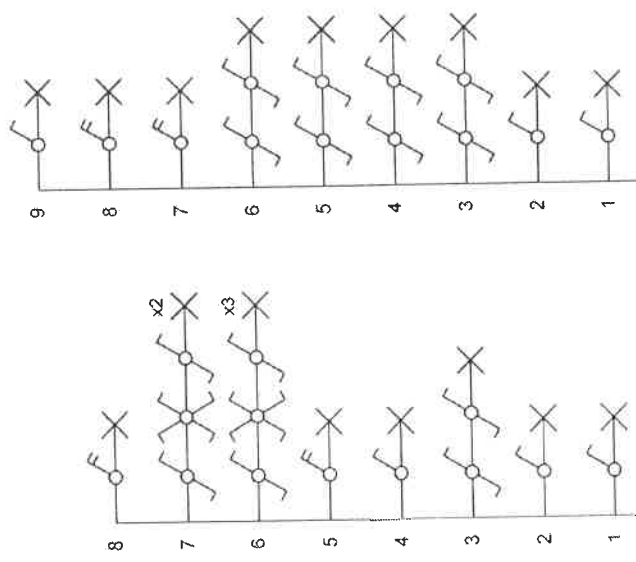

Erkend Organisme J. Van Hemelen Halsendallaan 5 1652 Alsemberg Tel.: 02 380 52 71 Fax: 02 380 89 86 e-mail: info@vanhemelen.org	Plaats van de elektrische installatie Malterie W6 app. 4.1 Mouterij 12 Bus 401 3190 Boortmeerbeek	Installateur Geens El. Co. nv Nijverheidsstraat 43 2570 Duffel Tel.: 015 31 16 59 Fax: 015 31 93 50 e-mail: info@geenselco.be BTW BE 0460.909.554	p. 1/2 Eendraadschema 2 x 230V ~ 50Hz
---	--	--	--

26 MEI 2016

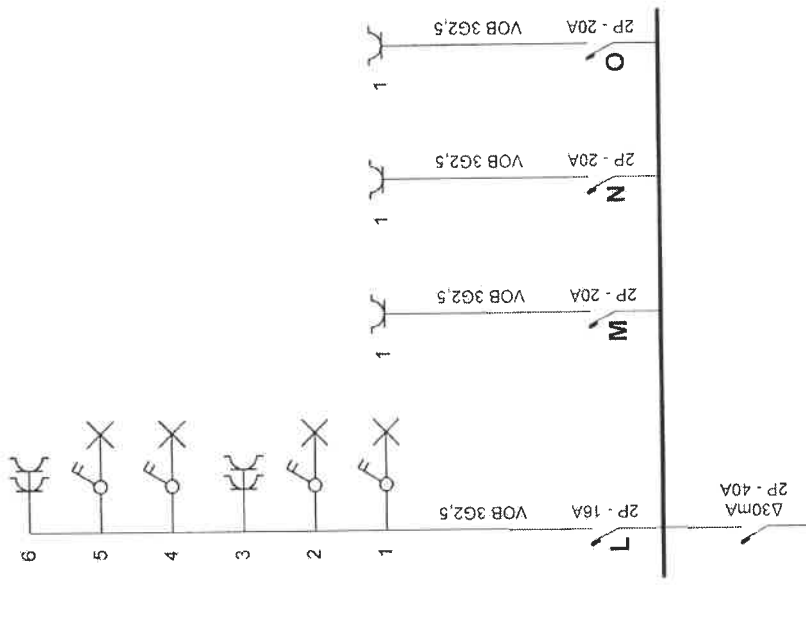

Erkend Organisme
 J. Van Hemelen
 Halsendallaan 5
 1652 Alsemberg
 Tel.: 02 380 52 71
 Fax: 02 380 89 86
 e-mail: info@vanhemelen.org


26 MEI 2016

Plaats van de elektrische installatie
 Malterie W6 app. 4.1
 Mouterij 12 Bus 401
 3190 Boortmeerbeek

Installateur
 Geens El. Co. nv
 Nijverheidsstraat 43
 2570 Duffel
 Tel.: 015 31 16 59
 Fax: 015 31 93 50
 e-mail: info@geenselco.be
 BTW BE 0460.909.554

p. 2/2
Eendraadschema
 2 x 230V ~ 50Hz

Materie W6 app. 4.1
Routerij 12 bus 401
3190 Bortmeerbeek

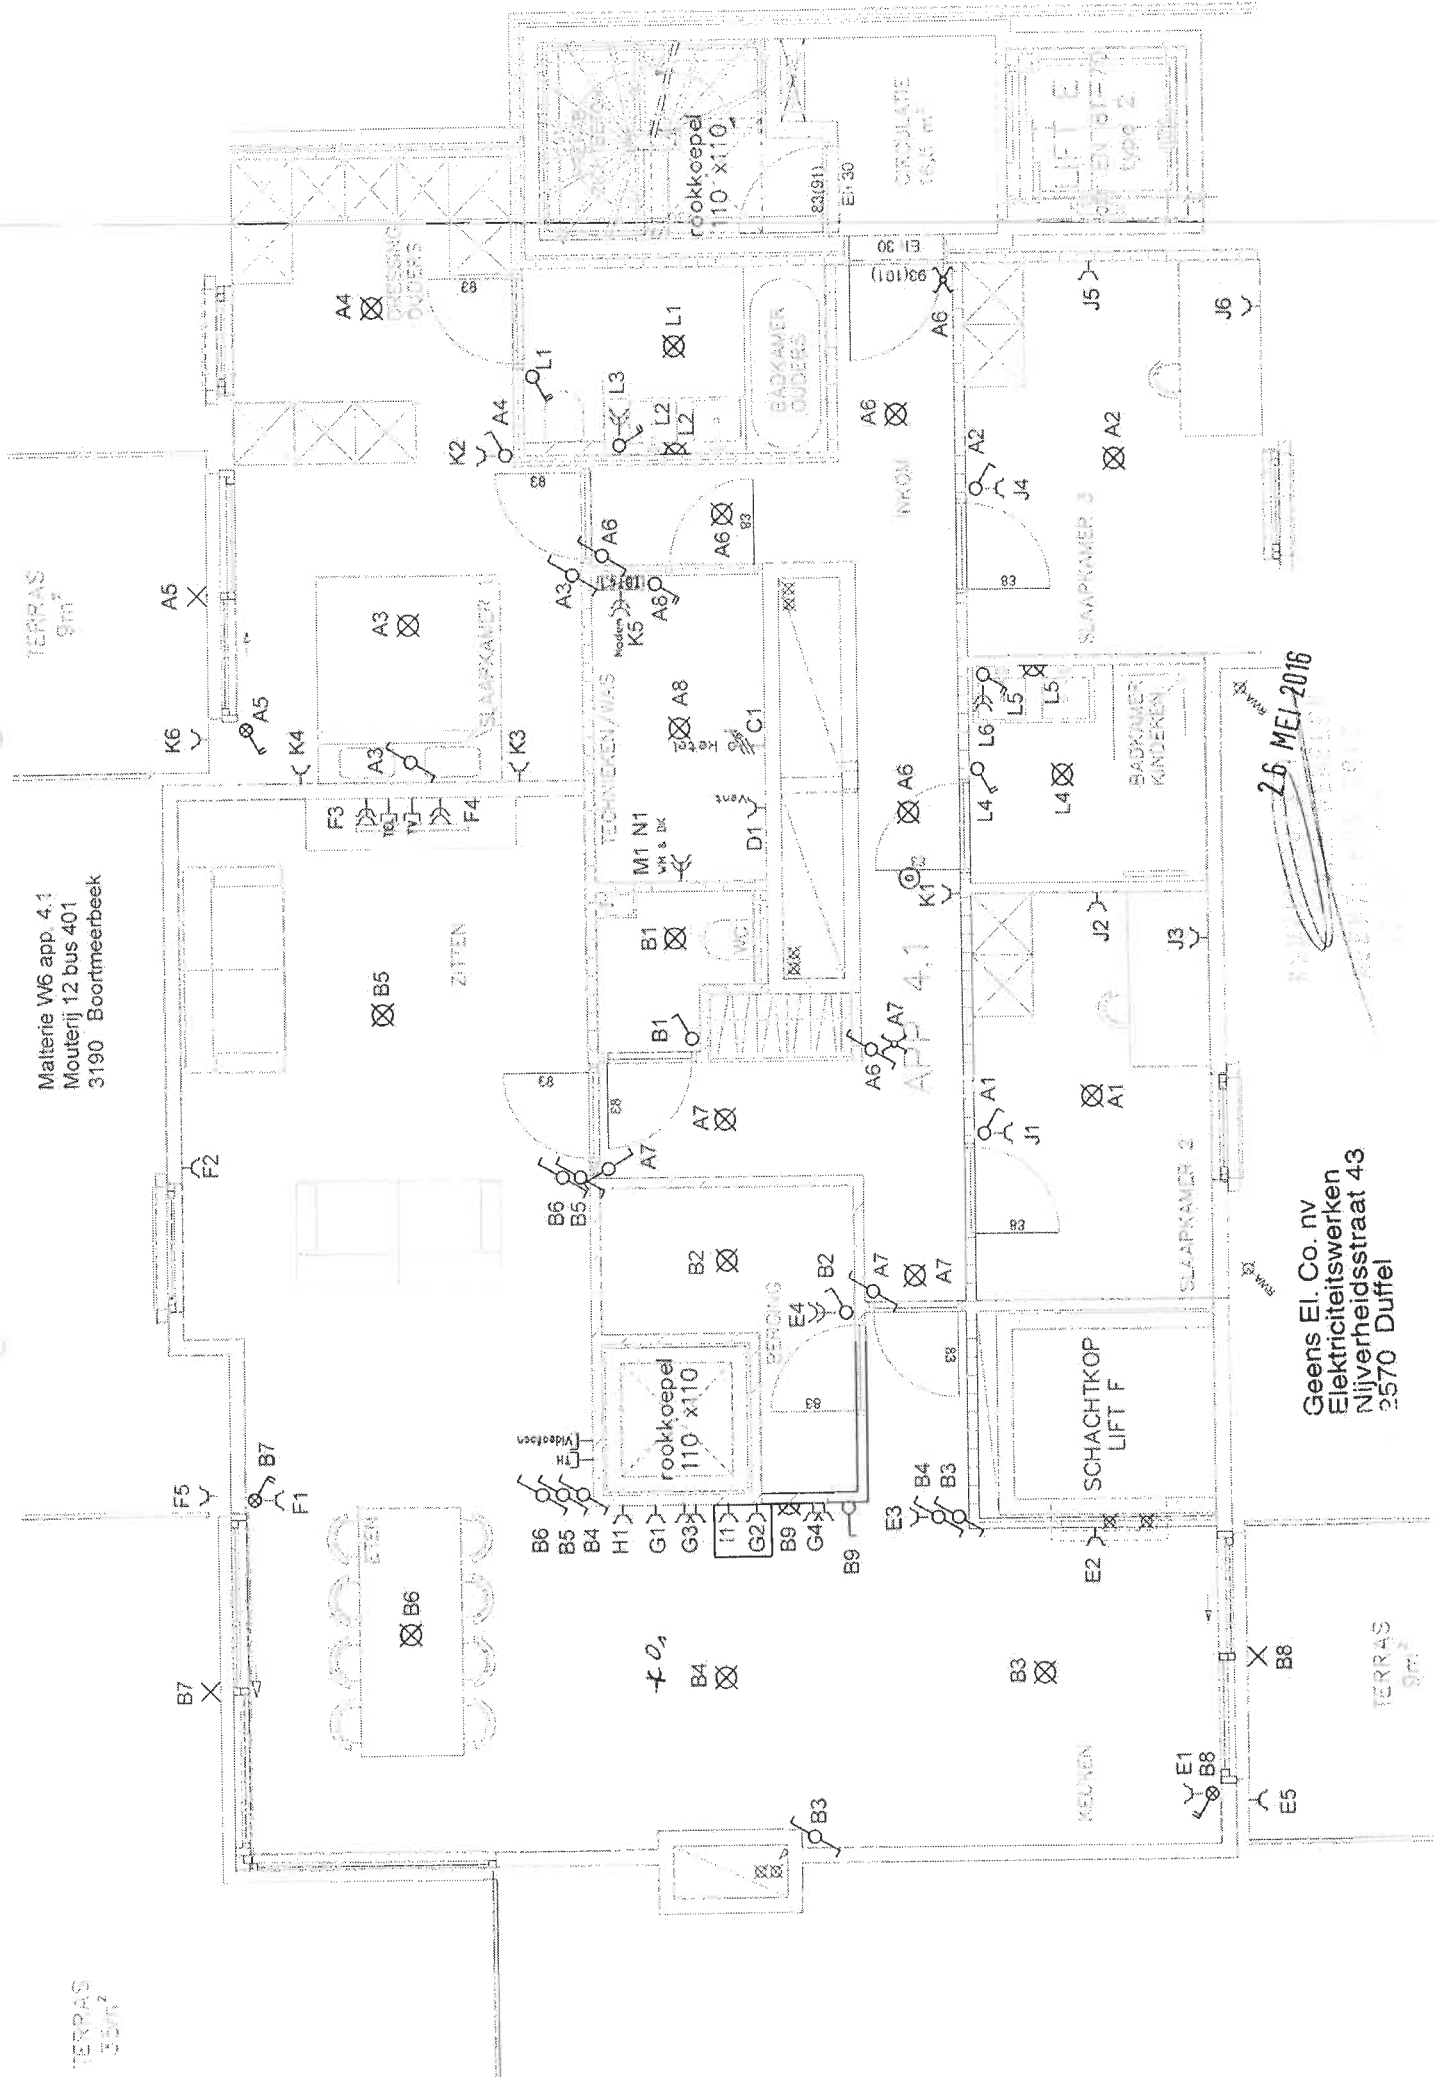

26 MEI-2016

Geens El. Co. nv
Elektricitetswerken
Nijverheidsstraat 43
2570 Duffel
