

ATK

Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek
en Controle v.z.w.

Erkend Controleorganisme

Rijmenamseweg 109 — 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015 / 51 26 77

VERSLAG N° 28/10/10/1223

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELECTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Maest 10 (Winkel)
St. Luk. Waver

EIGENAAR: Agemans
Adres: Maest 10 St. Luk. Waver

OPDRACHTGEVER: ?
Adres: ?

INSTALLATEUR: ?
Adres: ?

BTW of IK: 4 22 11 732

STROOMLEVERANCIER: INTERCOM
Ref.: ? Teller n° ?
Index: ?

Datum van onderzoek: 2-11-82 Aanvulling van verslag Nr.: ?

Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig; Type der lokalen: Winkel

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 — Electriscie installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83. Met Zonder BA4/BA5.

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting: TBX A

Voedingskabel hoofdbord: type VFB 4 x 16 mm² Alg. schakelaar: type TBX Ref. attest ?

Type van de aardelektrode: Is - baren - pennen - horizontale geleider.

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: ?; RA: 6 Ohm; RI tot 100 Mohm.

BESCHRIJVING:

L	C	-	Type + Kal. Bescherming	Type verwarmingstoestel	Ri Mohm	L	C	-	Type + Kal. Bescherming	Type verwarmingstoestel	Ri Mohm
				1					7		

Autom. diff. schakelaar(s) (ADS)				1. De geïnstalleerde ADS stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardeëlektrode : ja - <u>neen</u>. 2. De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden der respectievelijke stroombanen : ja - <u>neen</u>. 3. De geïnstalleerde vaste elektrische verwarming wordt konform met de NBN norm <u>vermeed</u> : ja - <u>neen</u>.
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)	Beschermde stroombanen	
10		300	Algemeen	

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: ?

→ een draadlens roulegen
→ equipotential → water + gas.

PLICHTEN van de EIGENAARS, BEHEERDERS of HUURDERS: zie keerzijde.

BESLUIT: De installatie is - niet - conform. De algemene ADS - was - werd - verzegeld en het (de) ééndraadschema(s) werd(en) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op ? (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.

De installatie mag - niet - in dienst - gesteld worden - blijven - indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

DE AGENT-ONDERZOEKER:
n° + naam + handtekening.

[Handtekening]

ATKVereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek
en Controle v.z.w.**Erkend Controleorganisme**Rijmenamseweg 109 — 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015 / 51 26 77

VERSLAG N° 12/10/86/1221

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELECTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**ADRES INSTALLATIE : *verly*EIGENAAR : *nie*Adres : *12/10/86/1223*

OPDRACHTGEVER :

Adres :

INSTALLATEUR :

Adres :

BTW of IK :

STROOMLEVERANCIER : *INTERCOM*

Ref. : Teller n°

Index :

Datum van onderzoek : *20-11-86*

Aanvulling van verslag Nr. :

Aard van het onderzoek : *gelijkvormigheidsonderzoek* - controlebezoek volgens :

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie : *Nieuwe* - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig; Type der lokalen : *Spantrekker de verly A.*

Begin werken : Fundering vóór - na 1.10.81 — Electriscie installatie vóór - na 1.10.81 - 1.1.83. Met Zonder BA4/BA5.

Aansluiting : Spanning *230* VBescherming van de aansluiting : *230* AVoedingskabel hoofdbord : type *VPV 4* x *16* mm²Alg. schakelaar : type *230* Ref. attestType van de aardelektrode : *16* - baren - *penen* - horizontale geleider.Aantal borden : *1* ; Aantal eindstroombanen : *1* ; RA : *6* Ohm; RI tot *100* Mohm.**BESCHRIJVING :**

L	C	—	Type + Kal. Bescherming	Type verwarmingstoestel	Ri Mohm	L	C	—	Type + Kal. Bescherming	Type verwarmingstoestel	Ri Mohm
				1					1		
Autom. diff. schakelaar(s) (ADS)						1. De geïnstalleerde ADS stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardeëlectrode : ja - <u>neen</u>. 2. De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden der respectievelijke stroombanen : ja - <u>neen</u>. 3. De geïnstalleerde vaste elektrische verwarming wordt konform met de NBN norm vermoed : ja - <u>neen</u>.					
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)	Beschermde stroombanen								
16		30	Algemeen								

Vastgestelde inbreuken en/of nota's :


*Zie verly : 12/10/86/1223**+ B. van Boma, plaatsing ding bodkone**DE HOUT L.***Plichten van de EIGENAARS, BEHEERDERS of HUURDERS :** zie keerzijde.**BESLUIT :** De installatie is - niet - conform. De algemene ADS - was - werd - verzegeld en het (de) ééndraadsschema(s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.

De installatie mag - niet - in dienst - gesteld worden - blijven - indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

DE AGENT-ONDERZOEKER :
n° + naam + handtekening.

spanning : 3x400V + N

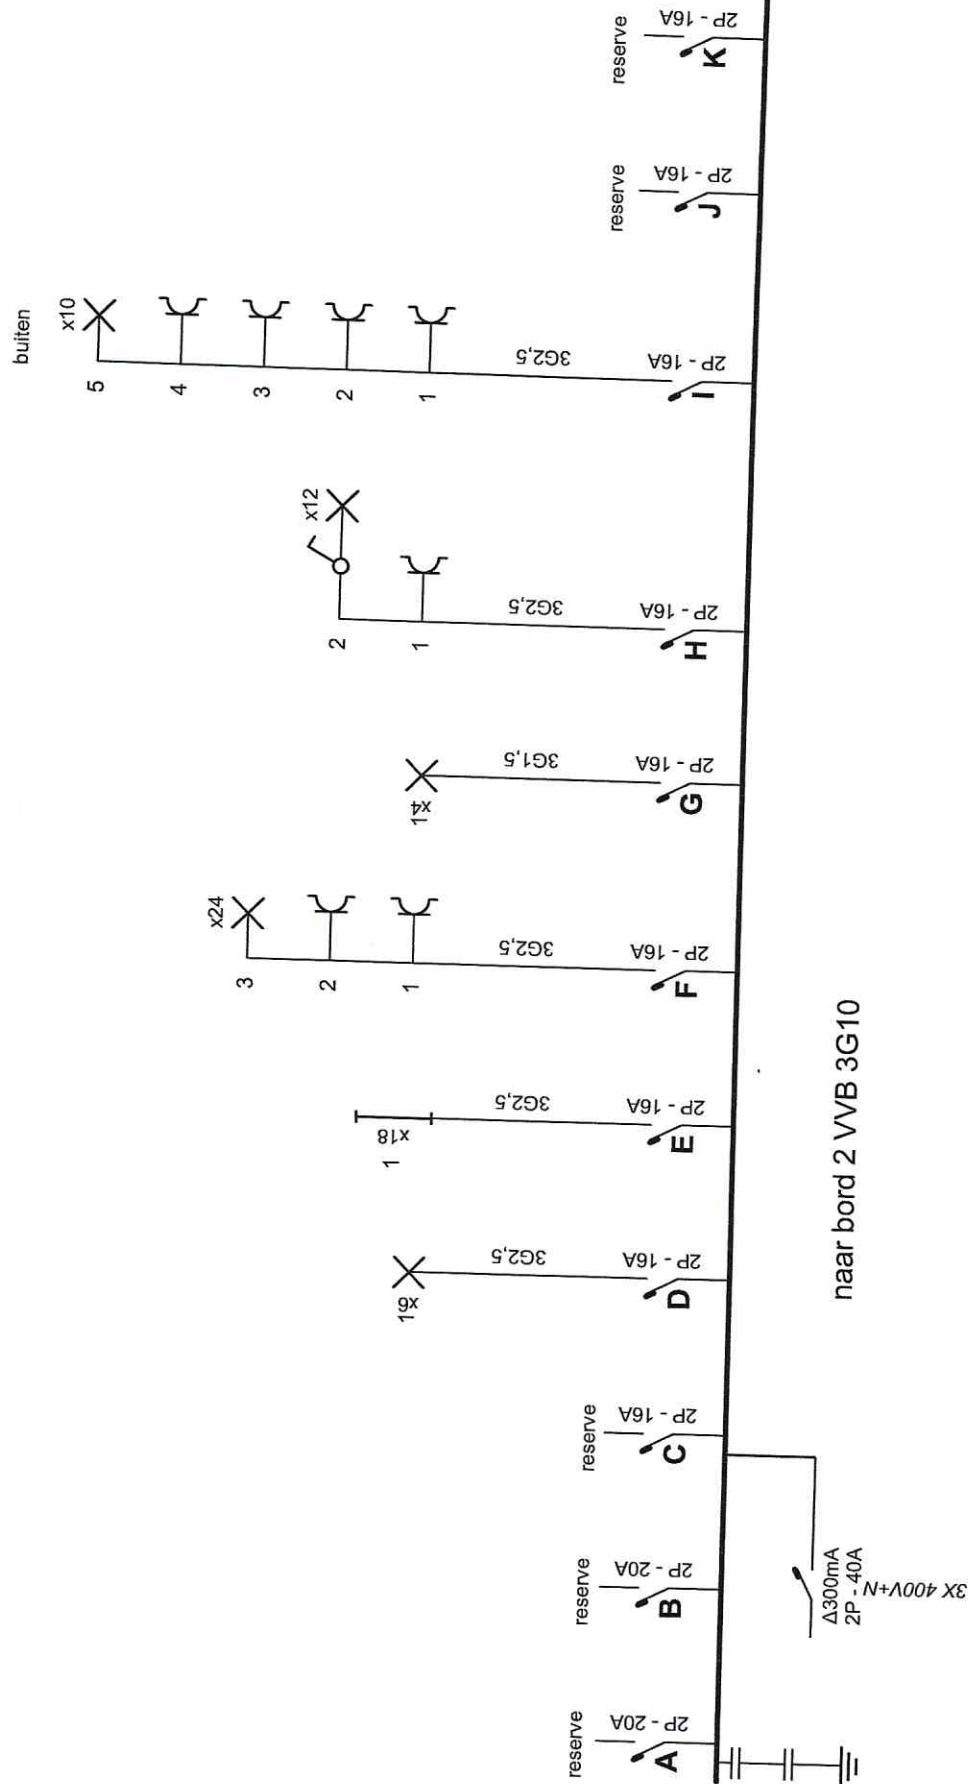

Erkend Organisme

O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ele@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie

glimmo project nv
markt 40 Bus 1
2860 sint-katlijn-waver

Installateur

Bogaerts Electro B.V.B.A.
Herenboslaan 4 bus1
2500 Lier
Tel.: 03 482 03 89 GSM: 0477 36 85 81
e-mail: info@bogaerts-elektro.be
BTW BE 0471.916.480

p. 1/3 Eendraadschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

BORD 1

ATKVereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek
en Controle v.z.w.**Erkend Controleorganisme**Rijmenamseweg 109 — 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015 / 51 26 77**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELECTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE :

EIGENAAR :

Adres :

OPDRACHTGEVER :

Adres :

INSTALLATEUR :

Adres :

BTW of IK :

STROOMLEVERANCIER :

Ref. :

Teller n°

Index :

Datum van onderzoek :

Aanvulling van verslag Nr. :

Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig; Type der lokalen :

Begin werken : Fundering vóór - na 1.10.81 — Electriscbe installatie vóór - na 1.10.81 - 1.1.83 Met Zonder BA4/BA5.

Aansluiting : Spanning 230 VBescherming van de aansluiting : TBO AVoedingskabel hoofdbord : type : VPV 4 x 16 mm²Alg. schakelaar : type : TBO Ref. attestType van de aardelektrode : tu - baren - pennen - horizontale geleider.Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 1 ; RA : 6 Ohm; RI tot 100 Mohm.**BESCHRIJVING :**

L	C	-	Type + Kal. Bescherming	Type verwarmingstoestel	Ri Mohm	L	C	-	Type + Kal. Bescherming	Type verwarmingstoestel	Ri Mohm
				?					?		

Autom. diff. schakelaar(s) (ADS)

In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)	Beschermde stroombanen
<u>16</u>		<u>300</u>	<u>gegeven</u>
<u>16</u>		<u>30</u>	

1. De geïnstalleerde ADS stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode : ja - neen.
2. De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden der respectievelijke stroombanen : ja - neen.
3. De geïnstalleerde vaste elektrische verwarming wordt konform met de NBN norm vermoed : ja - neen.

Vastgestelde inbreuken en/of nota's :


nie verslag : LS / No / 86 / nr 23**PLICHTEN van de EIGENAARS, BEHEERDERS of HUURDERS :** zie keerzijde.**BESLUIT :** De installatie is - niet - conform. De algemene ADS - was - werd - verzegeld en het (de) ééndraadsschema(s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.

De installatie mag - niet - in dienst - gesteld worden - blijven - indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

DE AGENT-ONDERZOEKER :
n° + naam + handtekening.

gelijkvloers.

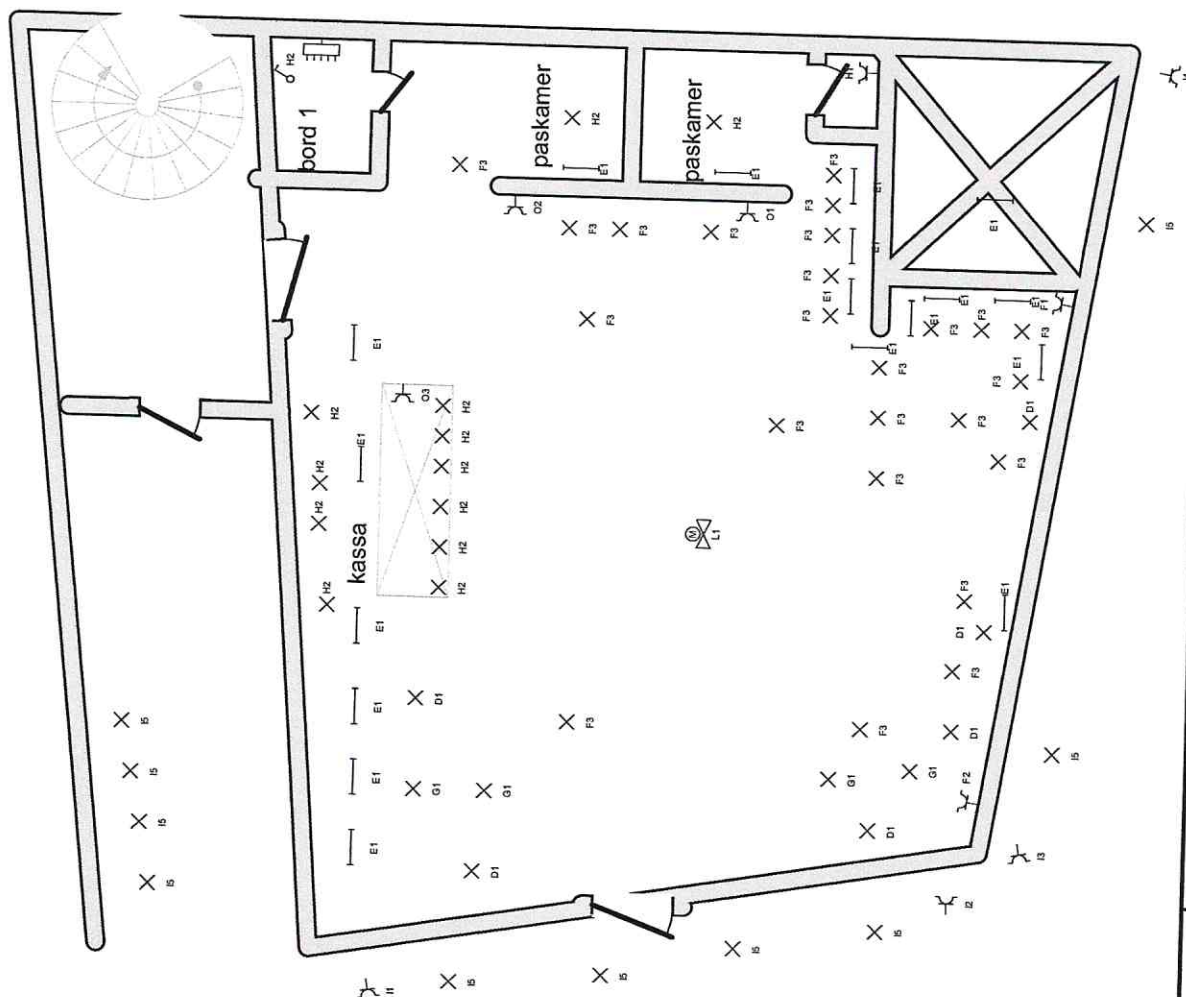

Erkend Organisme
O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ele@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie
gimmo project nv
markt 40 Bus 1
2860 sint-katlijnen-waver

Installateur
Bogaerts Electro B.V.B.A.
Herenboslaan 4 bus1
2500 Lier
Tel.: 03 482 03 89 GSM: 0477 36 85 81
e-mail: info@bogaerts-elektro.be
BTW BE 0471.916.480

p. 3/3
Situatieschema
3 x 400V + N ~ 50Hz
BORD 1

003215755511

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.: -
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: -

ProKo.: LS05
Verslagnr.: 4423730
Voorl. verslagnr.:
Datum: 23/06/2014



Klant / Opdrachtgever:
BOGAERTS ELEKTRO

HERENBOSLAAN 4
2500 KONINGSHOOIKT

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: LOTTE Aard installatie: bestaande Type lokalen: winkel
Plaats onderzoek: MAGOT Markt 40 Bus 1 SINT-KATELIJNE-WAVER 2860
Aard onderzoek: controlebezoek
Datum onderzoek: 23/06/2014 Volgende binnen 60 maand of vóór 23/06/2019 Volgens AREI Art.: 86/271/271bis
Eigendom van: IDEM Onderzoeker: VAN PAESSCHEN RUDI
Installateur: IDEM
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAAN nr.: - Teller nr.: - Stand I: - Stand II: -
Aansluiting: ondergronds op bovengronds net Wachtbuis: niet geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Dienstspanning: 3 x 400V+N Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 4p. 40A Schak.: aut.maatsch.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm² spreidingswaarde: 14.2 Ohm
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 2p 40A/300mA
Werking testknop: in orde Controle foutfus: in orde Algemene isolatieweerstand: >10 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage één draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen: 16 + 6

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken


Geen

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI,
als ook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

Spanning : 230V I1+n

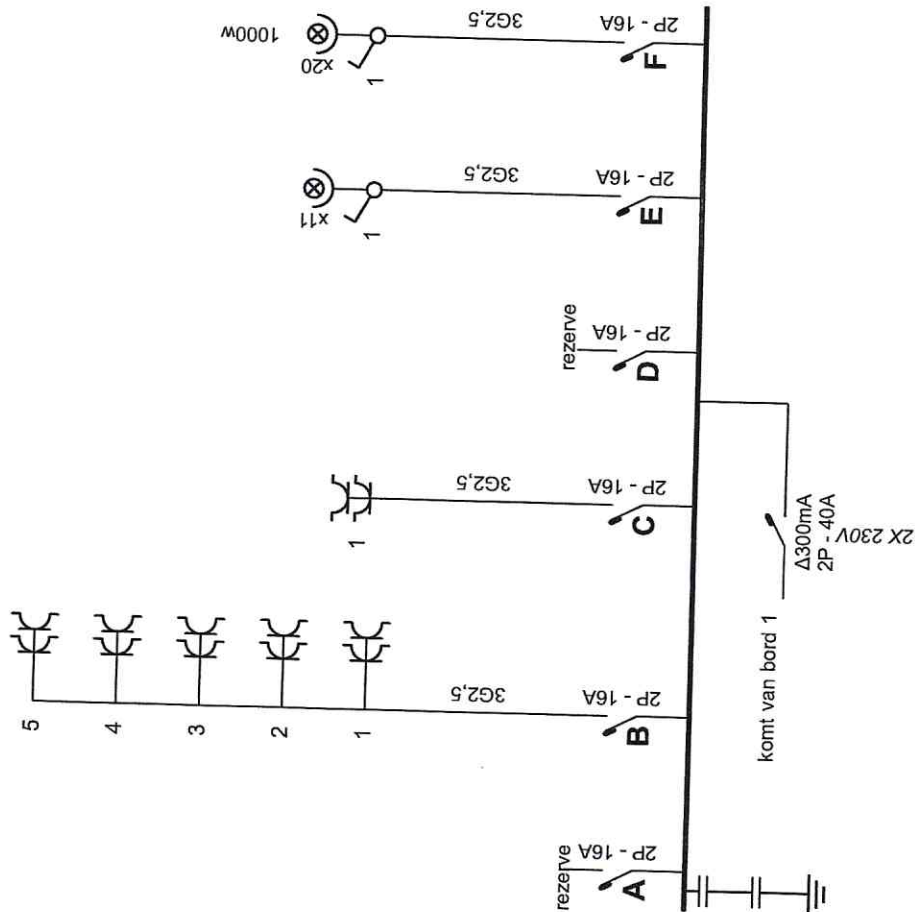

Erkend Organisme

O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ele@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie

glimmo project nv
markt 40
2860 sint-katlijn-waver

Installateur

Bogaertis Electro B.V.B.A.
Herenboslaan 4 bus1
2500 Lier
Tel.: 03 482 03 89 GSM: 0477 36 85 81
e-mail: info@bogaertis-elektro.be
BTW BE 0471.916.480

p. 1/1
Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

BORD 2
