



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 12/05/2025

Inspecteur: Baptiste Hollemaert

Mentor:

Installateur: SEQO

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.: BE 0847 908 969

Merk en type meettoestel: Metrel
ET61557

Serienummer: 18460155

Datum verslag: 12/05/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Hubert d'Ydewallestraat
Huisnummer 8
Busnummer
Postcode 8730
Gemeente BEERNEM
Land België

Eigenaar

Naam
Straatnaam
Huisnummer
Busnummer
Postcode 8730
Gemeente BEERNEM
Land België

Installateur

Naam SEQO
BTW nr. BE 0847 908 969
Telefoonnummer +32 474 80 40 53
E-mail info@seqo.be

Type : woning

EAN : 541448820038744851

Teller Nr. : 1SAG1100384817

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1~230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 50 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 21

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 1.418 MΩ

RE: 13.38 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	IΔt	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	21	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	3	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
zie schema in bijlage	-	-			-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 12/5/2050
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.
- Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 14:00 tot 15:15
De inspecteur Baptiste Hollemaert

Baptiste Hollemaert


ACEG VZW - #189

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 12/5/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.




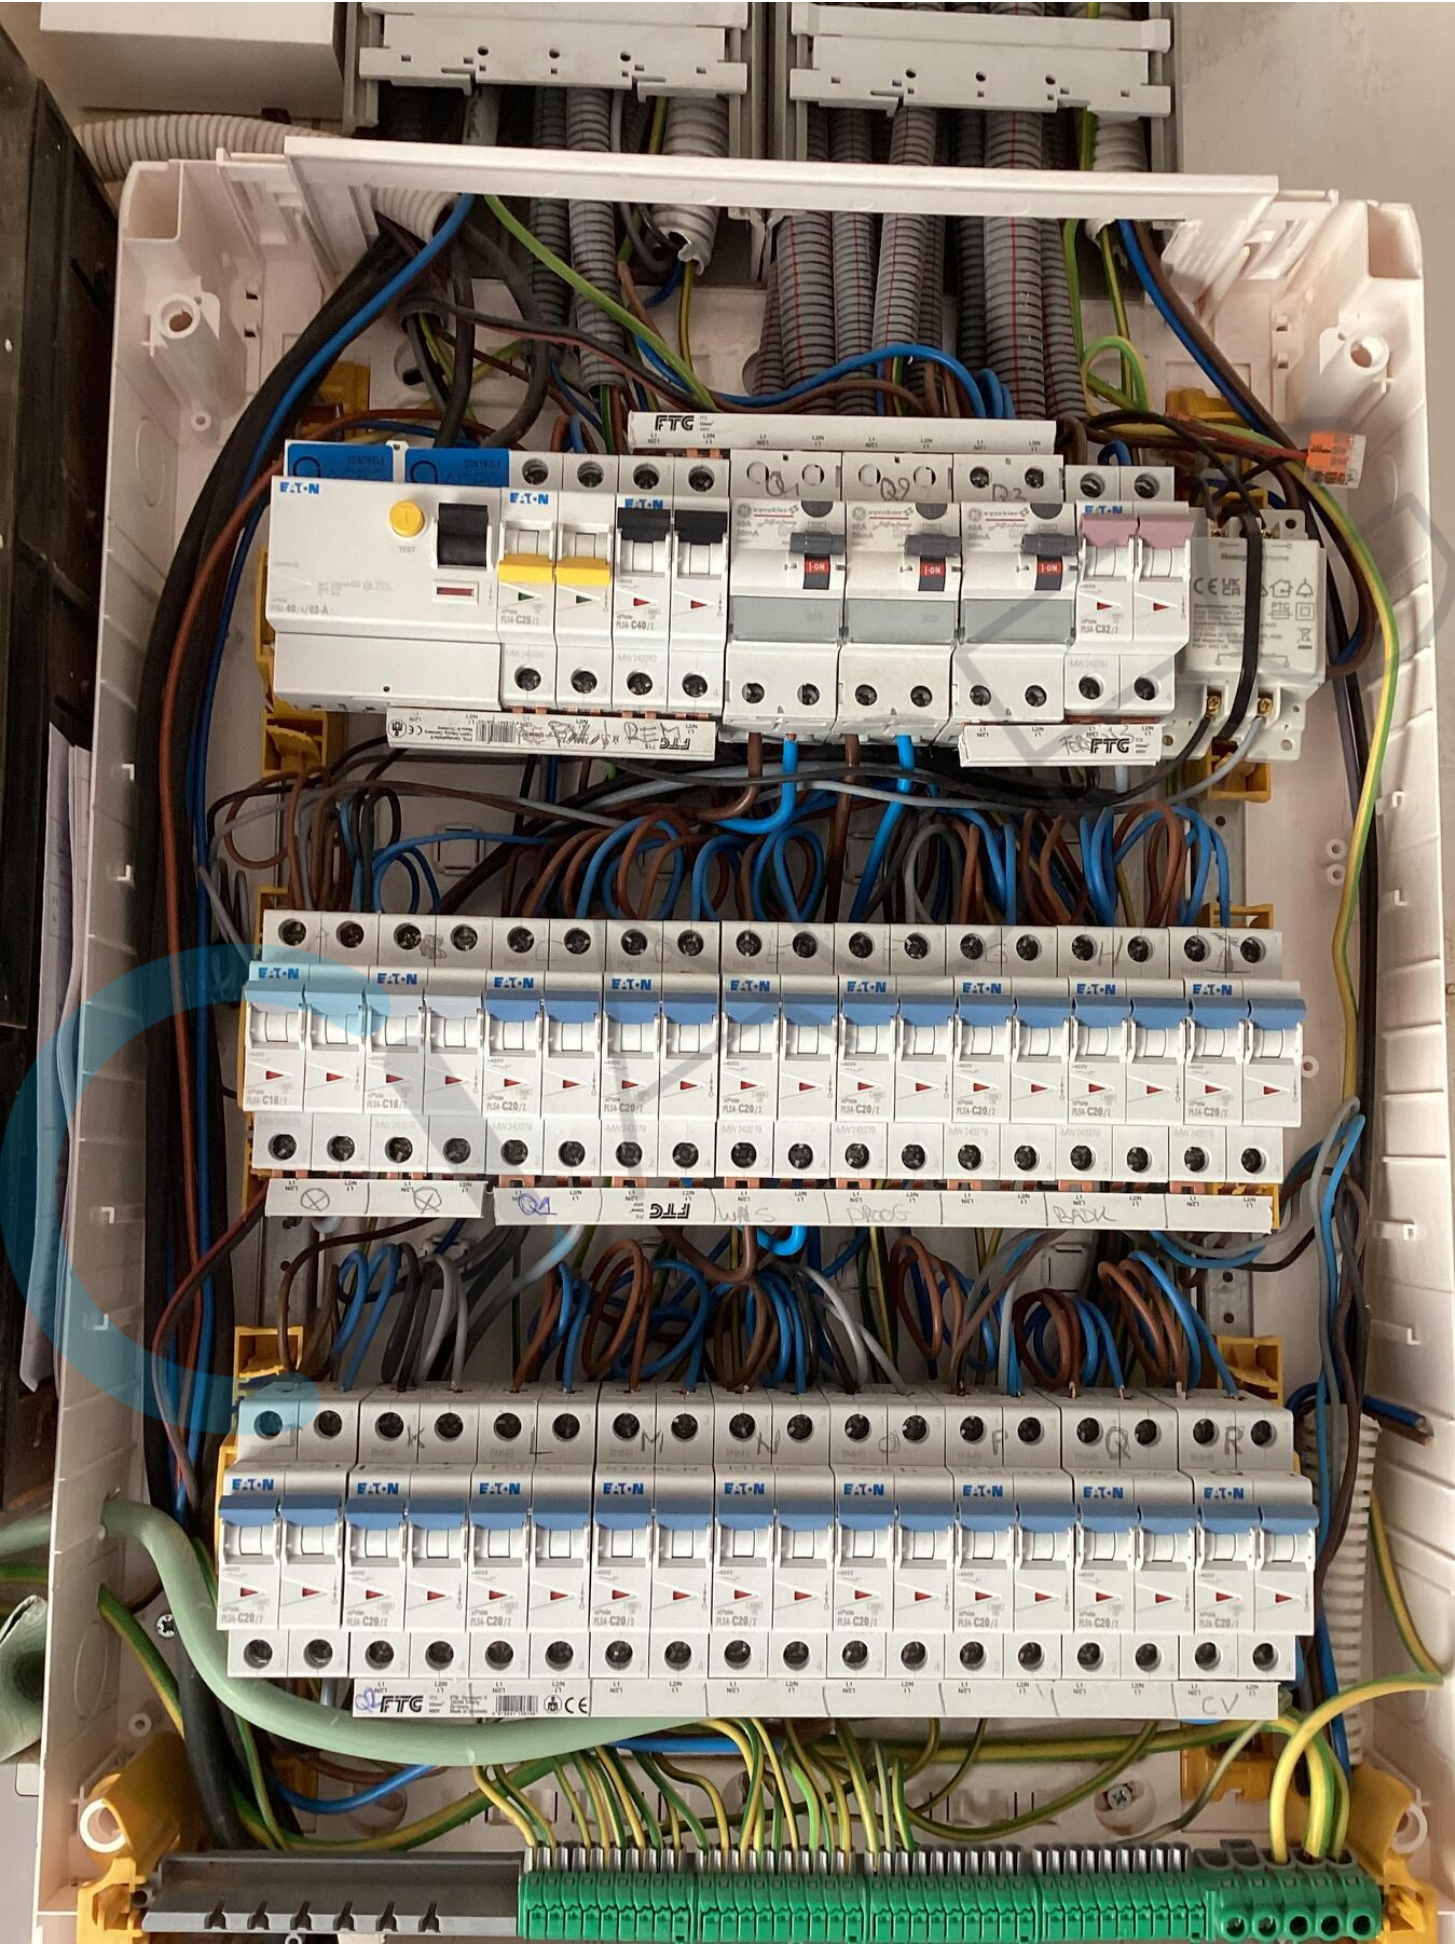







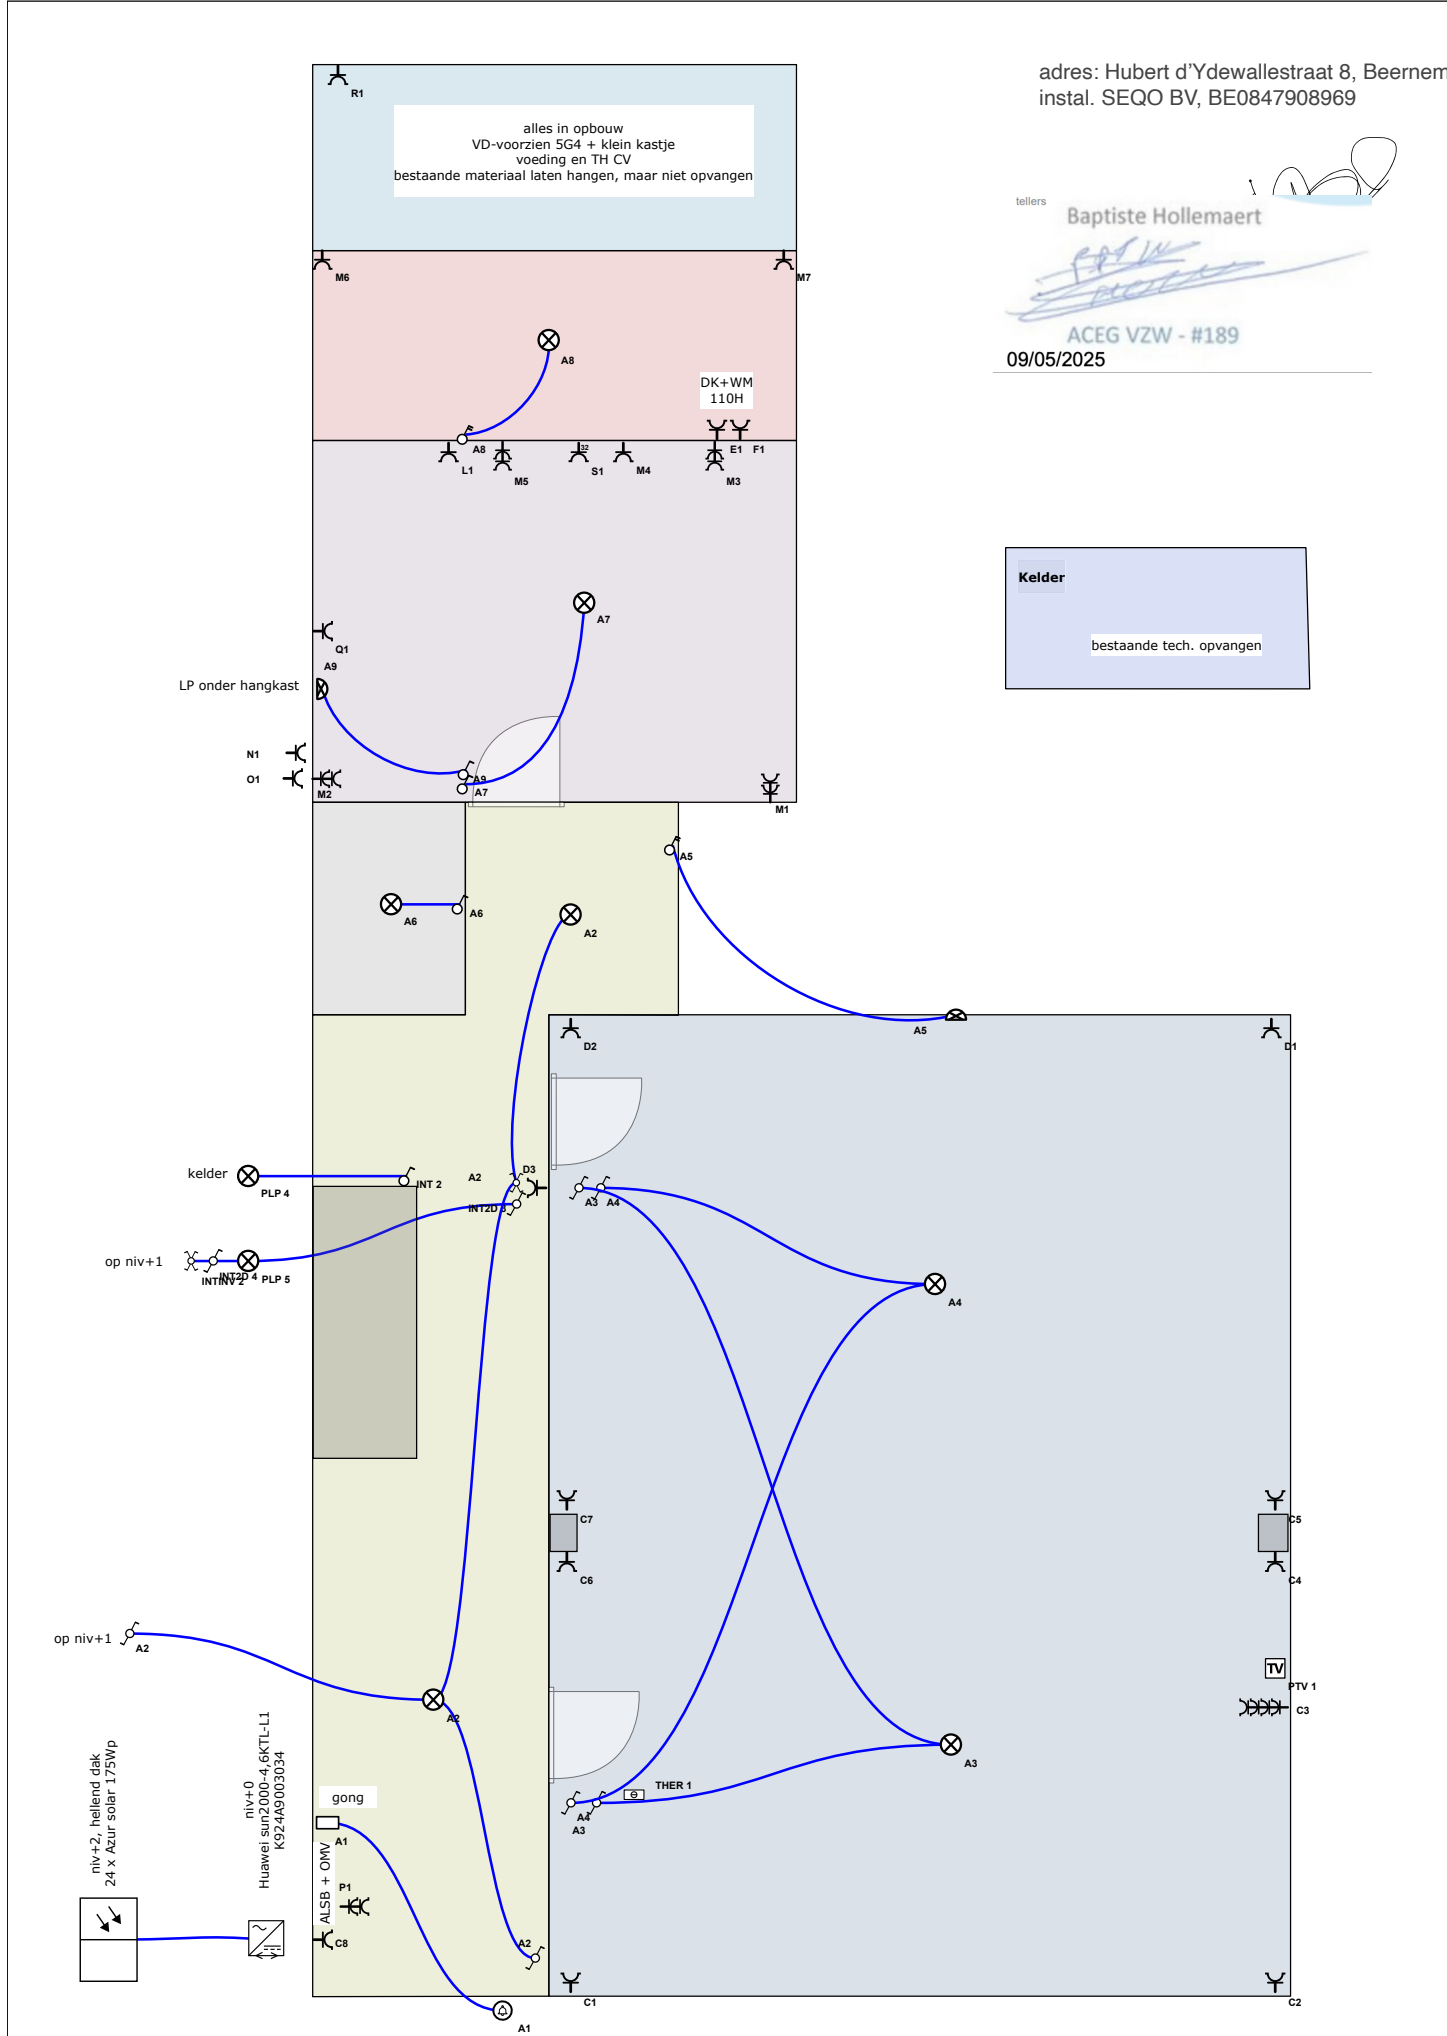



~~POST IN~~
~~DOCK~~

09/05/2025



adres: Hubert d'Ydewallestraat 8, Beernem
instal. SEGO BV, BE0847908969

tellers

Baptiste Hollemaert




ACEG VZW - #189


09/05/2025



zolder niv+3 : circuit voor stopocontacten + lichtpunt

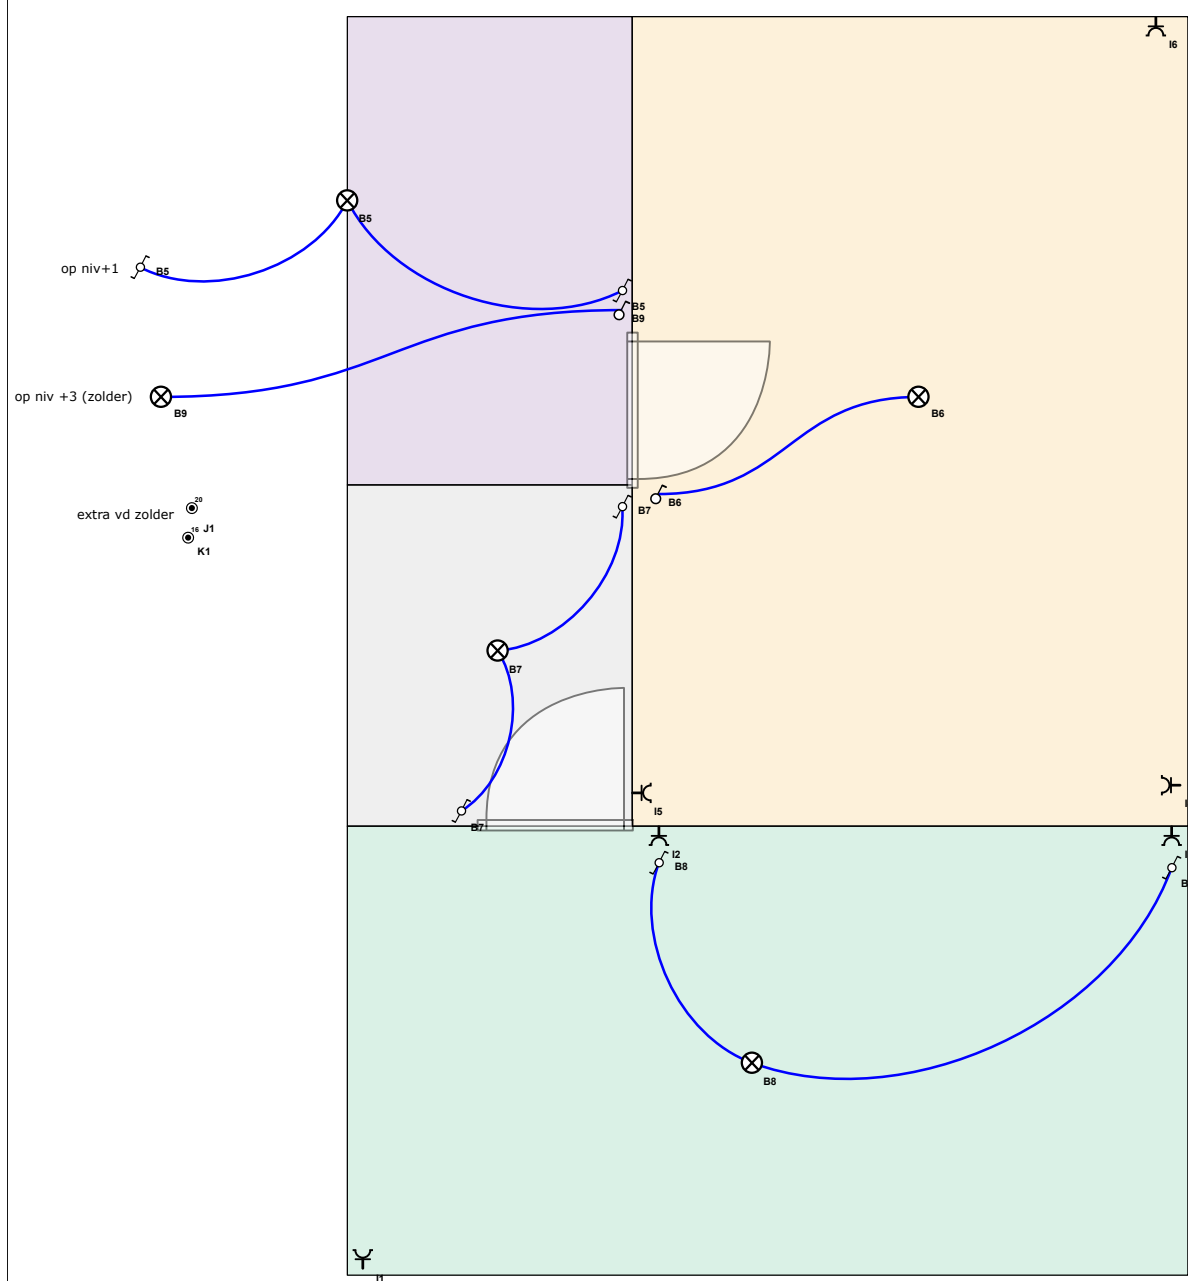

adres: Hubert d'Ydewallestraat 8, Beernem
instal. SEQO BV, BE0847908969

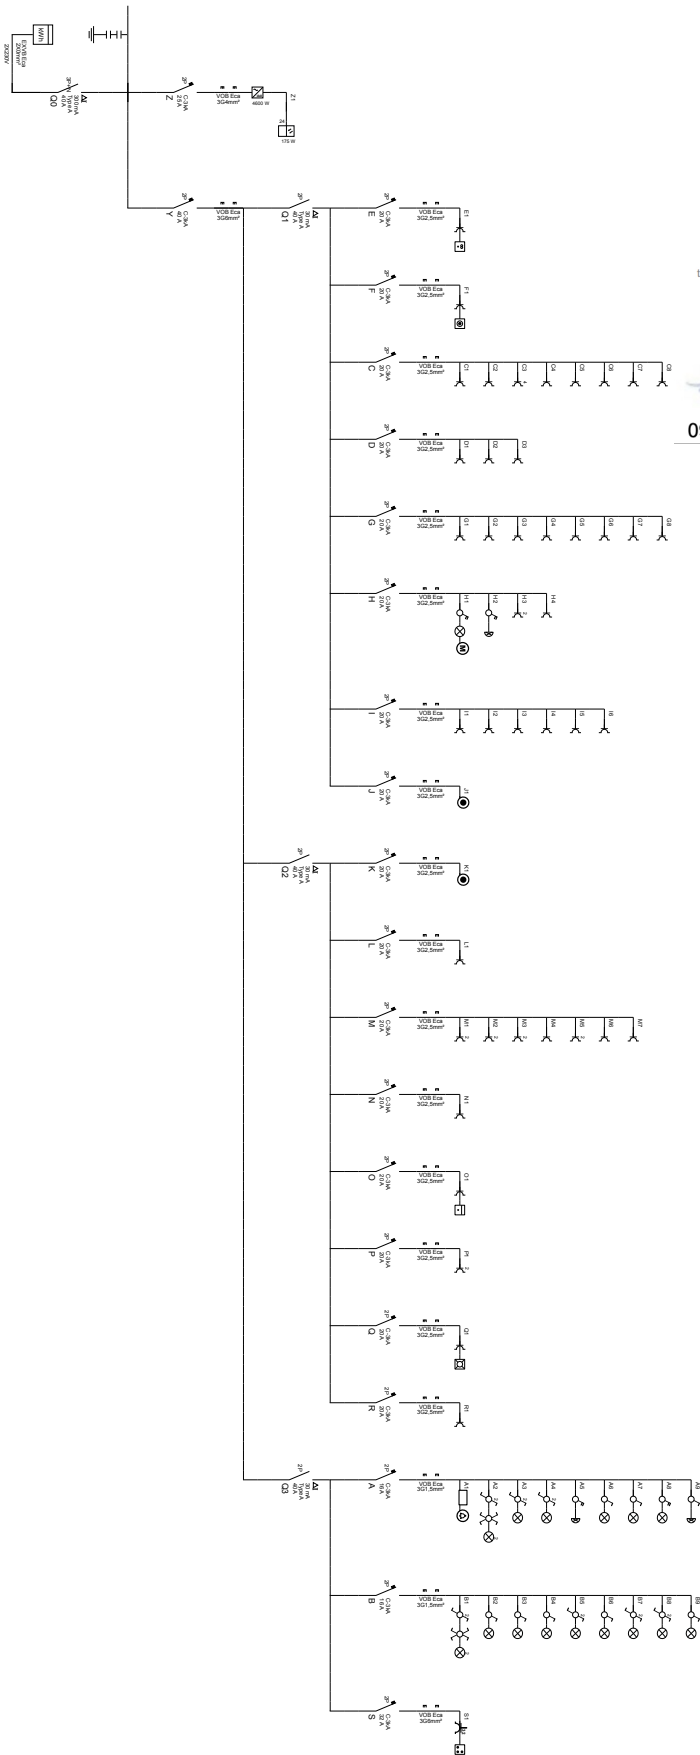

tellers
Baptiste Hollemaert
[Handwritten signature]
ACEG VZW - #189
09/05/2025
