

# TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08



O. ref.: \_\_\_\_\_

U. ref.: \_\_\_\_\_

VERSLAG NR. 15/101027/06

## PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : KOUTERSTRAAT 102  
KIELDRECHT

EIGENAAR : SMET LUCIEN

Adres : idem

OPDRACHTGEVER : idem

Adres : \_\_\_\_\_

INSTALLATEUR : \_\_\_\_\_

Adres : \_\_\_\_\_

BTW of IK : \_\_\_\_\_

EAN: \_\_\_\_\_

Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. 596F840

Index : 55564, 7 kW

Datum van het onderzoek : 27/10/2010 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid : Woning

Begin werken : Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting : Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting Cont A

Voedingskabel hoofdbord : 2 X 10 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar : type diff 40A-30mA

Type van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT

Aantal borden : 2 ; Aantal eindstroombanen : 4-4 ; RA : 26,8 Ohm; RI tot 710 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren : \_\_\_\_\_

BESCHRIJVING :

zie schema's (in bijlage)

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso \_\_\_\_\_

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S : \_\_\_\_\_

Green

| PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK |  |
|---------------------------------------------------|--|
| gezien op                                         |  |
| de aangestelde van de stroomverdelers             |  |
| naam :                                            |  |
| handtekening :                                    |  |

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 22/10/2013 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ~~De installatie is niet conform.~~
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER : 158  
nr. + naam + handtekening


De directeur,

Eigenschaft

Smob. Lucien  
1004 c/sb/auk  
1004 c/sb/auk

102

Boven verkieping.

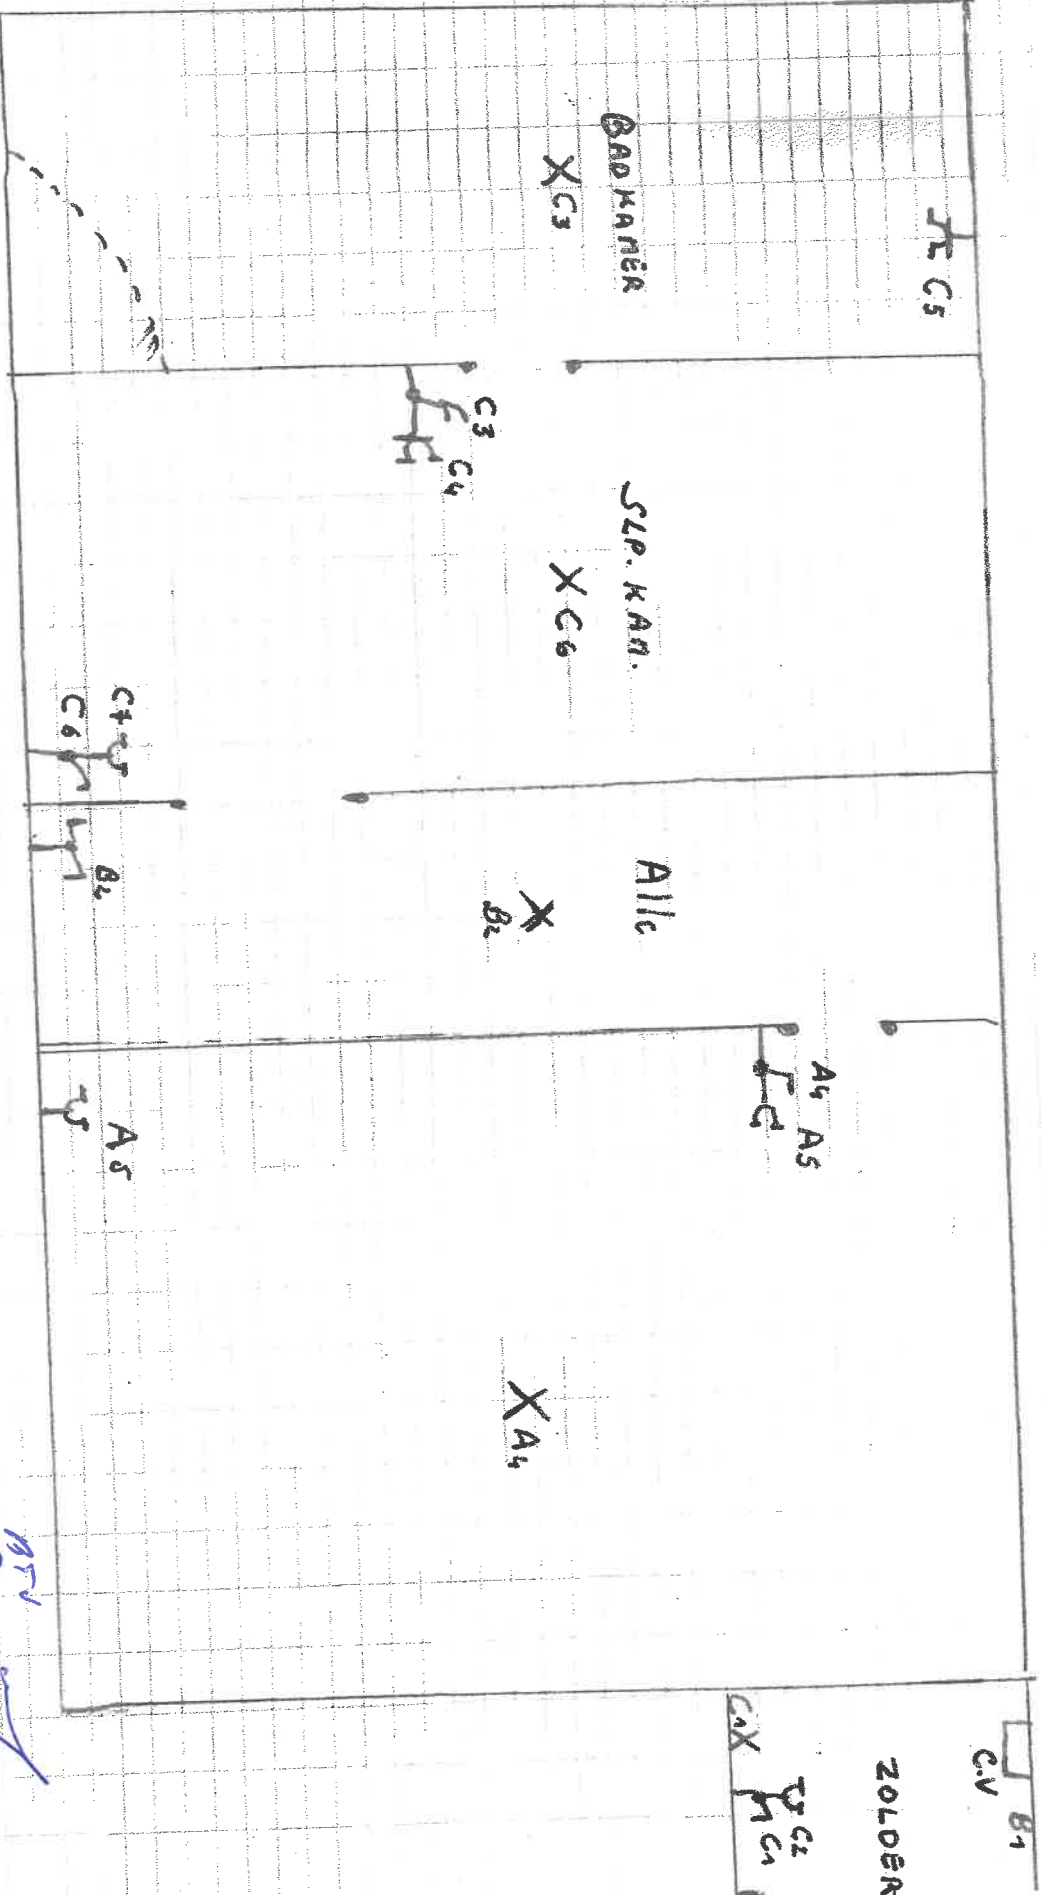

1004 c/sb/auk  
1004 c/sb/auk



