



N° 234-INSP.

**ELECTROTEST**Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et FormationV.Z.W.
ASBL**Kerkstraat 33
1820 MELSBOEK**Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution : EcnolisNr teller :
N° comp :**Verslag van onderzoek:****Rapport de contrôle:**N°: 30.16.1.7.1EAN : NIE
code

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐

Plaats van het onderzoek : Wilgendaal 17 app 6A 1731 Zellik
Lieu du contrôle :Eigenaar : Timmermans
Propriétaire : Adres : Wilgendaal 17 app 6A Zellik
Adresse :Installateur :
Datum van het onderzoek :
Date du contrôle : 16.1.2016
BTW / TVA :
Ik. / C.I. : NIE
Inspecteur : MergaertOnderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart. 6A ☐Spanning : 1N 400V
Tension : 1X 230V
Meter / bord verbinding :
Liaison compteur-tableau : cab. 2x16mm
Max. beveiliging :
Protection max. : 63AAardelektrode : Almondpaal
Electrode de terre : 13 Ohm
Isolatie : 25 Mohm
Isolément :
Aantal verdeelborden :
Nombre de tableaux : 2

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :		Test ΔIn		1 ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271	278
<u>63</u>	<u>300</u>	<u>A</u>	<u>Algemeen Rengen A-G</u>		☒	☐	☒	☐	☐	☒	☐
<u>63</u>	<u>30</u>	<u>A</u>			☒	☐	☒	☐	☐	☒	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : ☒ ☐ contact direct : ☒ ☐
Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect : ☒ ☐Aansluitingen : OK ☒ NOK ☐
Raccordements :
Potentiaalvereffeningen : OK ☒ NOK ☐
Liaisons equipotentielles :Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen/Remarques : Geen tekorten vastgesteld

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is niet conform met het AREI en mag niet tijdelijk in dienst worden — in dienst blijven.
L'installation est non conforme au RGIE et peut ne pas temporairement être mise en service restera en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het éénraadschema en opstelschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.

- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouvelle contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 1.1.1.2016
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :
o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
☐	☐	☐	☐	
271 AK		271 HK		
☐		☐		
276 AK		276 HK		
☐		☐		

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P. ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation, lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Appartement 6A


Beschrijving verdeelkringen.

- A) Verlichting van het geheel appartement
- B) Stopcontacten : oven, frigo, microgolf + 2 stopcontacten op het werkvlak kant kamers
- C) wasmachine
- D) stopcontact living (3) dampkap en 2 stopcontacten op kolom kant keuken en 1 kant living
- E) afwasmachine
- F) stopcontacten kamers en badkamer
- G) kookplaten

Spanning tweedraad 230 VOLT



Eigendom Juf Timmermans
 Wilgenlaan 15 opp. GA
 1731 Zellik

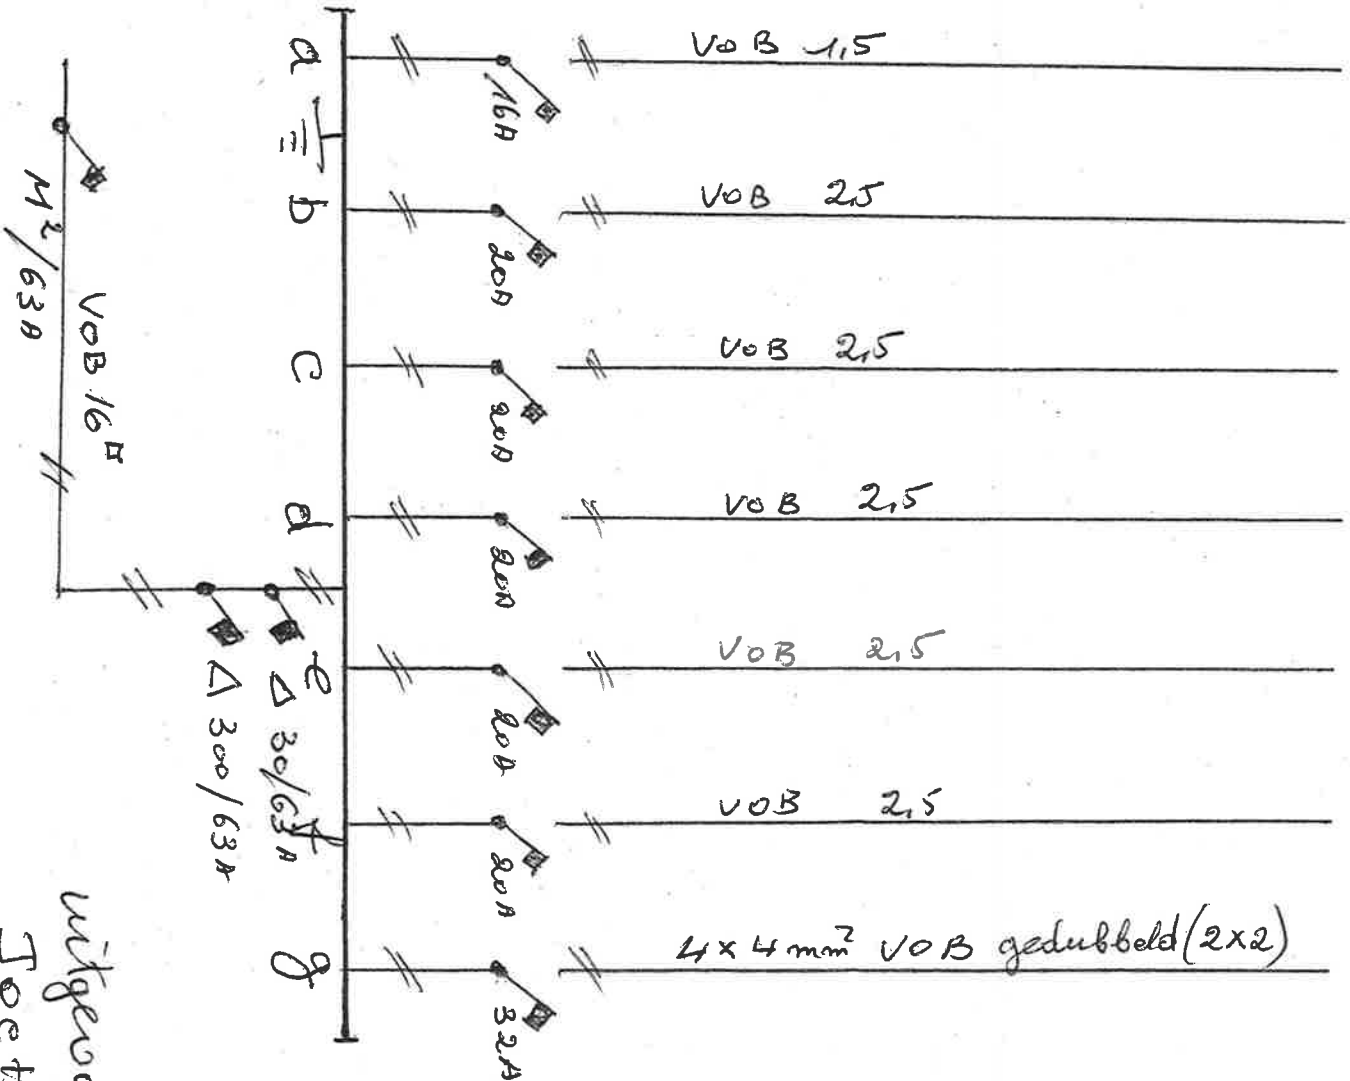

witgevoerd.
 TOOTHMANS

Deelman

eigendom Juf. E. Timmermans

Wilgersdahl 17 opp. 6a

1731 Delikh

uitgevoerd.

JOCHMANS

[Signature]

