

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 18/10/2023

Inspecteur: Michael De Landsheer

Mentor:

Installateur: De-Vos Filip Bvba

D-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.: BE 0870 363 281

Merken en type meettoestel: Metrel Eurotest
:T61557

Serienummer: 19481257

Datum verslag: 18/10/2023

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Nachtegaallaan
Huisnummer	33
Busnummer	3
Postcode	1731
Gemeente	Asse
Land	België

Eigenaar

Naam	Nachtegaallaan
Straatnaam	33
Huisnummer	3
Busnummer	1731
Postcode	Asse
Gemeente	België
Land	

Installateur


Naam	De Vos Filip Bvba
B.T.W. nr.	BE 0870 363 281
Telefoonnummer	0477939418
E-mail	filip1.de.vos@skynet.be

Type : appartement

EA N : 541448820057883807

Teller Nr. : 1sag1100364806

(afbeelding schakel- en verdeelbord:

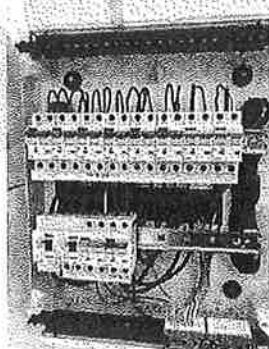

Ward onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 10


Verdelelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

l algemeen: 672 MΩ

RE: 3,63 Ω

OK

OK

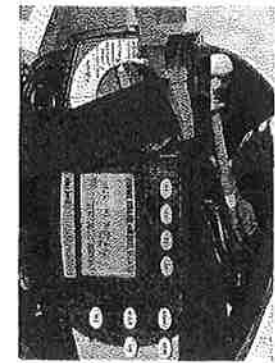

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

I _Δ (mA)	I _n (A)	I _n - andere (A)	I _Δ	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	10	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	10	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
2	C	16		2	1,5
7	C	20		2	2,5
1	C	32		2	6

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTAS

Nota/note 19 Alle differentieelstroombeschermingsinrichtingen werden getest en in orde bevonden.

Nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

ESLUIT

☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 18/10/2048

☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

RIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De Inspecteur Michael De Landsheer

De werknemer,

Michael De Landsheer

Michael De Landsheer
ACEG VZW-#117

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te vallen, rechte reeks of onrecht reeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorgaan en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.48

Stappenplan voor een installatie die conform is

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele opmerkingen.	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 18/10/2048	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

