

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Datum keuring: 26/11/2016	Inspecteur: Jamo Van Gansen	Mentor: -	Installateur: -
Datum verslag: 26/11/2016	B.T.W. nr.:-		IK. nr.:-
Merk en type meettoestel: Fluke 1653B	Serie Nr.: 1775063		Toestel mag gebruikt worden tot: 14/10/2017

Plaats van het onderzoek:		Eigenaar:	
Straatnaam	Europastraat	Naam	-
Huisnummer	55	Straatnaam	-
Postcode	2850	Huisnummer	-
Gemeente	Boom	Postcode	-
Type	woning	Gemeente	-

EAN : 54 **Teller Nr.:** : 7233414

Aard onderzoek: Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 271 , 271bis en 86.

Netbeheerder: EANDIS	Spanning: 1~230V	Meter / bord verbinding: 10 mm ²	Max beveiliging: 40 A
Aantal borden: 1	Aantal kringen: 12	Isolatie: 3.6 MΩ	
Aardelektrode: Aardingslus pen weerstand: 5 Ω			

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ	In	I _{kt}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300 mA	63 A		A	12	Ok	Ok
30 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A	3	Ok	Ok
mA	A			-	-	-

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Bescherming	Sectie	Aantal kringen	Bescherming	Sectie
Curve	IN	P	Curve	IN	P
Zie schema's					
		mm ²			mm ²
		mm ²			mm ²
		mm ²			mm ²
		mm ²			mm ²

Visueel nazicht (algemeen) <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	Directe aanraking <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	Indirecte aanraking <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK
Aansluitingen <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	Correcte schema's <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	schema in bijlage door Aceg vzw <input type="checkbox"/>
Equipotentiale verbindingen <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK <input type="radio"/> niet van toepassing <input type="radio"/> in afwachting		
Continuïteit <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	Verlichting / toestellen <input type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK <input checked="" type="radio"/> NVT	

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

CONCLUSIE

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.** De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 26/11/2041
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.** Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.** Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 0

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Jarno Van Gansen


Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit


Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be


02 / 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481

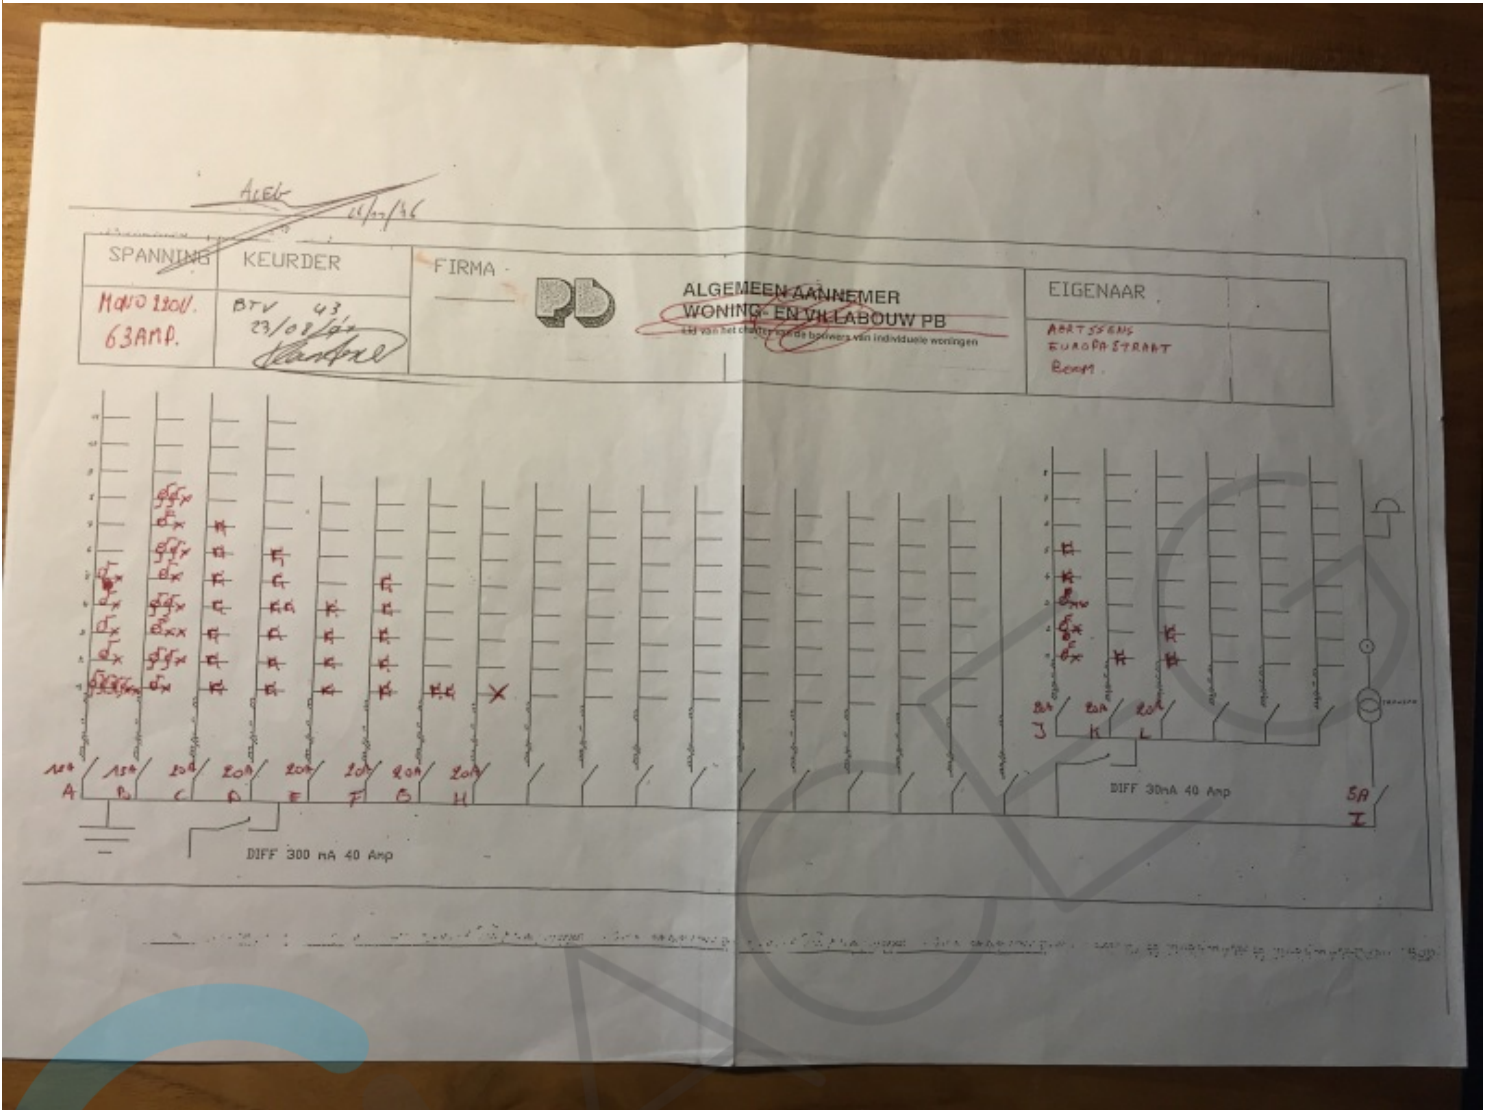

Muuraanzicht: Project DSM keukens
BizServer/DSM3SBO110822 - 0/20/1 / Wand - 2

Datum : 23.11.2012 OPGELET : tekening is een niet bindende weergave van de geplande installatie

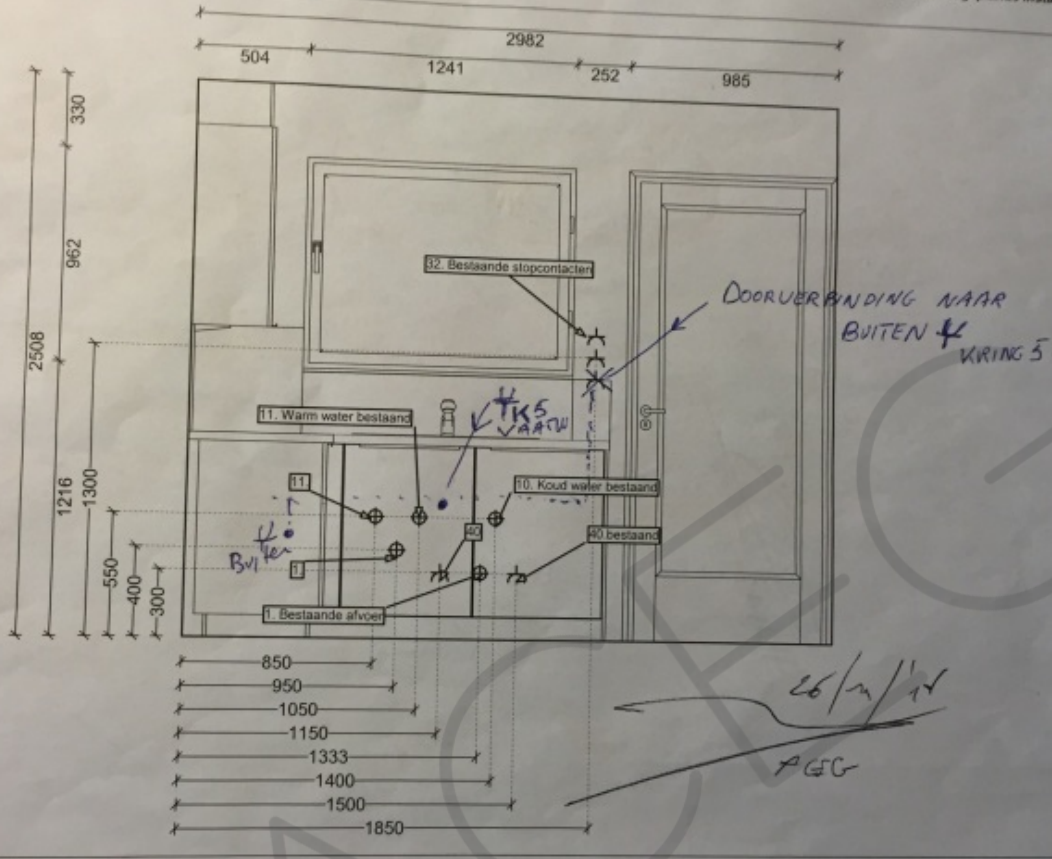

Muuraanzicht: Project DSM keukens
BizServer/DSM3SBO110822 - 0/20/1 / Wand - 1

Datum : 23.11.2012 OPGELET : tekening is een niet bindende weergave van de geplande installatie

