

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 29/09/2019 Inspecteur: Barry Behiels Mentor: Installateur: Zwijsen Electro NV
ID-label: Markgravelei 32 B.T.W. nr.: BE 431 539 043 Client reference: IK. nr.: -

Merk en type meettoestel: Fluke 1663 Serie Nr.: 4396050

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Markgravelei
Huisnummer 32
Busnummer 104
Postcode 2000
Gemeente Antwerpen

Naam contactpersoon -
Telefoon 015 305 377
Gsm nr. (SMS)

Eigenaar

Naam Ilse Borghijs
Straatnaam Markgravelei
Huisnummer 104
Busnummer 101
Postcode 2000
Gemeente Antwerpen

Installateur

Naam Zwijsen Electro NV
BTW nr. BE 431 539 043
Telefoonnummer 015 305 377
E-mail aankoop@zwijsen.be

Type : appartement

EAN : 541448860017688578

Teller Nr.: : 33899735

Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidsonderzoek van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 270 en 86.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 1N400V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A
Aantal borden: 1 Aantal kringen: 18 Isolatie: >500 MΩ

Aardelektrode: Aardingslus RE: 1,0 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{Δt}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	18	Ok	Ok
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	Ok	Ok

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
----------------	-------	--------------------	----------	---	---------------------------

Zie schema

Visueel nazicht (algemeen)	☒ OK ☐ NOK	Directe aanraking	☒ OK ☐ NOK	Indirecte aanraking	☒ OK ☐ NOK
Aansluitingen	☒ OK ☐ NOK	Correcte schema's	☒ OK ☐ NOK	schema in bijlage door Aceg vzw	☐
Equipotentiale verbindingen	☒ OK ☐ NOK ☐ niet van toepassing ☐ in afwachting				
Continuïteit	☒ OK ☐ NOK	Verlichting / toestellen	☐ OK ☐ NOK ☒ NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Opmerking

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 29/9/2044
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:



Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 10

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Barry Behiels



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be


02 / 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481


Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Indien u belangrijke uitbreidingen doet aan uw installatie, laat opnieuw keuren	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 29/9/2044	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



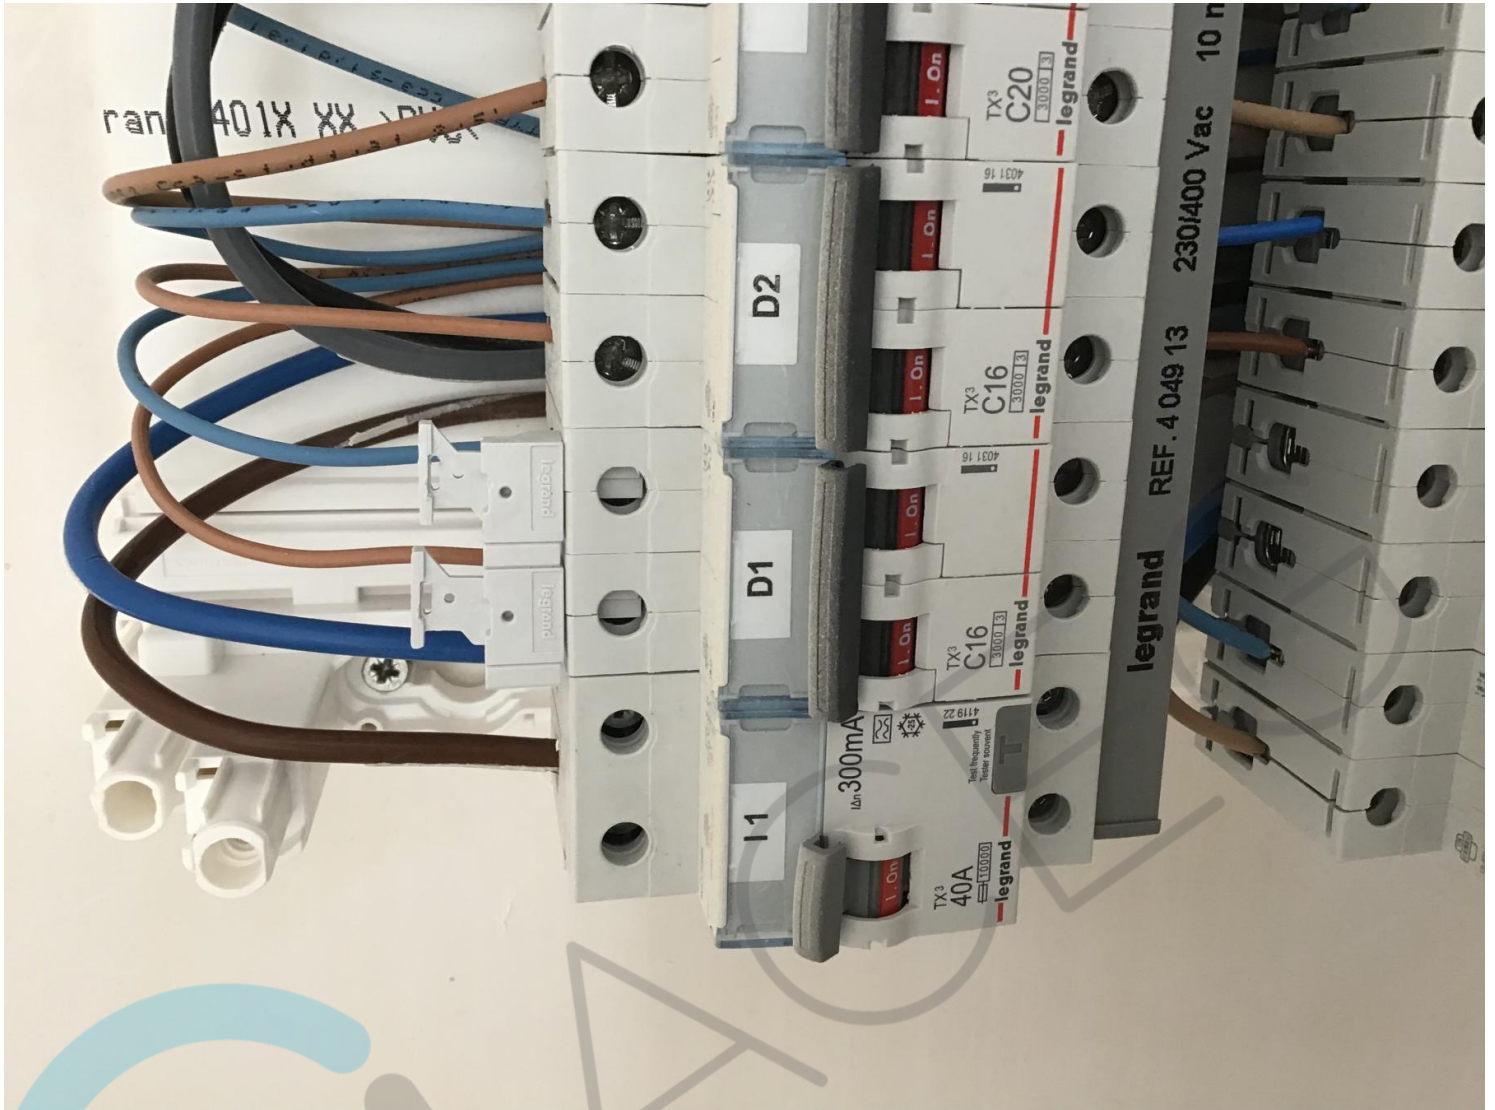



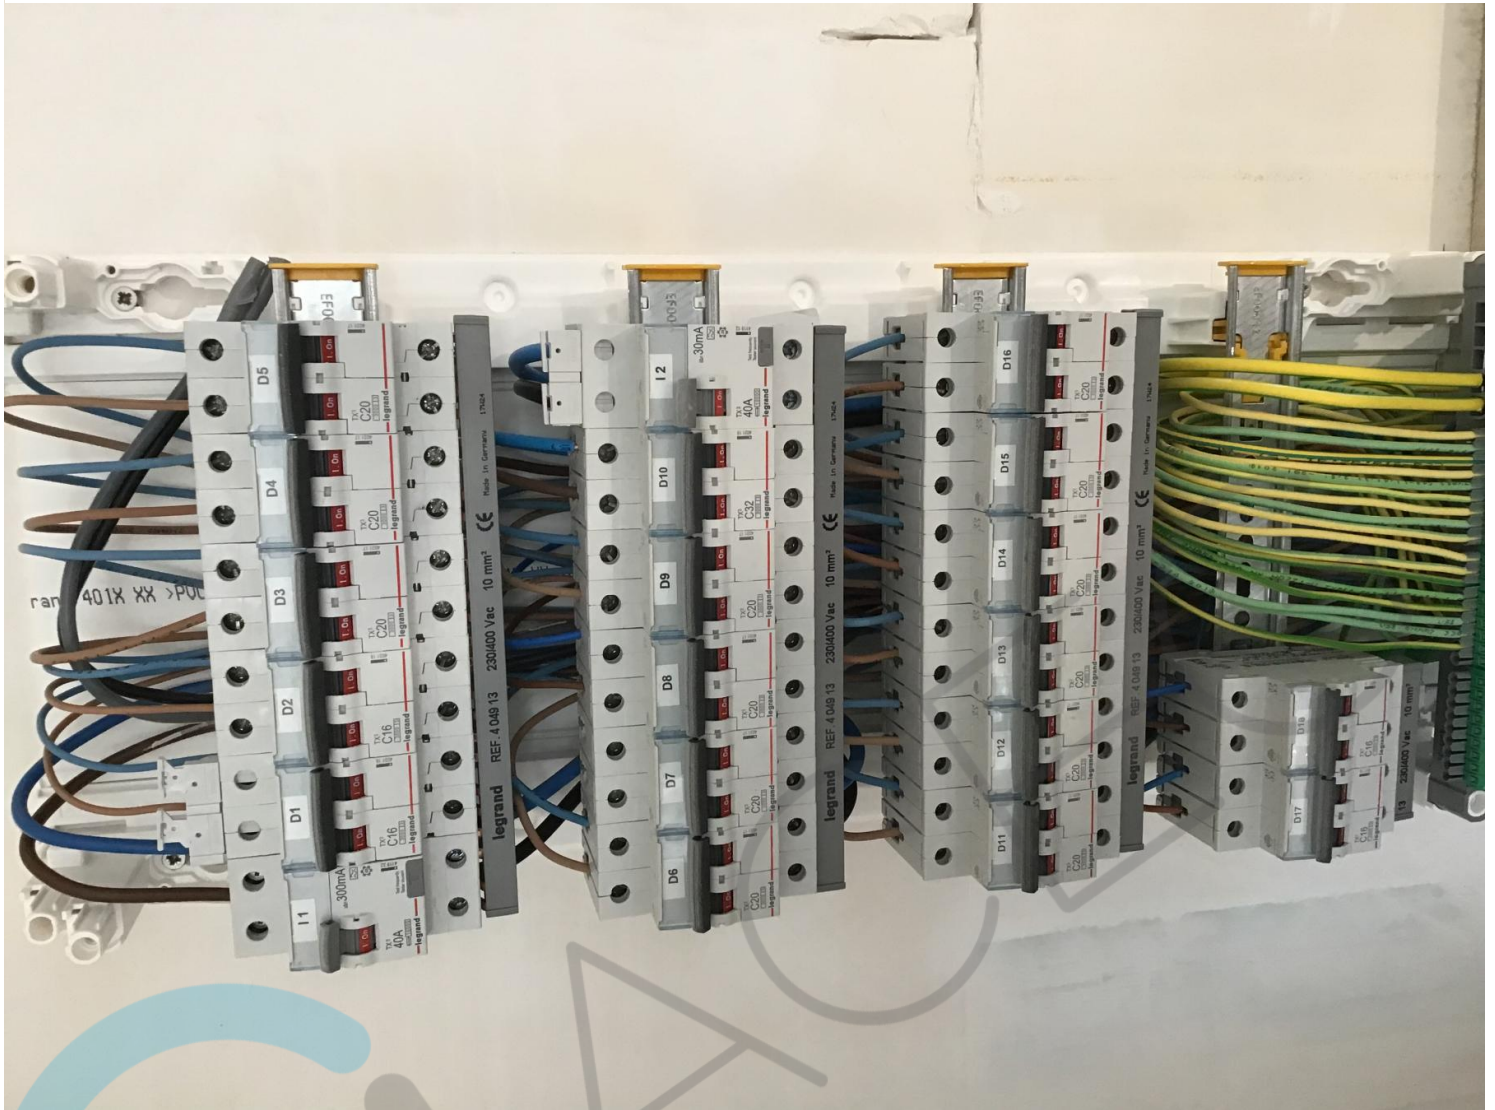










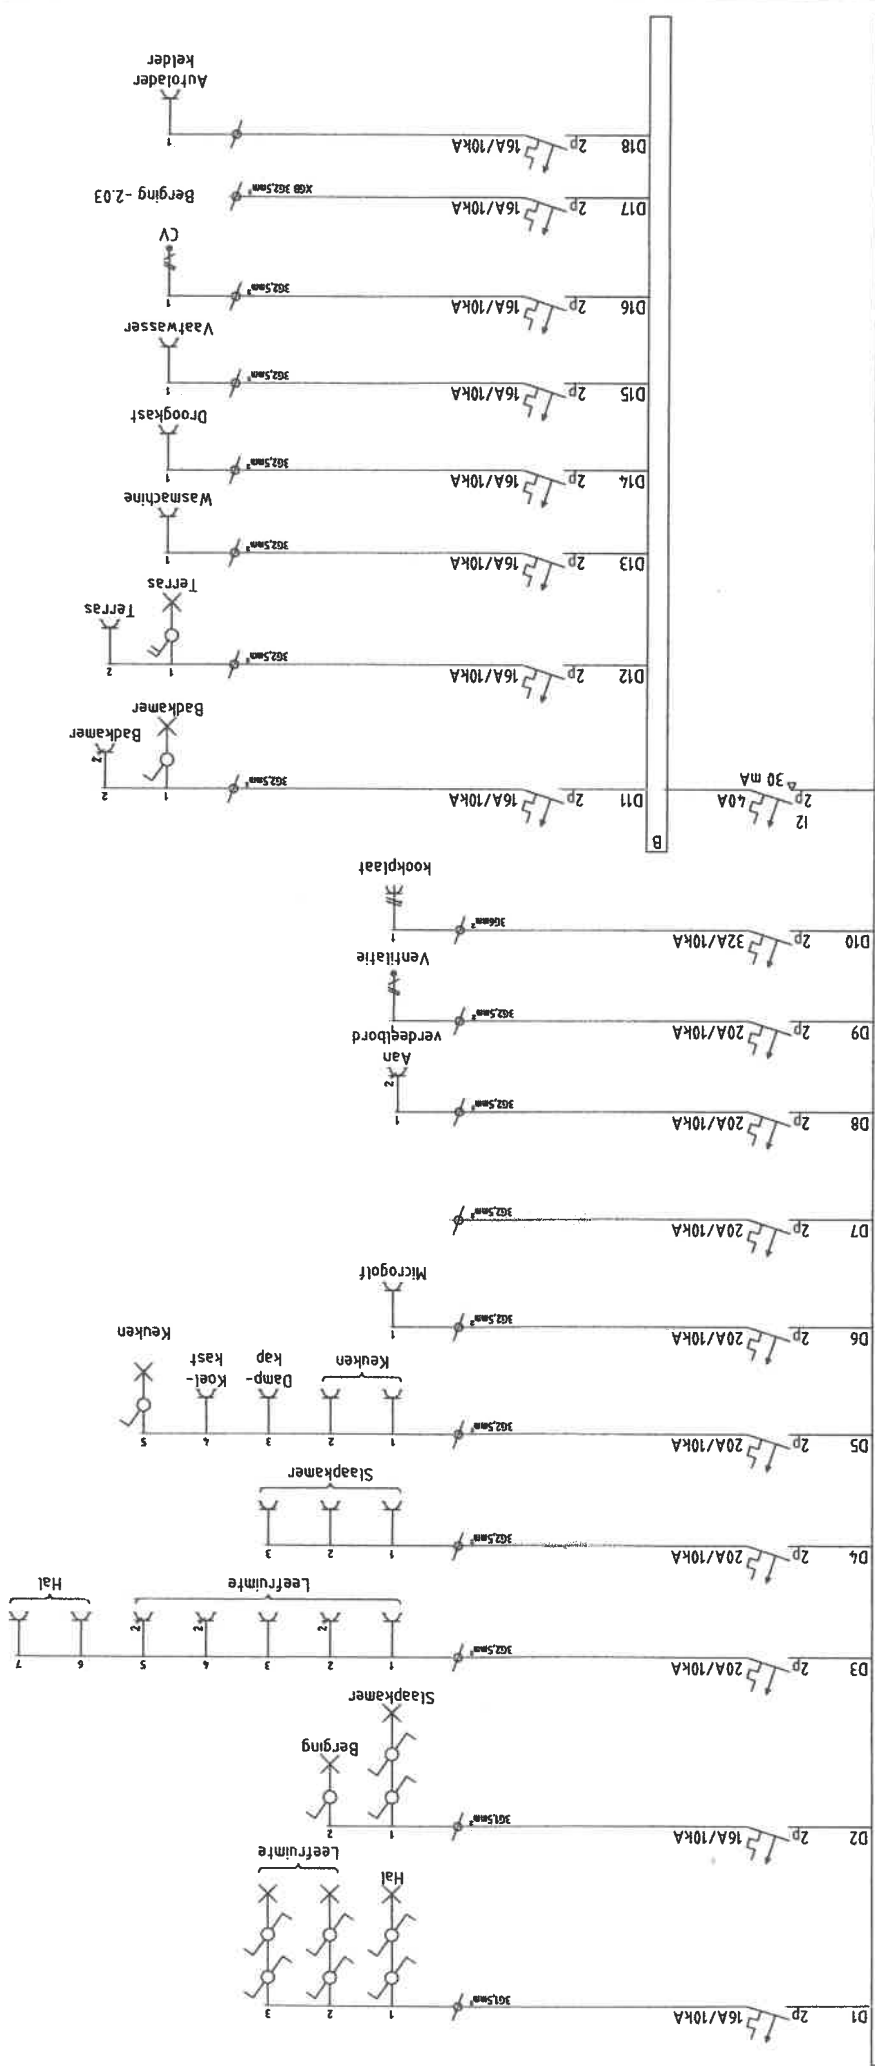

Aanpassing: B C D E 17.09.19 As built

Appartementen Antwerpen Markravenlei

TUM: 4.2019
Adolphe Stocletlaan 202
B-2570 DUFFEL
Tel.: 05/305.305
v: 05/305.300

Verdebord Appartement 1.4
Ilse Borghijs

PD-nr: OP-nr: blad 1 van 1

Plannr: VB 1.4


Electro Zwijsen

Onderliggend(e) architectuurplan(nen) is (zijn) loufer indicatief en dient (-en) ter plaatse met de best.a.

17/9/19
BARRY BENIELS
DACEC
Elektronische Dienstverlening
www.dacec.be

XGB 4x10mm²
300 mA

kWh

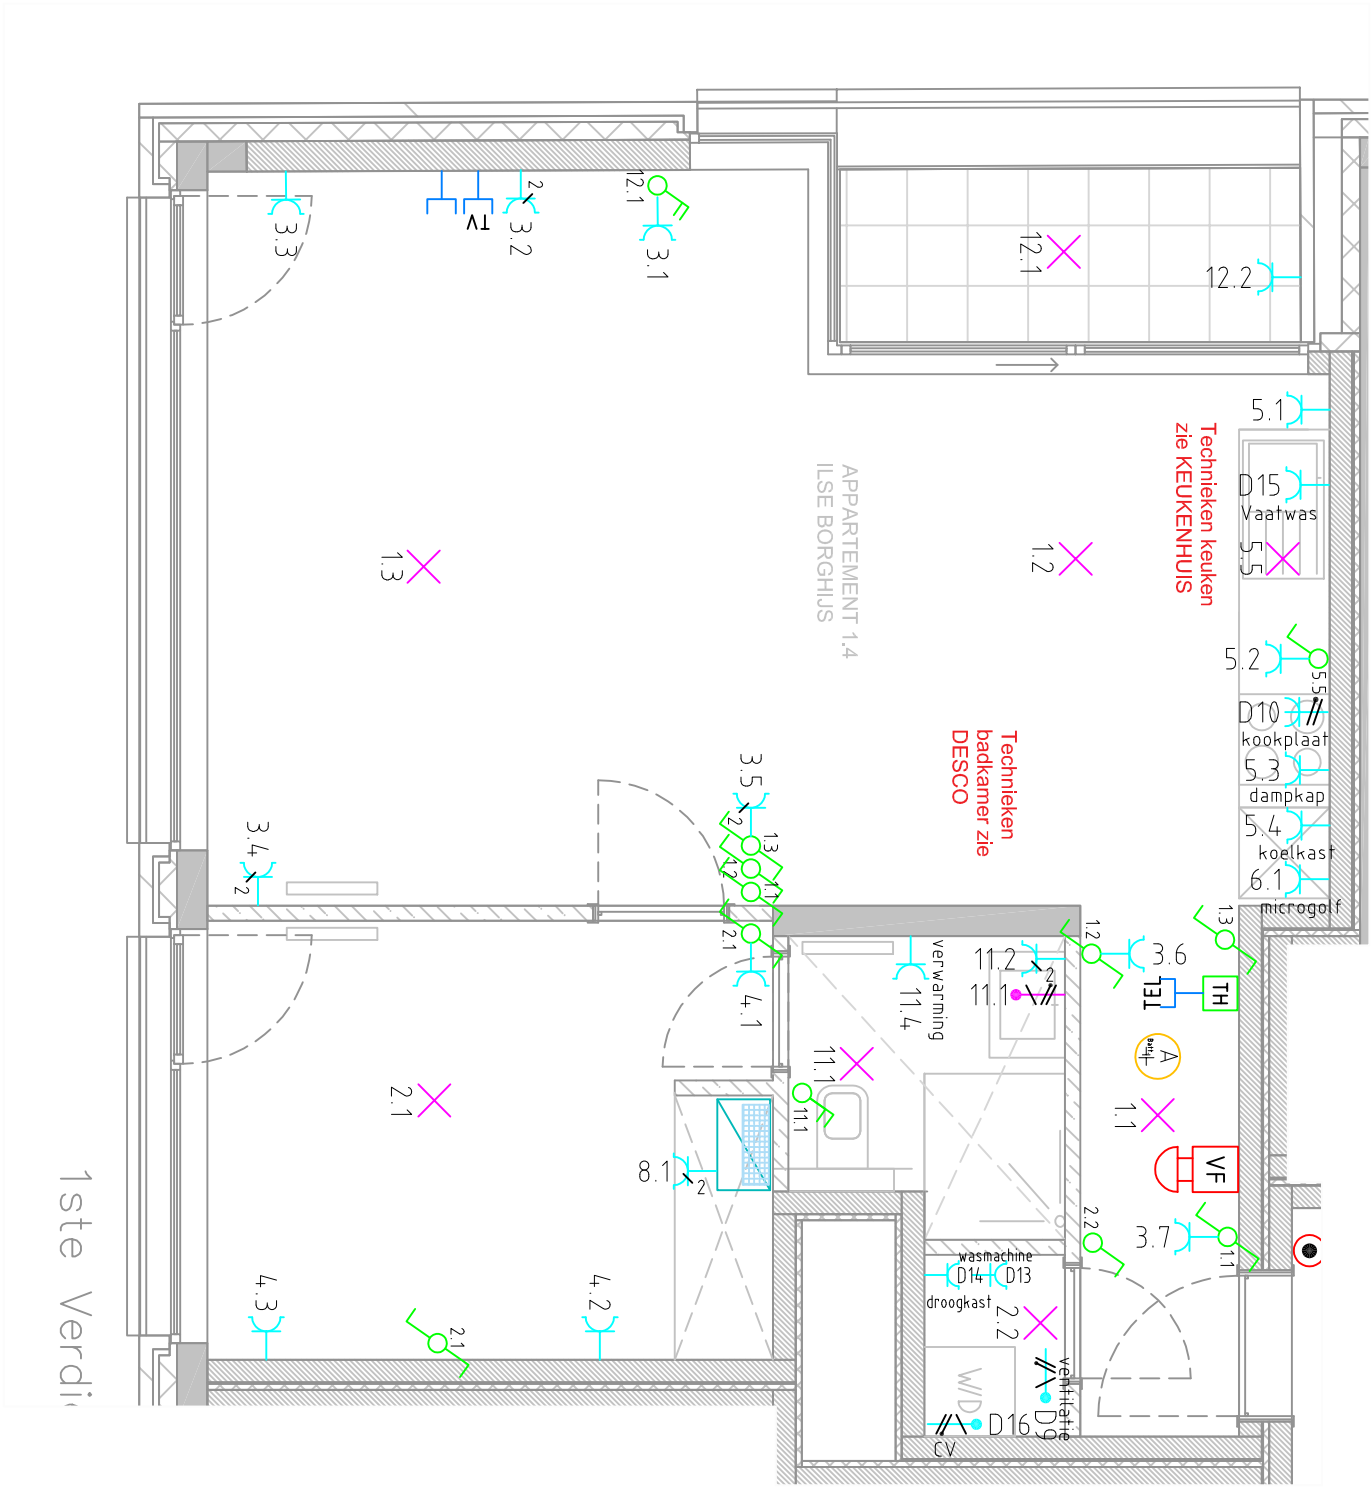


Onderliggend(e) architectuurplan(nen) is (zijn) louter indicatief en dient (-en) ter plaatse met de bestaande toestand nagezien te worden.

Electro Zwijsen

Aanpassing:										A	B	C	D	E	09.07.19 As built									
DATUM:										11.02.2019														
Appartementen Antwerpen Markgravenlei Adolphe Stocletlaan 202 B-2570 DUFFEL Tel.: 015/305.305 Fax: 015/305.300  Electro Zwijsen															Appartement 1.4					ILSE BORGHUIS				
															PD-nr:					OP-nr:				
blad 1 van 1					Plannr: APP 1.4																			

Onderliggende(n) architectuurplan(nen) is (zijn) louter indicatief en dient (-en) ter plaatse met de bestaande toestand nagezien te worden.

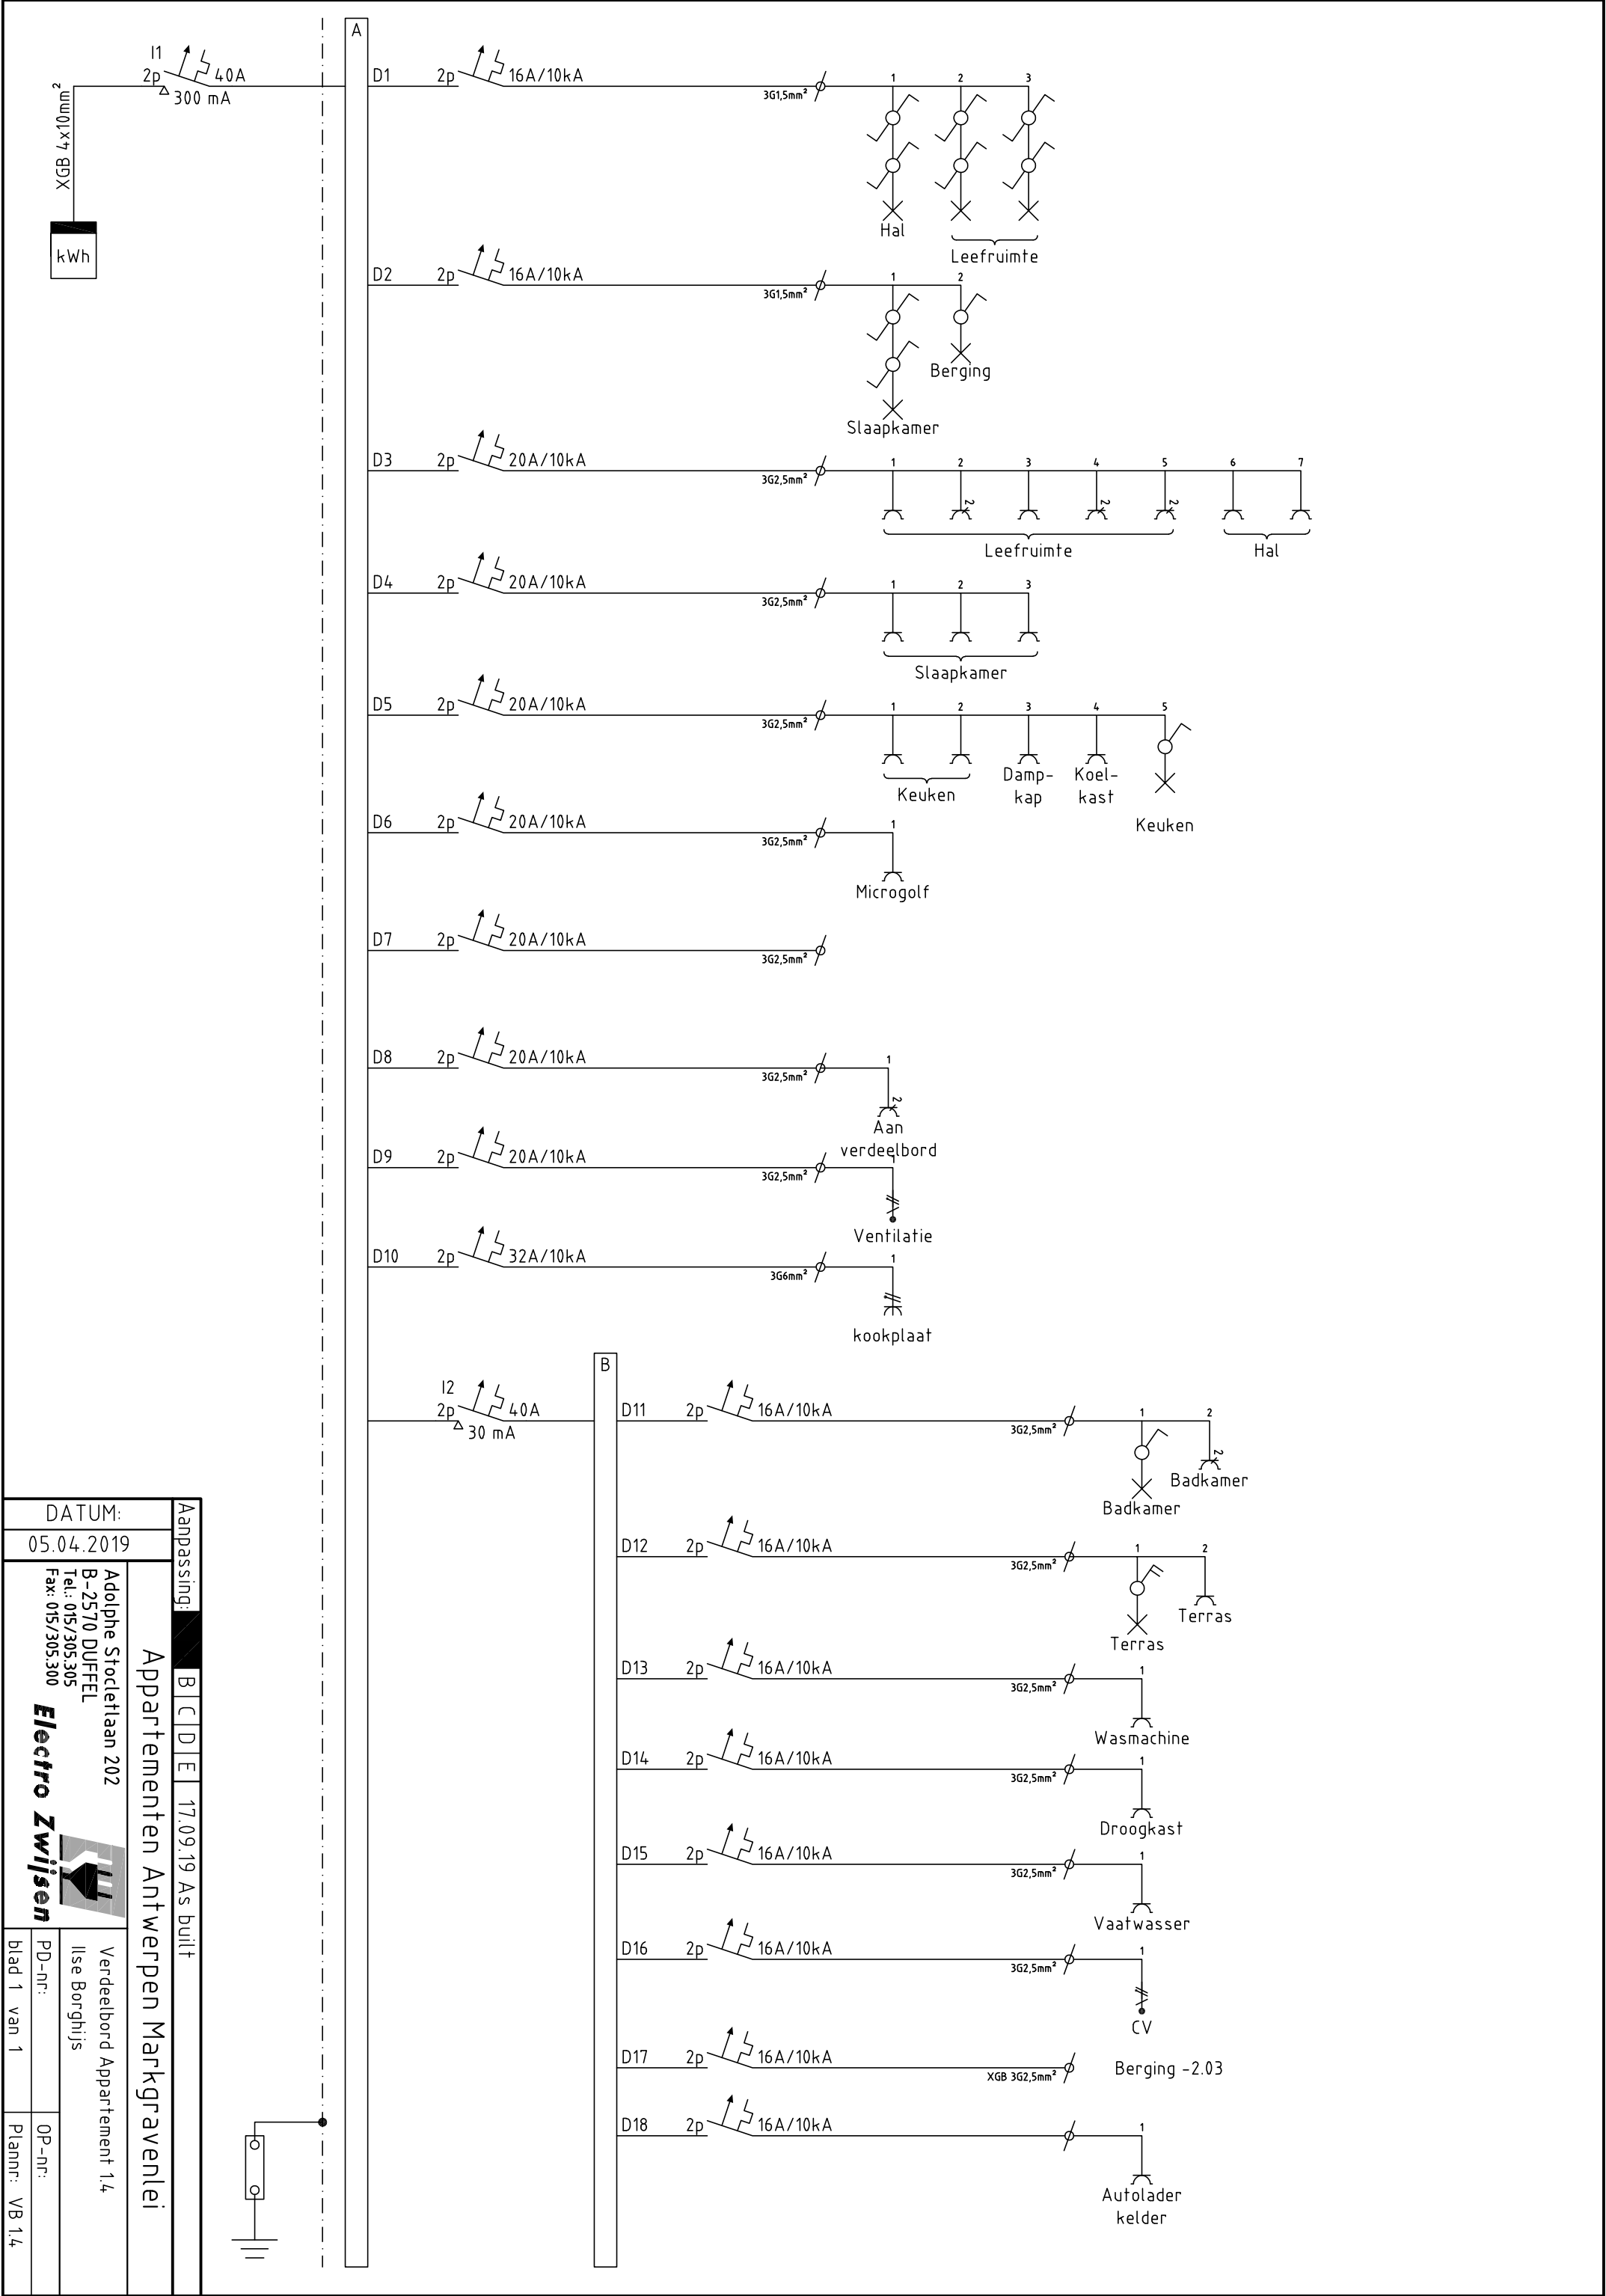

Aanpassing:		B C D E		17.09.19 As built	
DATUM:		05.04.2019		Appartementen Antwerpen Markgravenlei	
Adolphe Stocletlaan 202		Verdeelbord Appartement 1.4		Ilse Borghijs	
B-2570 DUFFEL		Tel.: 015/305.305		OP-nr:	
Fax: 015/305.300		Electro Zwijsen		Plan nr: VB 1.4	
blad 1 van 1		PD-nr:		OP-nr:	
