

SGS

Adresse de facturation / facturatieadres:

Leubmans
Yzerstraat 1
9120 Mellebeke

Facture n° / Factuur nr: **30729**

Date/datum: 12/11/2009

T.V.A.

B.T.W.

Date de contrôle / datum van onderzoek: 12/11/2009

Adresse du contrôle / adres van onderzoek:

Yzerstraat 1
9120 Mellebeke

Objet du contrôle / betreft controle van:

- installation électrique BT / LS elektrische installatie (scellé n° / zegel nr 54668) ☒
- installation gaz / gas installatie ☐
- installation eau / water installatie ☐
- autre / andere: ☐
- (n° rapports / verslag nr): 126898

Mode de paiement (*) : espèces - bancontact n°

Betalingswijze (*) : ~~contant geld~~ - bancontact nr

Pour acquit / voor voldaan

SGS
Van der Grinten

(Nom, n° et signature de l'agent visiteur)

(Naam, nr en handtekening agent-bezoeker)

MONTANT
BEDRAG

103,31

TOTAL
TOTAAL

EUR

103,31

T.V.A.
B.T.W.

21%

21,69

A PAYER
TE BETALEN

EUR

125

Bld International/Internationalelaan, 55/D 1070 Bruxelles/Brussel t +32 (0)2 411 60 35 f +32 (0)2 411 38 70
Noorderlaan, 87 2030 Antwerpen t +32 (0)3 545 48 88 f +32 (0)3 545 48 89
Square des Conduites d'Eau, 1 4020 Liège t +32 (0)4 365 62 71 f +32 (0)4 366 14 93
Grote Baan, 76/1 3530 Houthalen t +32 (0)11 80 61 76 f +32 (0)11 80 61 75

SGS Statutory Services Belgium ASBL/VZW

Member of the SGS Group

RPM Bruxelles/RPR Brussel TVA/BTW BE 0407 573 810 DEXIA 552-2692800-45

ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE GEVOED DOOR HET LS-VERDEELNET

Gebruikte meettoestellen: Aardingsmeter SGS nr: A0314 Isolatiemeter SGS nr: A0314 Continuïteitsmeter SGS nr: A1207

Netsysteem: TT

Controledatum: 12/11/2009

Aard van onderzoek: ☐ Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling (AREI art.270) (Voorschriften DNB)
☒ Periodiek controlebezoek (AREI art.271 en 271bis) (ARAB art.262) (Voorschriften DNB)
☐ Controlebezoek vóór versterking en/of verandering teller (AREI art.276) (Voorschriften DNB)
☐ Controlebezoek vóór verkoop van wooneenheid (AREI art.276bis) (Voorschriften DNB)
☐ Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling van fotovoltaïsche installatie (AREI art.270) (Voorschriften DNB C10/11) (zie keerzijde)Aard van installatie: ~~bestaande~~ ~~nieuwe~~ ~~uitbreiding~~ ~~wijziging~~ ~~voorlopig~~ ~~werf~~:
Type van de - door de installatie bediende - lokalen: wooneenheid (huis, appartement, andere), huishoudelijke werkruimte, gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid, andere:

Bouwjaar: fundering vóór - na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór - na 1.10.81 - 1.1.83 - BA4/BA5: ja / nee

Aansluiting: spanning: 2x230 V AC; Bescherming van de aansluiting: bestaande: A - voorzien: 40 A; type: ADSI (300mA)

Voedingskabel hoofdbord: 2 x 10 mm², type VOB; Algemene schakelaar: 40 A; type: ADSI (300mA)

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 18; Ra = 18 Ω; Ri tot = 29,5 MΩ

BESCHRIJVING: ☐ zie schema's in bijlage

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

- De geïnstalleerde ADSI's stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: goed - inbreuk - opmerking
- De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen: goed - inbreuk - opmerking
- Bestaat er een badkamer - wasmachine - wasruimte - afwasmachine - droogkast - boiler - douchekamer: ja - nee
- Plaatsing van ZLVS verlichting: ja - nee
- Plaatsing van elektrische verwarming: ja - nee
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's: goed - inbreuk - opmerking
- Staat van het elektrisch materiaal: goed - inbreuk - opmerking
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking: goed - inbreuk - opmerking
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd - en bijkomende): goed - inbreuk - opmerking
- Vast of vast opgesteld materieel: goed - inbreuk - opmerking
- Controle van de werking van de ADSI via de eigen testinrichting en via de opwekking van een foutstroom: goed - inbreuk - opmerking

OPMERKINGEN:

0: No schilderwerken op afgedruktis terug te voeren.

0: Installatie geschikt voor Mono-Phase / 40A.

PLICHTEN VAN DE EIGENAAR, BEHEERDER OF HUURDER: zie keerzijde

BESLUIT: (belangrijke informatie keerzijde).

Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie zijn gecontroleerd.

☒ De installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI, onder voorbehoud van ☐ (zie keerzijde 1). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. De algemene ADSI is - verzegeld. De schema's, eendraads en situatie, zijn nagezien en door de twee - betrokken personen ondertekend.☐ De installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. De ADSI was verzegeld ☐ (zie keerzijde 2).☒ Een aanvullende bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor 12/11/2034☐ Een aanvullende bezoek moet door een erkend keuringsorganisme worden uitgevoerd na een termijn van 18 maand vanaf de dag van verkoopakte.

INSPECTEUR:

NAAM - FUNCTIE/BEVOEGHEID:

Nr. naam + handtekening

inspecteur gezien op vermelde datum

VISUM VAN DNB:

Blad LS nr 126898


DATUM:

Dit rapport wordt uitgegeven door SGS Statutory Services Belgium onder beding van haar algemene voorwaarden in uw bezit.


SSB BLEE10.11N - 25/11/08

SGS Statutory Services Belgium VZW
ZetelInternationalelaan, 55/D
Grote baan, 76/1
SGS House, Noorderlaan, 871070 Brussel
3530 Houthalen
2030 Antwerpent +32 (0)2 411 60 35
t +32 (0)11 80 61 76
t +32 (0)3 545 48 88f +32 (0)2 411 38 70
f +32 (0)11 80 61 75
f +32 (0)3 545 48 89e sgs.brussels.sgsbn@sgs.com
e sgs.houthalen.sgsbn@sgs.com
e sgs.antwerp.sgsbn@sgs.com


differentiël: 300mA		A 16 A	J 16 A	H 20 A	Q 20 A
differentiël 30mA		B 20 A	K 16 A	I 20 A	R 20 A
licht: tuin		C 20 A	L 16 A	licht: 1e verdiep	stopcontacten: living
stopcontact: boiler		D 20 A	M 16 A	transfo	230v - 24v
stopcontacten + licht: badkamer				licht: keuken + trap	
stopcontact: wasmachine		E 20 A	N 16 A	licht: living + bureau	living
stopcontact: droogkast				licht: garage + kelder	living
stopcontact: vaatwasmachine		F 20 A	O 20 A	stopcontacten: keuken	keuken
					keuken
inductievuur		G 32 A	P 20 A	stopcontacten: oven + dampkap	trap
					tuin
					garage

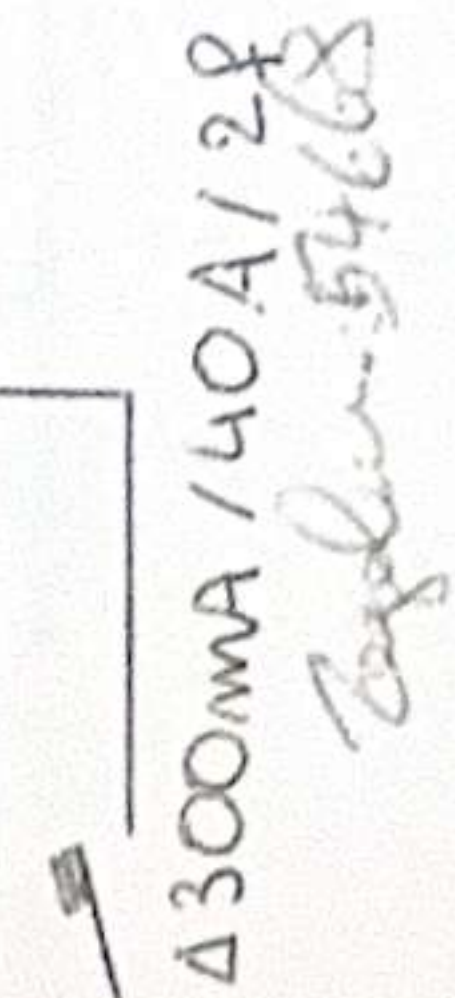


TRAIN A SUCCESSFUL

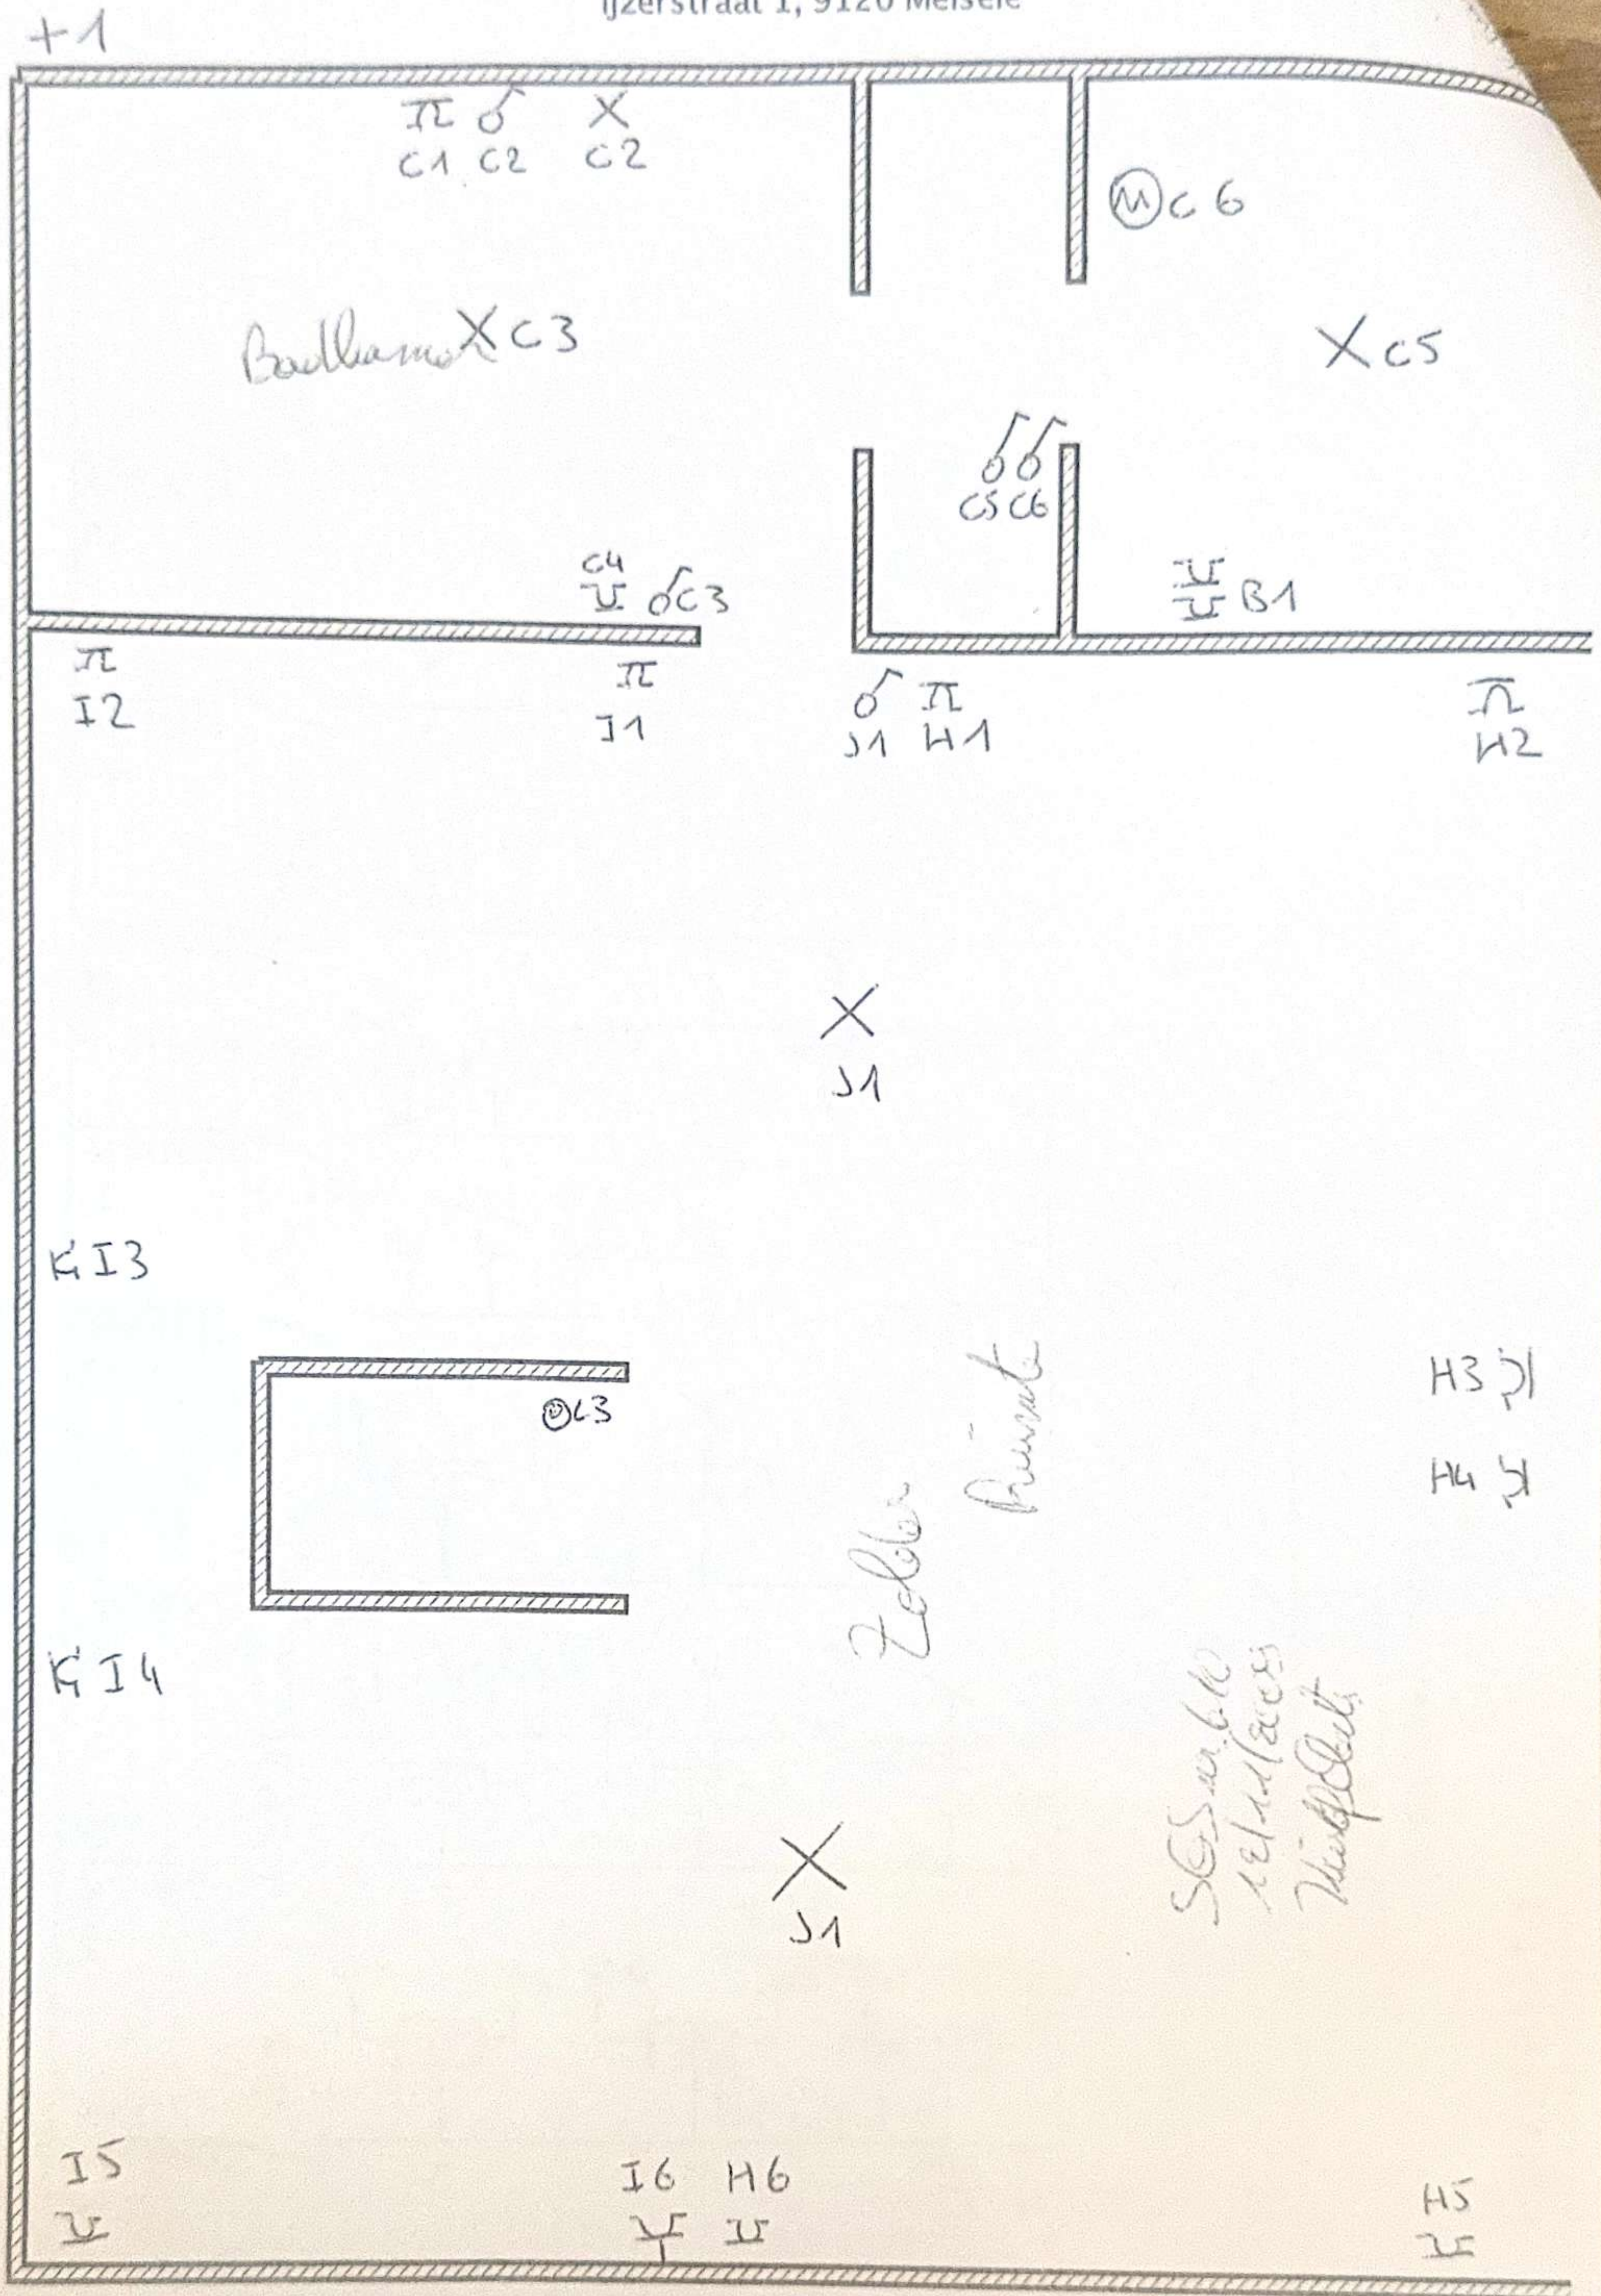

Wastafel
Toilet
Kruiswastafel

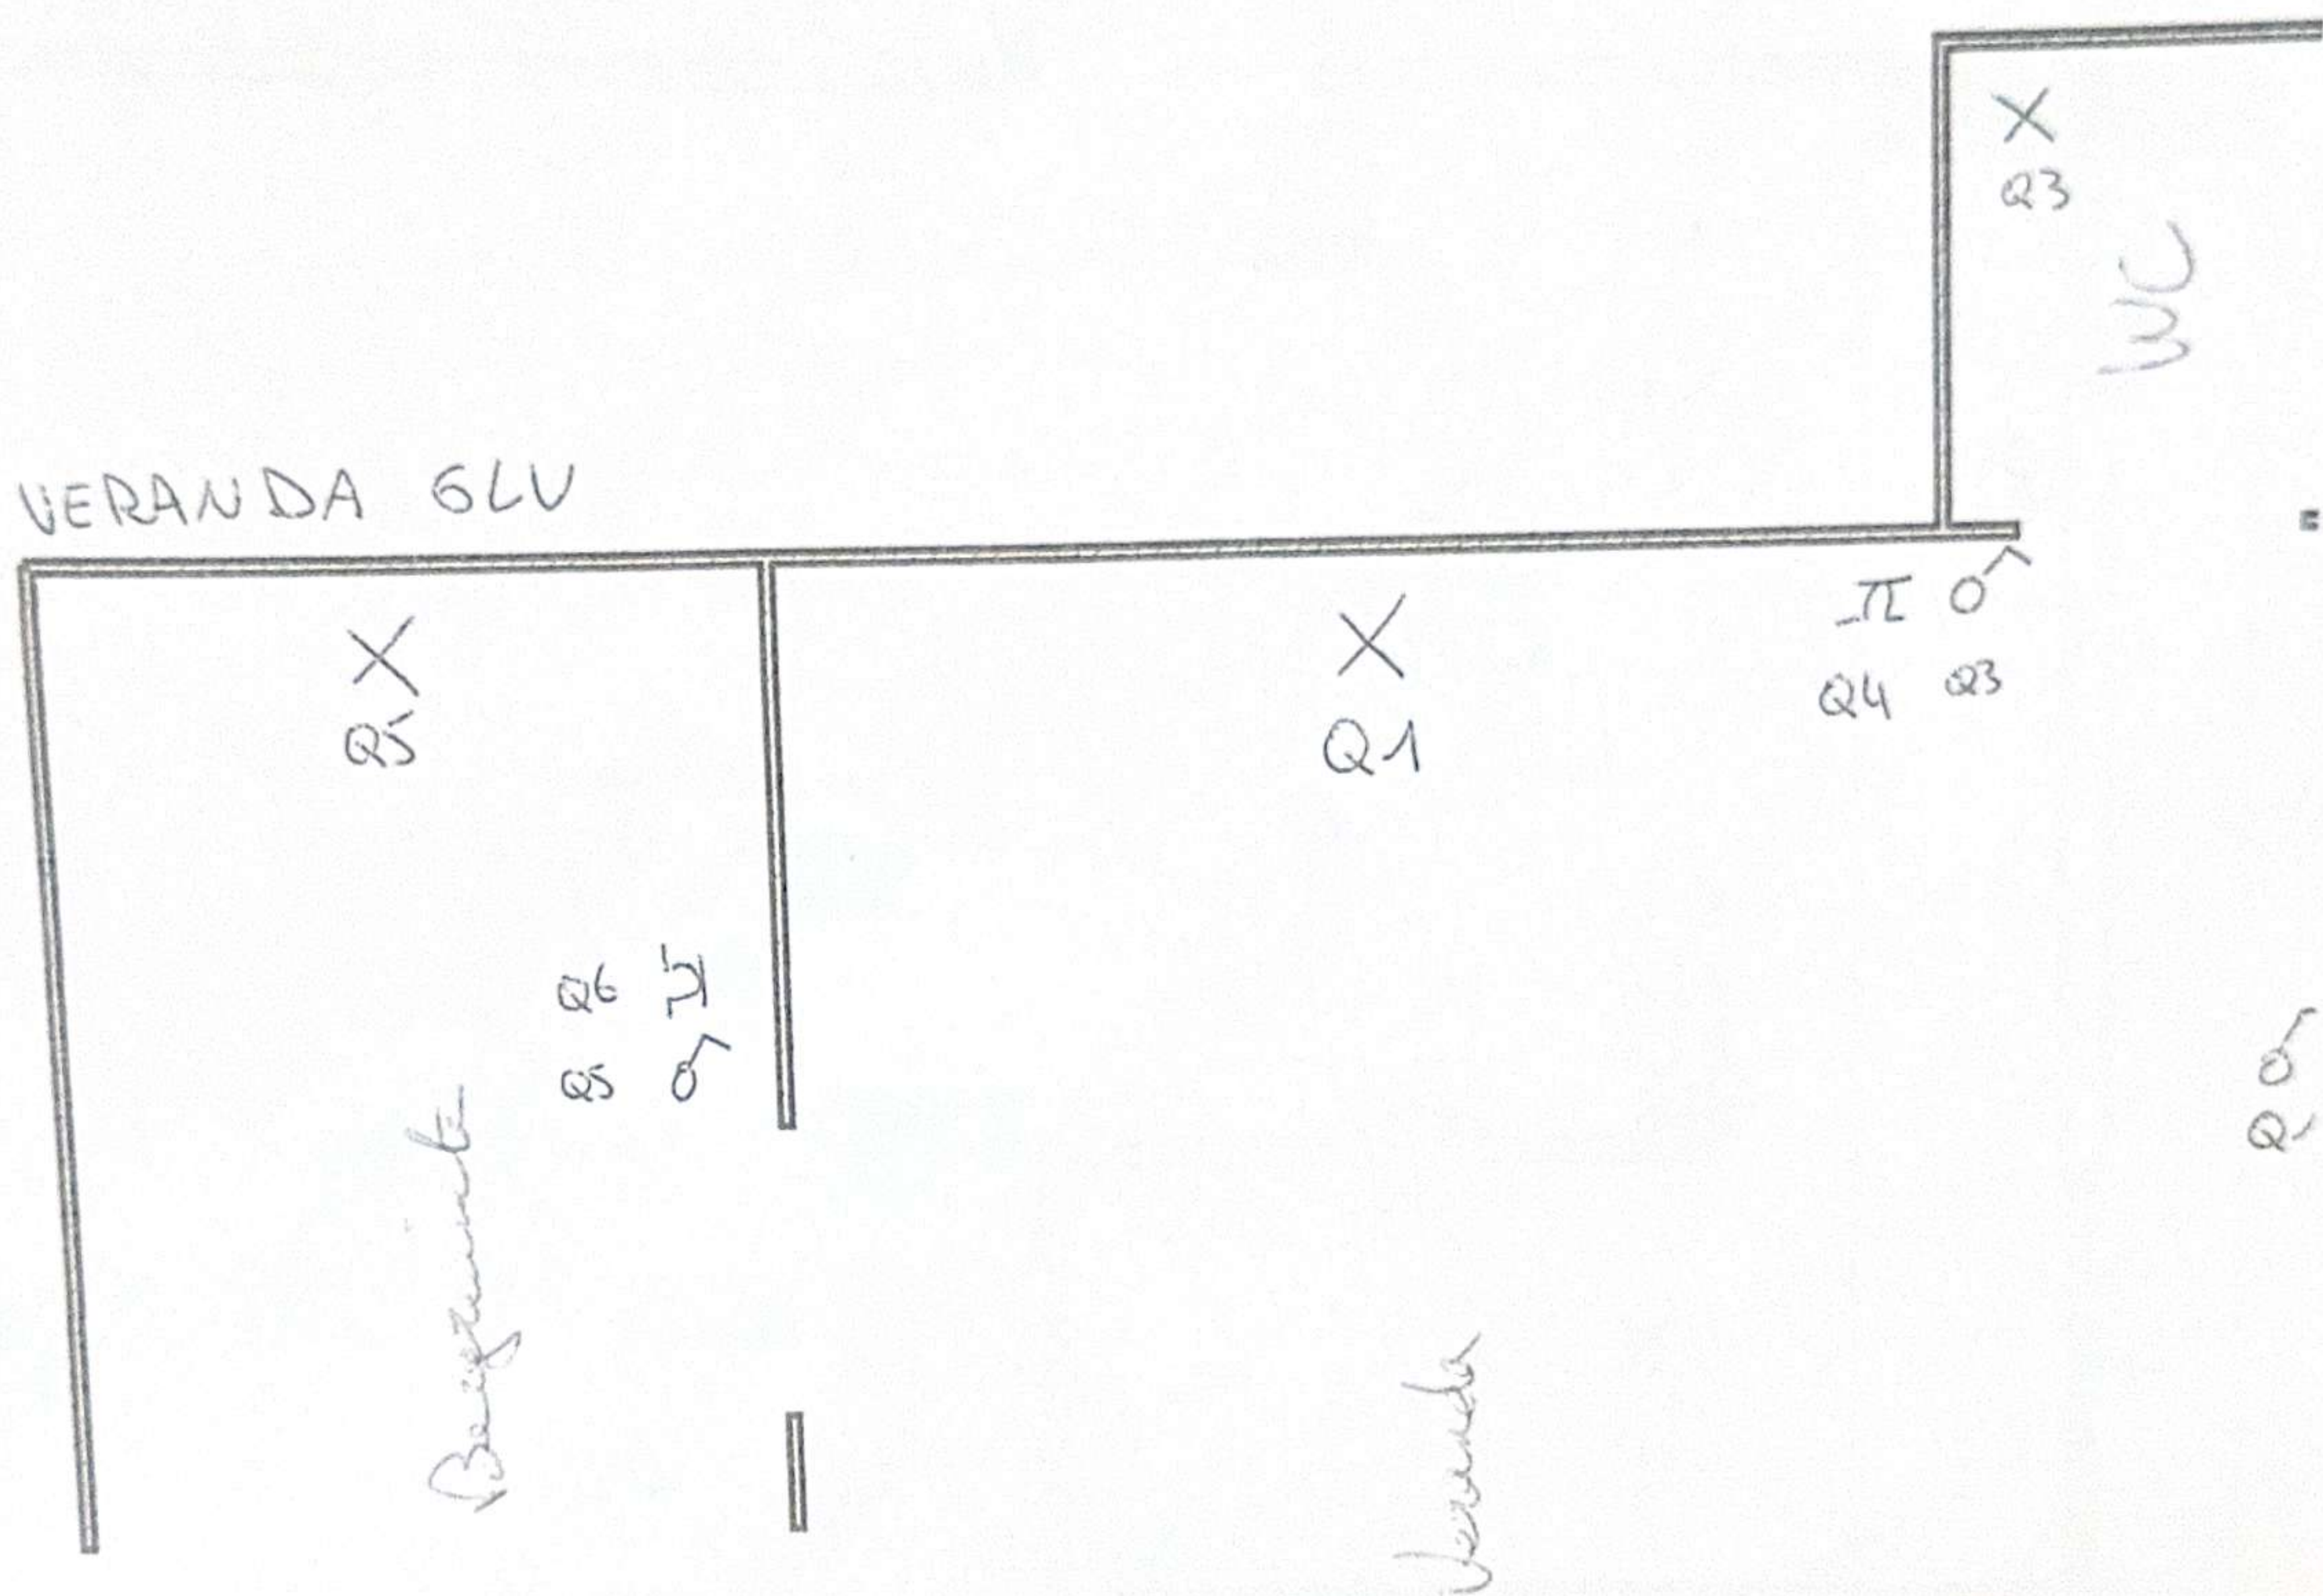

SL-San. 610
Wastafel
Toilet

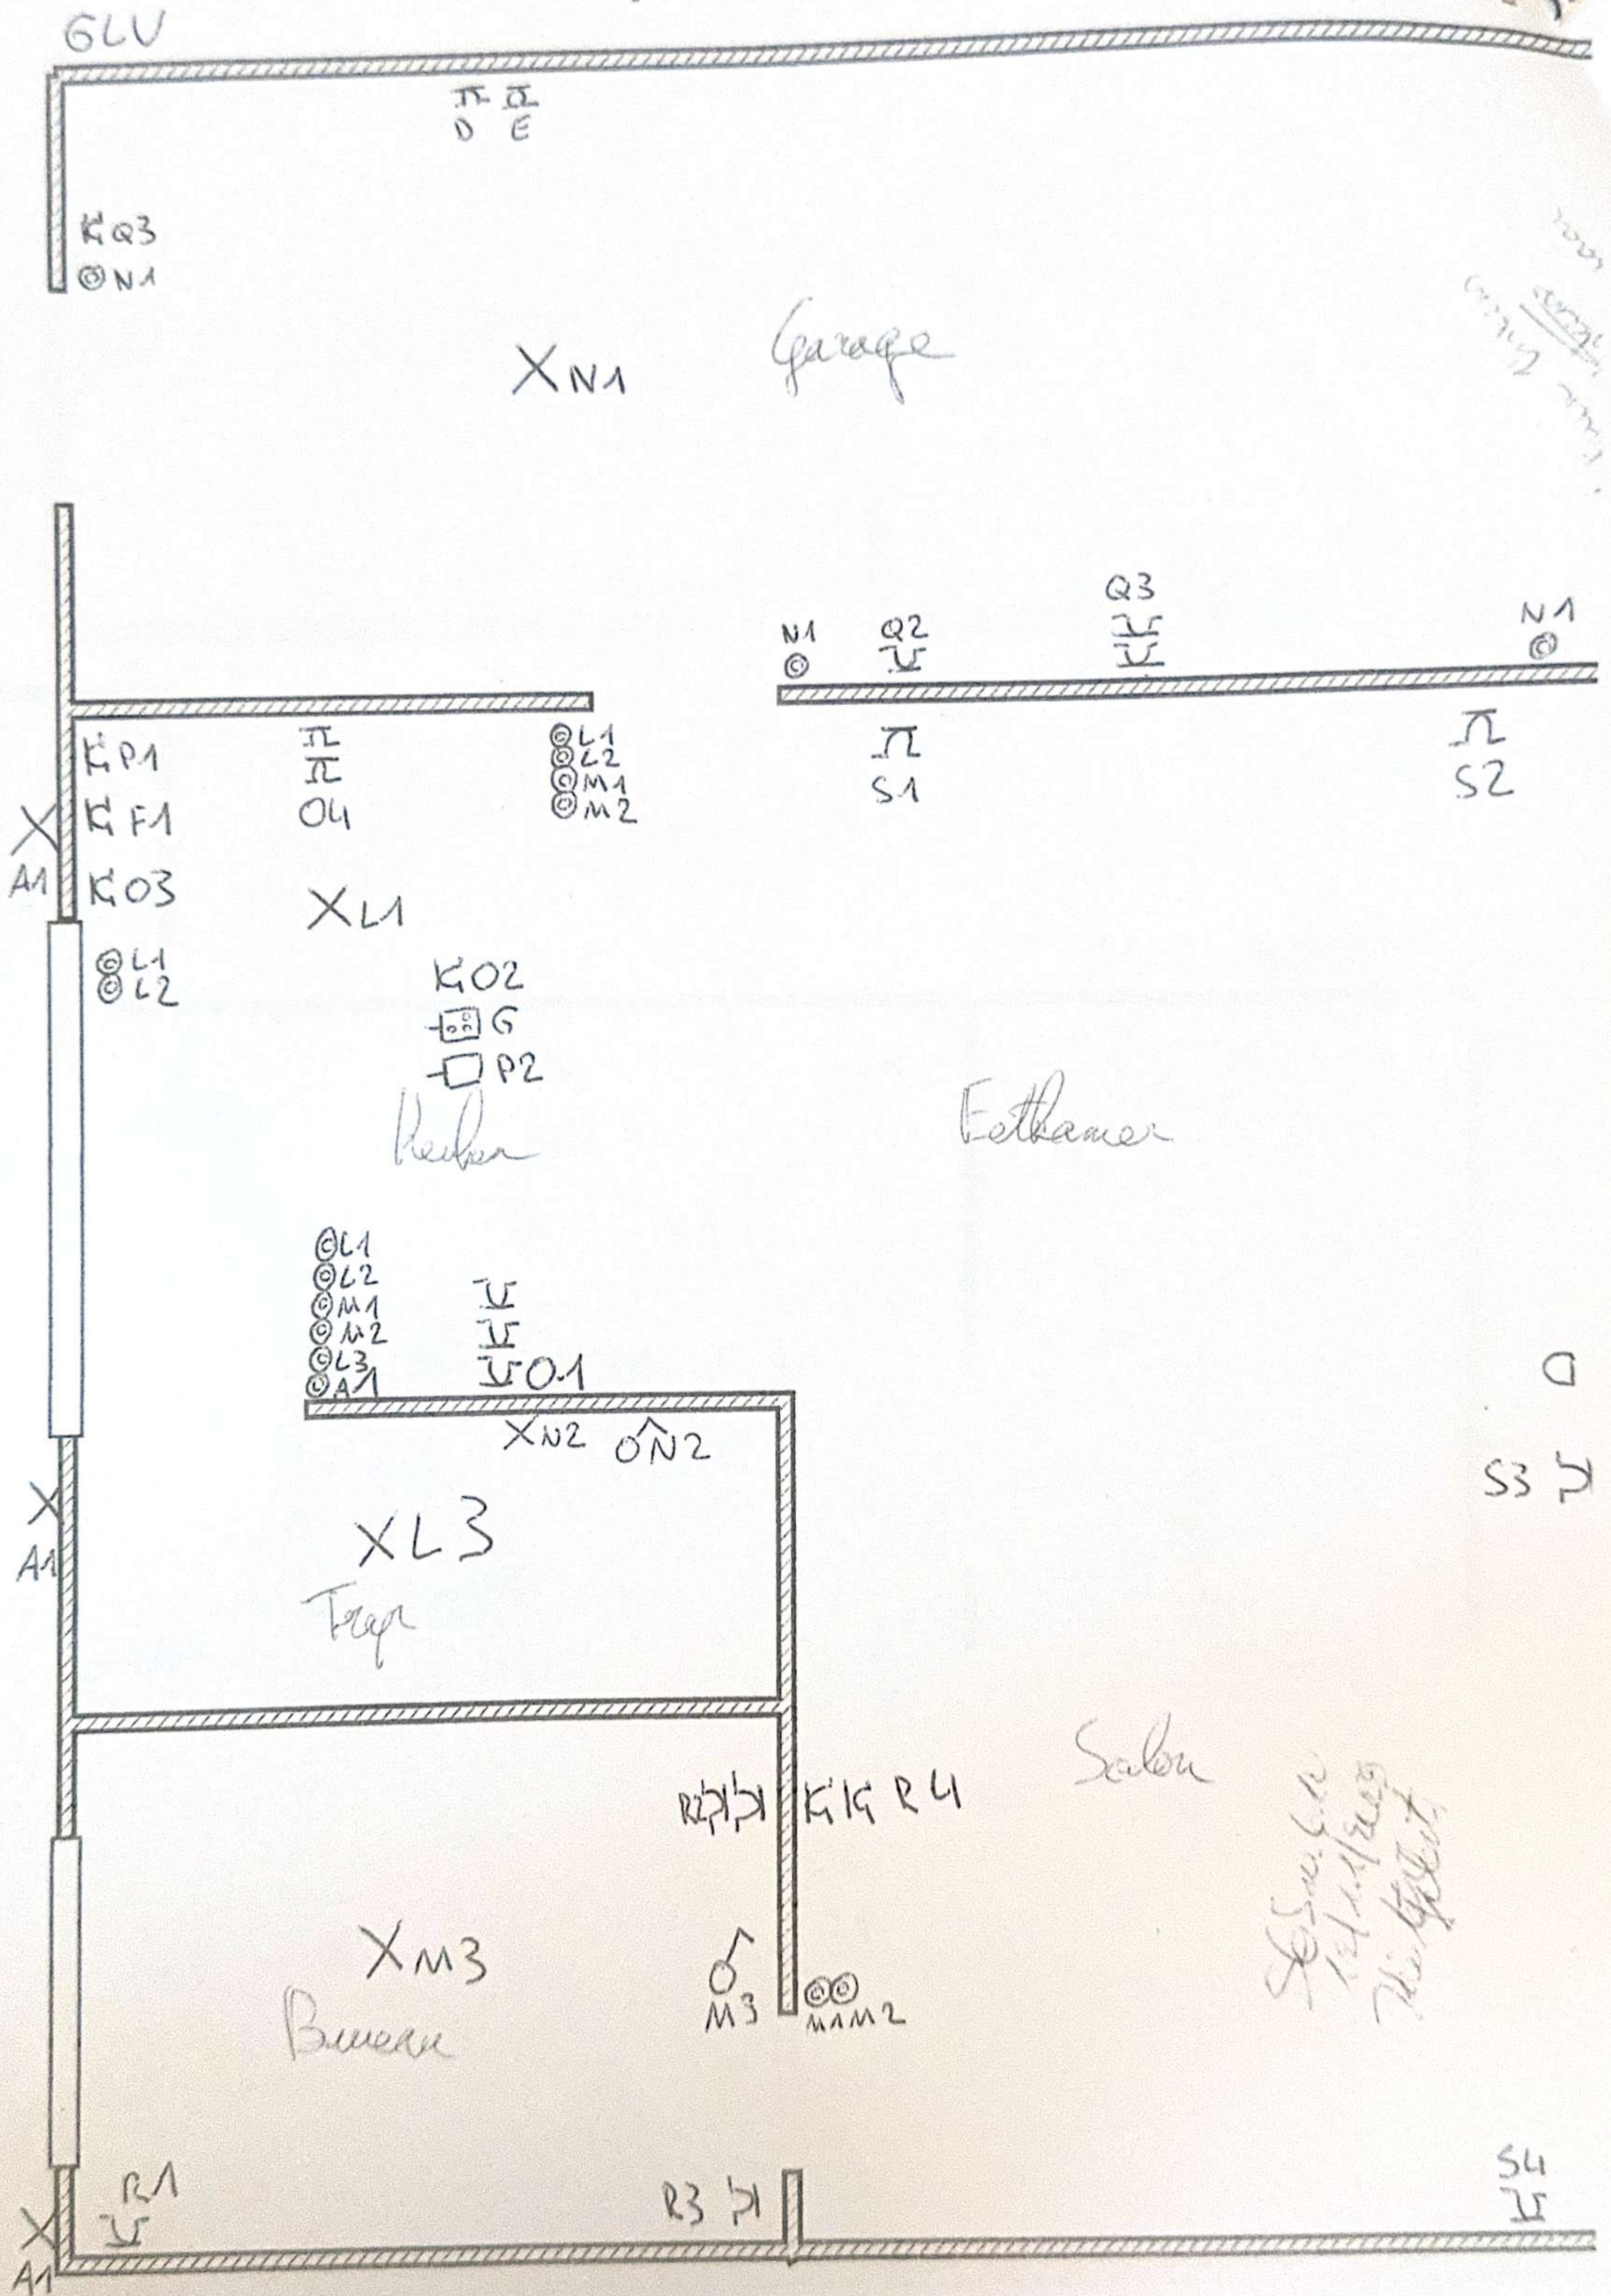

Situatieschema
