

**VINÇOTTE CERTIGO vzw**

Erkend controleorganisme

Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0821.076.888 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE19 0016 0117 0512 • BIC: GEBABEBB

Bollebergen 2a bus 12 • 9052 Gent • België • tel: +32 9 244 77 11 • gent@vincotte.be

Contactpersoon:

- Onze gegevens
Verslag nr.: GEN / 19 / 70123053 / 00 / NL / 000
Klantref.: BTOCGEN
Contractref.:

- Uw gegevens
Ref.: /

Van Der Weeën Rudy

 Stationsstraat, 1
 9470 Denderleeuw
 België

- Interventiegegevens
Plaats: Stationsstraat 1, 9470 Denderleeuw
Datum: 04/09/2018
Uitgevoerd door: AV3679 - MAGERMAN SAMUEL

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

INSTALLATIE
 Naam: Van Der Weeën Voornaam: Rudy
 Adres: Stationsstraat, 1 bus 2.1 Post nr.: 9470 Stad: Denderleeuw
 Tel:

- **Eigenaar of beheerder**
idem
- **Plaats type**
Wooneenheid

BASIS VAN HET ONDERZOEK

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
- Art 271: periodiek / controle / verkoop 2de bezoek
- Art 86
- Art 271 bis

BESLUIT

- De bestaande installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
- De differentieelstroominrichting was verzegeld.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor 04/09/2043 door hetzelfde erkend organisme. (*)

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

 Ing. J. Windey
 Directeur Generaal



INHOUD VAN HET ONDERZOEK

- Visuele controles

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking.
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.
- Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel.
- Vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's.
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders.

- Metingen - testen

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: 1.1 Ohm.
- Algemeen isolatieniveau: 10 MOhm.
- Werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting.
- Foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom.

ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Gegevens van de verdeler

EAN:	EAN niet meegedeeld
kWh meter nr.:	12691958
Bescherming aansluiting:	40 A

- Gegevens van de installatie

Installatie ontworpen voor een nominale spanning van:	230 V
Maximale nominale stroom:	40 A
Voedingsleiding hoofdbord - type:	xvb
Voedingsleiding hoofdbord - sectie:	10 mm ²
Type aardelektrode:	aardingslus

- Beschrijving van de installatie

Algemene differentieelstroominrichting:	40A/300
Aantal borden:	2

INBREUKEN - OPMERKINGEN

- Nieuwe installatie

R-O-F	Nihil
-------	-------

- Bestaande installatie

R-O-F	Nihil
-------	-------

ANDERE BIJLAGE(N)

Nihil

15001

ORIGINEEL

SPANNING: 2 X 230V

*Opion elektriciteit
Bijhouden !!!*

A	Verlichting	H	Kookplaat
B	Stopcont. SI1 +SI 2	I	Frigo - Microgolf
C	Stopcont. Living	J	Oven
D	Stopcont. Keuken	K	Differentieel 30mA
E	Badkamer	L	Differentieel 300mA
F	Verwarming	M	
G	Wasmachine	N	

*Differentieel 300mA staat in de kelder (TR)

Schakelbord Appartement

17A	17A	17A	17A	17A	17A	22A
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

B

C

D

E

F

G

H

30mA 42A	17A	17A	20A
-------------	-----	-----	-----

K

A

I


J

Schakelbord Kelder

300mA
40A

L

Teller

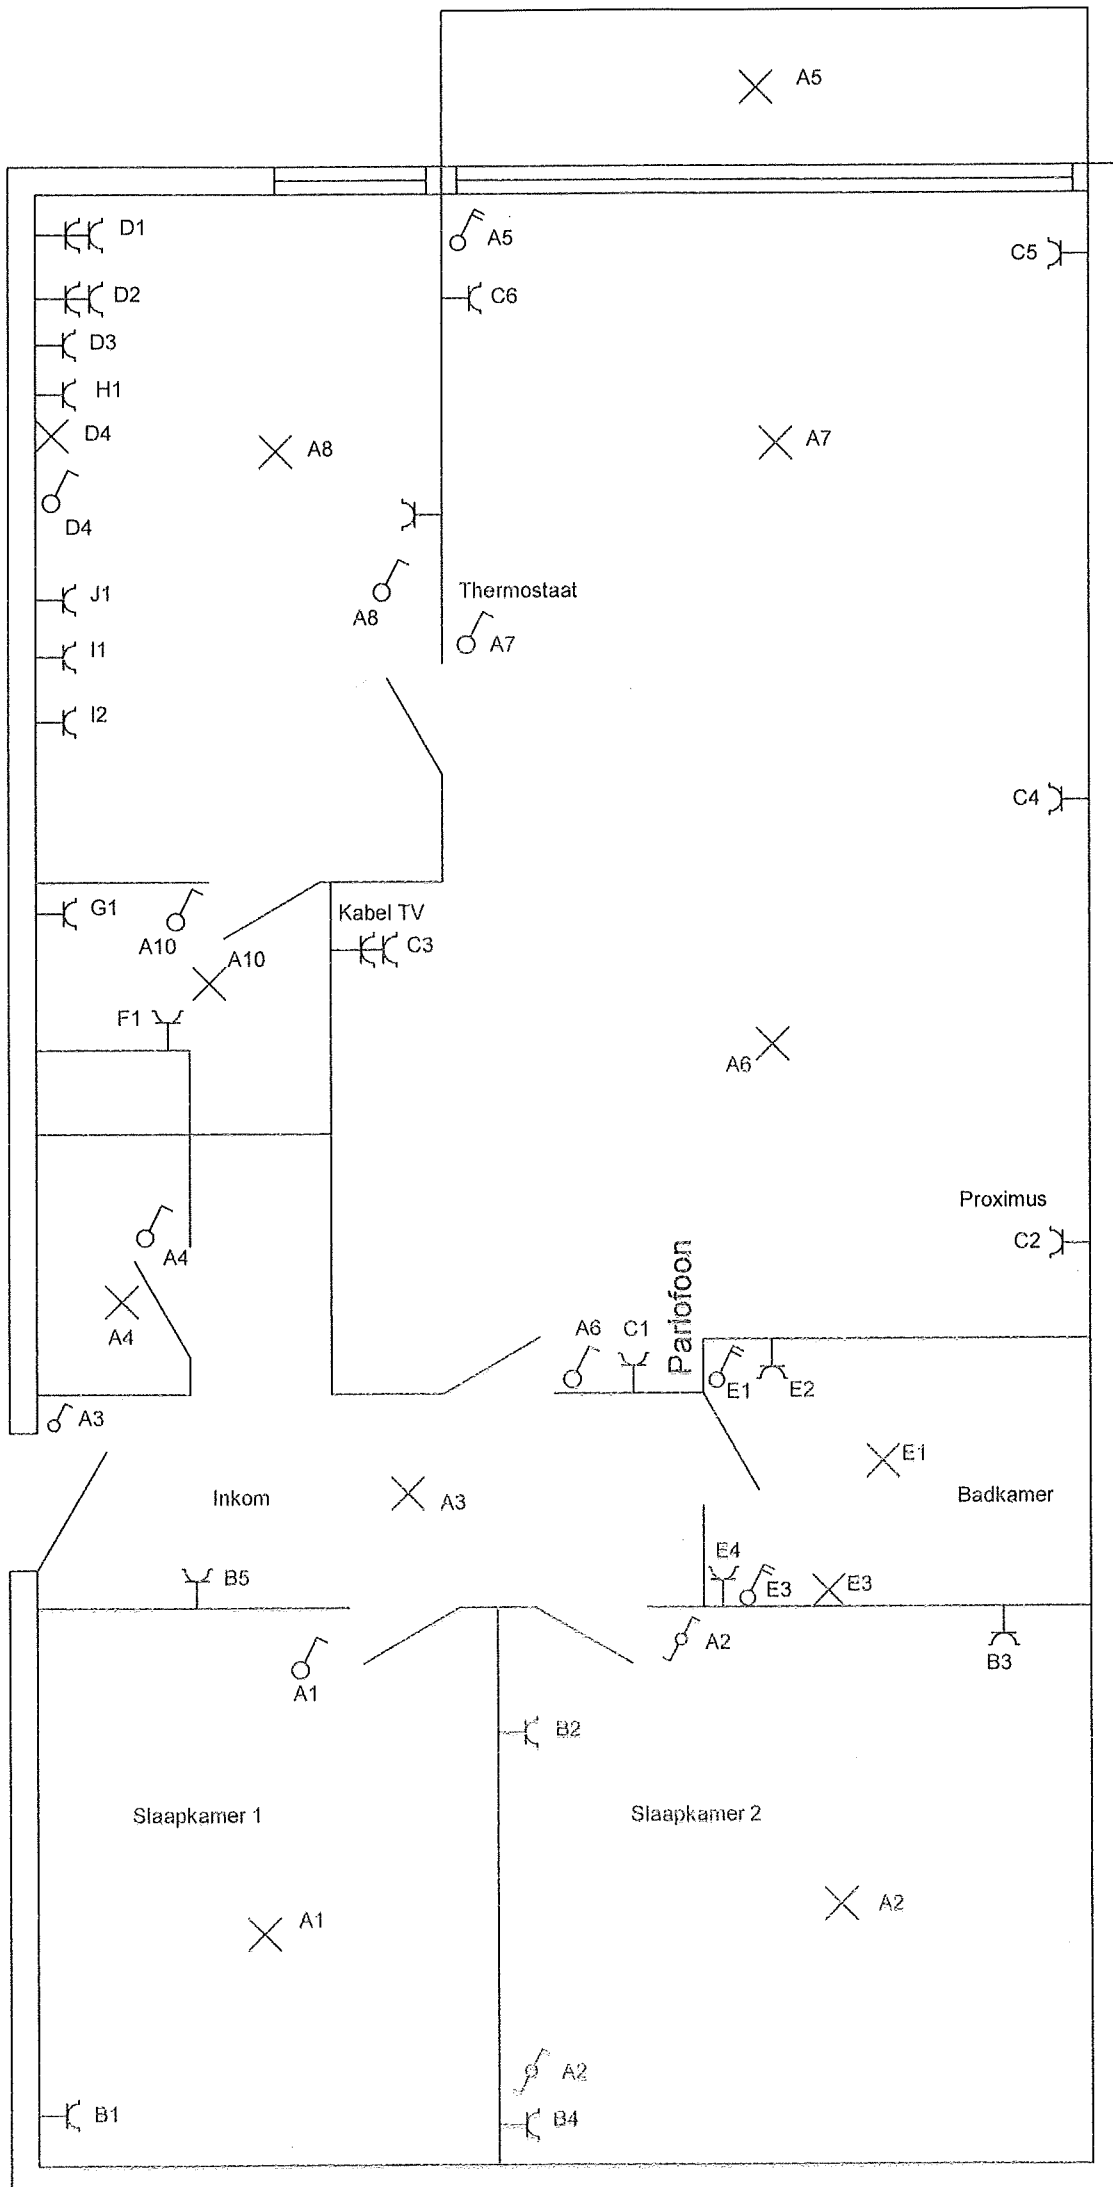

9 Berging

8 Keuken

7 Living

6 Living

5 Balkon

4 WC

3 Inkom

2 slaapkamer 2

1 slaapkamer 1

5 Inkom

4 slpk.2

3 slpk.2

2 slpk.2

1 slpk.1

6 Living

5 Living

4 Living

3 Living

2 Living

1 Living

5 Keuken

4 Keuken

3 Keuken

2 Keuken

1 Keuken

4 Badkamer

3 badkamer-meubel

2 Badkamer

1 Badkamer

Verwarming

Wasmach.

2 Microgolf

1 Frigo

oven

De verantwoordelijke voor
de uitvoering van de werken,
(handtekening)

Naam: Niels Van Der Weeën
Datum:

Erkend keuringsorganisme
(handtekening)

Naam:
Datum:

m o m
VOB2x1.5+1.5

m o m
VOB2x2.5+2.5

m o m
VOB2x2.5+2.5

m o m
VOB2x2.5+2.5

m o m
VOB2x2.5+2.5

m o m
VOB2x2.5+2.5

m o m
VOB2x2.5+2.5

m o m
VOB2x4+4

m o m
VOB2x2.5+2.5

m o m
VOB2x2.5+2.5

10A

17A

17A

17A

17A

17A

17A

22A

20A

20A

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

△ 30mA
(K)

△ 300mA
(L)

Technische Ruimte
Kelder

Netspanning:
2 X 230V

VVB 4X10mm²



KWH

VVB 4X10mm²
