



PROCES-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITE – Installation domestique
Installations électriques à basse tension et à très basse tension
(Livre 1 – AR 8/09/2019) – Direction générale de l'Energie

VERSLAG VAN CONFORMITEITONDERZOEK – huishoudelijke installatie
Elektrische installaties op laag en zeer laagspanning
(Boek 1 – KB 8/09/2019) – Algemene directie voor Energie

Page 1 sur 22

Rapport n° / Verslag nr : AVA20251222-01-A

Date d'émission / Redactiedatum : 23/12/2025

Apave Belgium a.s.b.l. / v.z.w.

Entreprise 0871.547.374
Chaussée de Namur, 61
1400 Nivelles
Tél : +32(0)67/79.44.80
Fax : +32(0)67/79.44.84
E-mail : apave.be@apave.com

Apave Belgium a.s.b.l. est accrédité par
BELAC sous le numéro de certificat 305-INSP

Donneur d'ordre / Opdrachtgever :

(personne physique / natuurlijke persoon)
Nora Huybrechts
Av. Jan Olieslagers 1, 1150 Bruxelles
0479255536
Non assujetti
danielemarci@domoticconcept.be

Assurance qualité Apave / Apave qualiteitsverzekering :

Agent-visiteur / Agent-bezoeker : Axel Vanden
Bulcke

N° mission / Ordernummer : 213029

N° bon de commande / Bestelbon n° : Appel

Date(s) de visite / Datum(s) van bezoek : 22/12/2025

Procédure interne utilisée / Gebruikte interne procedure :

BEL 21.4 - Domestique visite de contrôle / periodieke huishoudelijke inspectie

Re-contrôle / Hercontrole : non / nee

Conclusion du contrôle / Conclusie van de controle :

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique. Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation « étaient (ou) ont été » scellées. / De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie "werden (of) waren" verzegeld.

Prochain contrôle prévu / Volgende inspectie gepland : Avant 25 ans à compter de la date de visite / Vóór 25 jaar na datum van bezoek

L'agent-visiteur, pp du dirigeant technique / De agent-bezoeker, in opdracht van de directeur

Le donneur d'ordre, pour accord / De aanvrager, voor akkoord



PROCES-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITE – Installation domestique
Installations électriques à basse tension et à très basse tension
(Livre 1 – AR 8/09/2019) – Direction générale de l'Energie

VERSLAG VAN CONFORMITEITONDERZOEK – huishoudelijke installatie
Elektrische installaties op laag en zeer laagspanning
(Boek 1 – KB 8/09/2019) – Algemene directie voor Energie

Page **2** sur **22**

Rapport n° / Verslag nr : AVA20251222-01-A

Date d'émission / Redactiedatum : 23/12/2025

Axel Vanden Bulcke



PROCES-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITE – Installation domestique
Installations électriques à basse tension et à très basse tension
(Livre 1 – AR 8/09/2019) – Direction générale de l'Energie

VERSLAG VAN CONFORMITEITONDERZOEK – huishoudelijke installatie
Elektrische installaties op laag en zeer laagspanning
(Boek 1 – KB 8/09/2019) – Algemene directie voor Energie

Page **3** sur **22**

Rapport n° / Verslag nr : AVA20251222-01-A

Date d'émission / Redactiedatum : 23/12/2025

Ce rapport concerne l'installation électrique suivante / Betreft de hieronder installatie :

Propriétaire, exploitant ou gestionnaire / Eigenaar, uitbater of beheerder :	Nom / Naam	Nora Huybrechts
Identification de l'installation électrique / Identificatie van de elektrische installatie :	Adresse / Adres	Av. Jan Olieslagers 1, 1150 Bruxelles
	N°appartement ou étage / Flat nr. of verdieping	5
	G.R.D. / D.N.B.	Sibelga
	Code EAN / EAN Code	Non communiqué
	Numéro du compteur principal / Nr hoofdteller	12678800
	Numéro du compteur nuit / Nr teller nacht	sans objet / niet toepasbaar
	Cabine H.T. privée / Private HS cabine	Non / Neen
	Type d'installation / Type installatie	unité d'habitation / wooneenheid



PROCES-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITE – Installation domestique
Installations électriques à basse tension et à très basse tension
(Livre 1 – AR 8/09/2019) – Direction générale de l'Energie

VERSLAG VAN CONFORMITEITONDERZOEK – huishoudelijke installatie
Elektrische installaties op laag en zeer laagspanning
(Boek 1 – KB 8/09/2019) – Algemene directie voor Energie

Page 4 sur 22

Rapport n° / Verslag nr : AVA20251222-01-A

Date d'émission / Redactiedatum : 23/12/2025

Le contrôle suivant a été réalisé / De volgende controle werd uitgevoerd :

Type de contrôle domestique / Type huishoudelijke contrôle :	Visite de contrôle §6.5 / Controlebezoek (6.5.)
Date de réalisation de l'installation / Data van de uitvoering van de installatie :	entre le 01/10/1981 et le 01/06/2020 / tussen 01/10/1981 en 01/06/2020
Concerne / Betreft :	Le contrôle porte uniquement sur les parties visibles et facilement accessibles selon ce qui a été défini avec le donneur d'ordre / De inspectie heeft alleen betrekking op zichtbare en gemakkelijk toegankelijke onderdelen, zoals bepaald met de klant
Déroptions prises en compte / Gebruikte vrijstellingen :	Application des dérogations de la partie 8 du livre 1 - AR 8/9/2019 / toepassing van de afwijkingen deel 8 boek 1 - KB 8/9/2019
Autres références légales / Andere wettelijke referenties :	Néant / Geen

Données de l'installation électrique / Gegevens van de elektrische installatie :

Description de l'installation électrique / Beschrijving van de elektrische installatie :	Voir plan (ou croquis pour les anciennes installations) en annexes
Tension et nature du courant / Spanning en aard van de stroom :	2x230V / 1N400V
Type d'électrode de terre / Type van de aardelektrode :	(conducteur enfoui horizontalement verticalement ou obliquement / horizontaal verticaal of schuin in de grond), boucle de terre / aardingslus
Canalisation d'alimentation / Voedingsleiding :	XVB 10 mm ²
Nombre de circuits contrôlés / Aantal gecontroleerde stroombanen	9
Type de schéma de mise à la terre / Aardverbindingssysteem :	TT
Nombre de tableaux vus / Aantal gezien schakelborden :	1
Valeur nominale de la protection de branchement / Nominale waarde van de bescherming van de aansluiting :	Illisible A
Type de coupure générale / Type van de algemene schakelaar :	disjoncteur / automaat

Dispositif(s) à courant différentiel installé(s) / Geplaatste differentieelstroominrichting(en) :

I _n	IΔn	Type	Circuits / Elektrische circuits
----------------	-----	------	---------------------------------

**PROCES-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITE – Installation domestique***Installations électriques à basse tension et à très basse tension
(Livre 1 – AR 8/09/2019) – Direction générale de l'Energie*

Page 5 sur 22

VERSLAG VAN CONFORMITEITONDERZOEK – huishoudelijke installatie*Elektrische installaties op laag en zeer laagspanning
(Boek 1 – KB 8/09/2019) – Algemene directie voor Energie***Rapport n° / Verslag nr : AVA20251222-01-A****Date d'émission / Redactiedatum : 23/12/2025**

40 A	300 mA	A	Général
40 A	30 mA	A	C-->I



PROCES-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITE – Installation domestique
Installations électriques à basse tension et à très basse tension
(Livre 1 – AR 8/09/2019) – Direction générale de l'Energie

VERSLAG VAN CONFORMITEITONDERZOEK – huishoudelijke installatie
Elektrische installaties op laag en zeer laagspanning
(Boek 1 – KB 8/09/2019) – Algemene directie voor Energie

Page 6 sur 22

Rapport n° / Verslag nr : AVA20251222-01-A

Date d'émission / Redactiedatum : 23/12/2025

Photovoltaïque / Fotovoltaïsch :

**Description des installations photovoltaïques /
Beschrijving van de fotovoltaïsche installaties**

nb. Panneaux :
P Wc panneaux :
nb. Onduleurs :
type et n° série onduleurs :
Pc cumulée onduleurs :
n° série compt. Verts :
index compteurs verts :
marquage MID :

Dossier de l'installation électrique / Bestand van elektrische installatie :

**Schémas et plans de l'installation / Schema's en
plannen van de installatie :**

Disponibles / Beschikbaar (voir annexes / zie bijlagen)

**Document des influences externes / Document
met uitwendige invloeden :**

pas de description présente (ok) / geen beschrijving aanwezig (ok)

**Document des installations de sécurité /
Document van de veiligheidsinstallaties :**

néant / geen

**Document des installations critiques / Document
van de kritische installaties :**

néant / geen

Autres documents / Andere documenten :

néant / geen

Rapport n° / Verslag nr : AVA20251222-01-A

Date d'émission / Redactiedatum : 23/12/2025

Résultats du contrôle / Resultaten van de controle

Mesure de la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre / Spreidingsweerstand van de aardverbinding :	18.47 Ohm
Mesure de la valeur du niveau d'isolement général / Waarde van de algemene isolatieweerstand :	61.7 MOhm
Essai des dispositifs à courant différentiel, par action sur le bouton test / Test van de differentieelstroominrichtingen (testknop):	Vérifié / Gecontroleerd
Essai des dispositifs à courant différentiel, par création d'une boucle de défaut / Test van de differentieelstroominrichtingen (test foutlus):	Réalisé / Uitgevoerd
Essai de continuité des conducteurs de protection / Continuïteit van de beschermingsgeleiders :	Vérifié / Gecontroleerd
Adéquation entre les dispositifs de protection a courant différentiel résiduel installes et la valeur de la resistance de dispersion de la prise de terre / Keuze van de differentieelschakelaars ivm spreidingsweerstand van de aarde	Vérifié / Gecontroleerd
Adéquation entre les dispositifs de protection contre les surintensités installés et les sections des circuits respectifs qu'ils protègent / Overeenstemming tussen de overstroombeveiliging en de doorsnede van de beschermde stroombaan	Vérifié / Gecontroleerd
Exécution de l'installation électrique conformément aux schémas unifilaires et plans de position / Voer de elektrische installatie uit volgens de eenlijnschema's en positietekeningen	Vérifié / Gecontroleerd
Contrôle du matériel fixe ou installé à poste fixe / Elektrisch materieel (vast, vast opgesteld en verplaatsbaar / borden, toestellen, machines en elektrische leidingen)	Vérifié / Gecontroleerd
Le dispositif de protection à courant différentiel résiduel à l'origine de l'installation / Vergrenzeling van de hoofd differentieelschakelaar	était scellé / was verzegeld



PROCES-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITE – Installation domestique
Installations électriques à basse tension et à très basse tension
(Livre 1 – AR 8/09/2019) – Direction générale de l'Energie

VERSLAG VAN CONFORMITEITONDERZOEK – huishoudelijke installatie
Elektrische installaties op laag en zeer laagspanning
(Boek 1 – KB 8/09/2019) – Algemene directie voor Energie

Page **8** sur **22**

Rapport n° / Verslag nr : AVA20251222-01-A

Date d'émission / Redactiedatum : 23/12/2025

Infractions constatées / Geziene inbreuken :

Remarques / Opmerkingen :

Néant / geen

Observations / Observaties :

Néant / geen

Rapport n° / Verslag nr : AVA20251222-01-A

Date d'émission / Redactiedatum : 23/12/2025

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Les résultats s'appliquent uniquement aux travaux spécialisés dans la demande. La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
- L'inspecteur est autorisé à signer ce rapport en l'absence du dirigeant technique et est conscient qu'il engage la responsabilité de l'organisme Apave Belgique
- Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.

1. Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant de l'installation électrique est tenu :

- a) d'en assurer ou d'en faire assurer l'entretien ;
- b) de prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique soient en tout temps observés ;
- c) de conserver les documents de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire ;
- d) de transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant ;
- e) d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques ;
- f) de renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique ;
- g) de laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité avant la mise en usage sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.

Dans le cas d'un transfert de propriété,

2. Le vendeur est tenu :

- a) de conserver le rapport de la visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique ;
- b) de transmettre le dossier de l'installation électrique à l'acheteur lors du transfert de propriété.

3. L'acheteur est tenu :

- a) de communiquer à l'organisme agréé qui a réalisé la visite de contrôle son identité et la date de l'acte de vente ;
 - b) d'exécuter les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la nouvelle visite de contrôle. Ils doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service de l'installation, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes. Dans le cas où, lors de la visite complémentaire des infractions subsistent ou au cas il n'est pas donné suite à la remise en ordre de l'installation électrique, le Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions en est informée par l'organisme agréé dès le délai d'un an expiré.
- Le vendeur et l'acheteur sont tenus d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.

Dans le cadre des missions légales des organismes agréés, une copie de ce rapport est tenue pendant une période de 5 ans par l'organisme agréé. Cette copie est tenue à la disposition de toute personne autorisée légalement à la consulter. Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (<https://www.economie.fgov.be>) est l'autorité compétente des organismes agréés.

Rapport n° / Verslag nr : AVA20251222-01-A

Date d'émission / Redactiedatum : 23/12/2025

ALGEMENE INLICHTINGEN

- Les résultats s'appliquent uniquement aux travaux spécialisés dans la demande. La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
- L'inspecteur est autorisé à signer ce rapport en l'absence du dirigeant technique et est conscient qu'il engage la responsabilité de l'organisme Apave Belgique
- Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.

1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden :

- a) het onderhoud ervan te verzekeren of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
- c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking het te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het geval van een eigendomsoverdracht,

2. De verkoper is ertoe gehouden :

- a) het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- b) het dossier van de installatie aan de koper bij eigendomsoverdracht te overhandigen;

3. De koper is ertoe gehouden :

- a) zijn identiteit en de datum van de verkoopakte mee te delen aan het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd;
 - b) de werken, nodig om de tijdens het nieuwe controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, uit te voeren. Ze worden zonder vertraging uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen. Indien tijdens het aanvullende controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht. De verkoper en de koper zijn ertoe gehouden, onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.
- In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt gesteld ter beschikking van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen


**PROCES-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITE – Installation domestique***Installations électriques à basse tension et à très basse tension
(Livre 1 – AR 8/09/2019) – Direction générale de l'Energie***VERSLAG VAN CONFORMITEITONDERZOEK – huishoudelijke installatie***Elektrische installaties op laag en zeer laagspanning
(Boek 1 – KB 8/09/2019) – Algemene directie voor Energie*Page **11** sur **22****Rapport n° / Verslag nr : AVA20251222-01-A****Date d'émission / Redactiedatum : 23/12/2025****ANNEXES / BIJLAGEN :****Pièce(s) jointe(s) / Bijlagen :**

Aucune / geen

Rapport n° / Verslag nr : AVA20251222-01-A

Date d'émission / Redactiedatum : 23/12/2025

Photo(s) des tableaux et/ou infractions / Foto's borden en/of inbreuken :

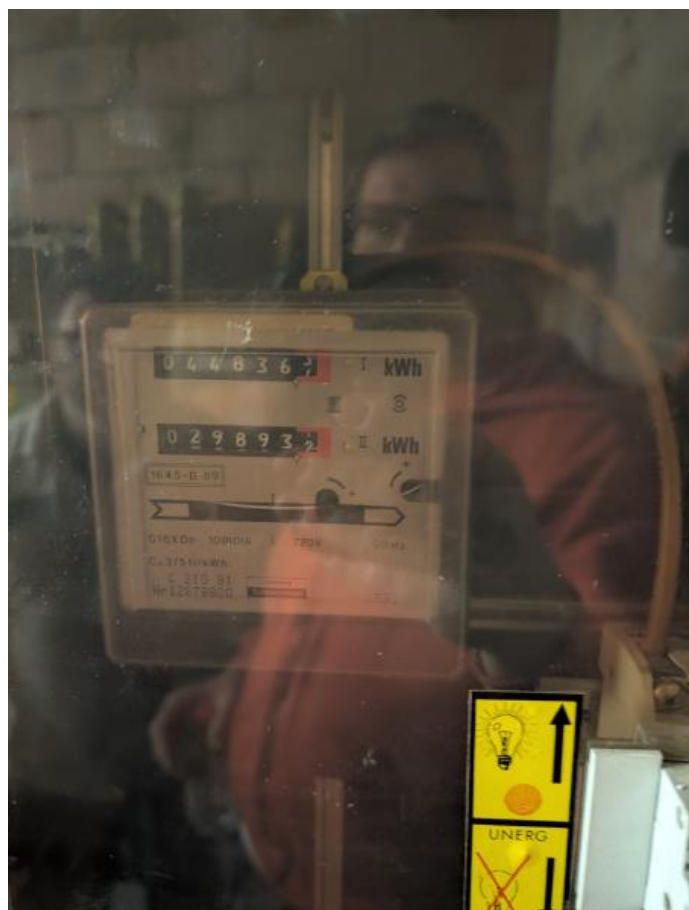

c67360f1069881pu622785_20251223074806_767.jpg

Rapport n° / Verslag nr : AVA20251222-01-A


Date d'émission / Redactiedatum : 23/12/2025



[c67360f1069881pu622785_20251223074806_769.jpg](#)

Rapport n° / Verslag nr : AVA20251222-01-A

Date d'émission / Redactiedatum : 23/12/2025

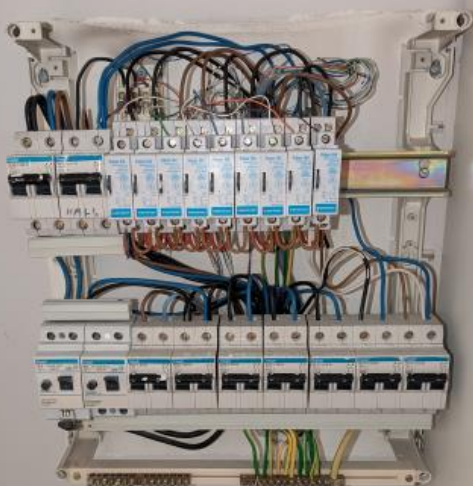

[c67360f1069881pu622785_20251223074806_771.jpg](#)

Rapport n° / Verslag nr : AVA20251222-01-A


Date d'émission / Redactiedatum : 23/12/2025



[c67360f1069881pu622785_20251223074806_773.jpg](#)

Rapport n° / Verslag nr : AVA20251222-01-A

Date d'émission / Redactiedatum : 23/12/2025

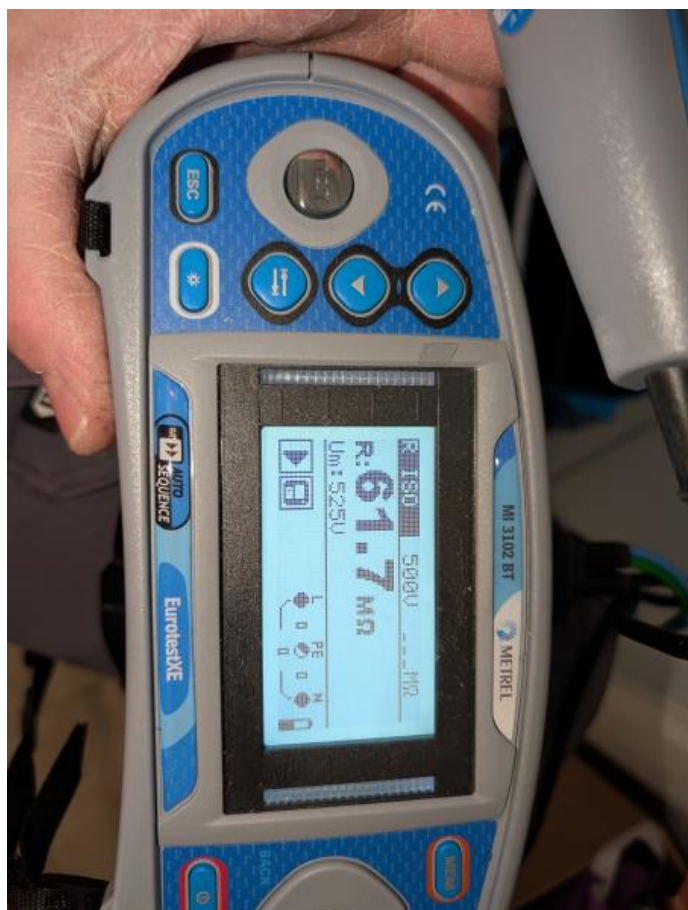

[c67360f1069881pu622785_20251223074806_775.jpg](#)




PROCES-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITE – Installation domestique
Installations électriques à basse tension et à très basse tension
(Livre 1 – AR 8/09/2019) – Direction générale de l'Energie

Page 17 sur 22

VERSLAG VAN CONFORMITEITONDERZOEK – huishoudelijke installatie
Elektrische installaties op laag en zeer laagspanning
(Boek 1 – KB 8/09/2019) – Algemene directie voor Energie

Rapport n° / Verslag nr : AVA20251222-01-A

Date d'émission / Redactiedatum : 23/12/2025

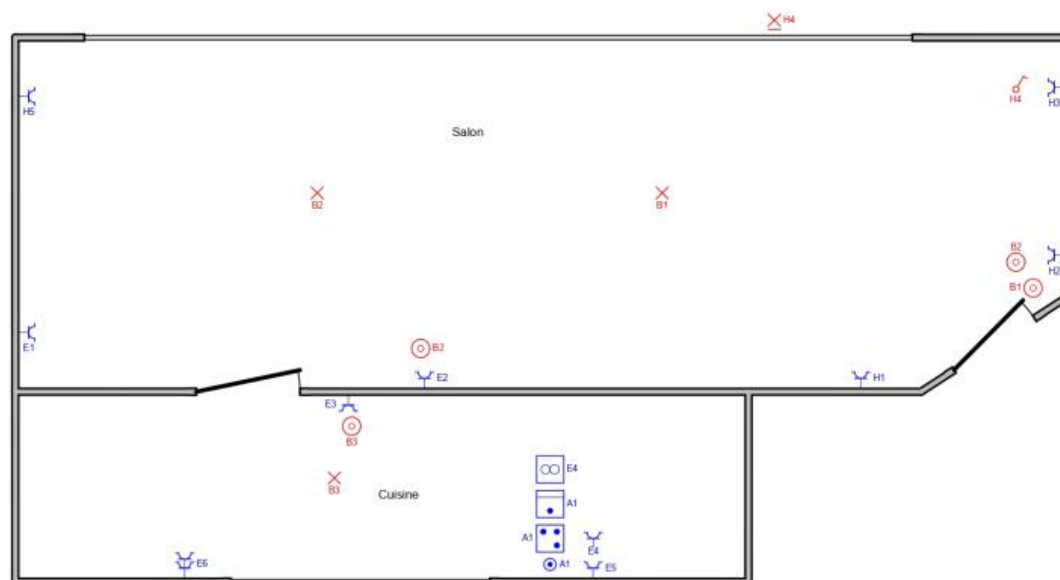

Organisme agréé
Apave Belgium
Chaussée de Namur 61
1400 Nivelles
Tél.: 067 79 44 80
e-mail: apave.be@apave.com



Adresse de l'installation électrique
Nora Huybrechts
Av. Jan Otieslagers 1 Boite 5 éme
1150 Bruxelles

[Signature]

Installateur

p. 2/5
Plan de position
2 x 230V – 50Hz
V.2025-12-23 07:38:26

Schéma dessiné par: Ets Deserio srl - TVA BE 0836.921.542

c67360f1069881pu622785_20251223074937_777.jpg




PROCES-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITE – Installation domestique
Installations électriques à basse tension et à très basse tension
(Livre 1 – AR 8/09/2019) – Direction générale de l'Energie

Page 18 sur 22

VERSLAG VAN CONFORMITEITONDERZOEK – huishoudelijke installatie
Elektrische installaties op laag en zeer laagspanning
(Boek 1 – KB 8/09/2019) – Algemene directie voor Energie

Rapport n° / Verslag nr : AVA20251222-01-A

Date d'émission / Redactedatum : 23/12/2025

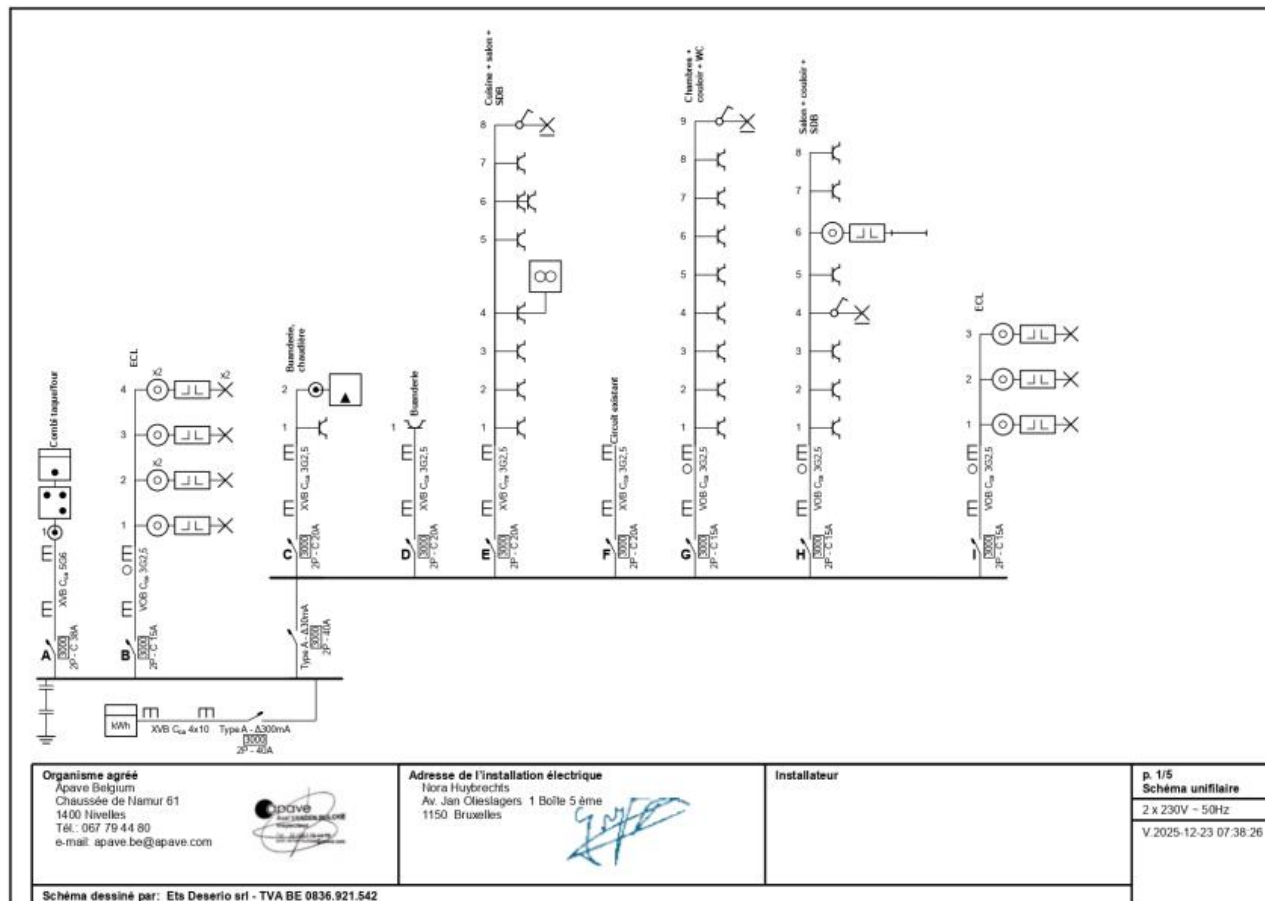

Organisme agréé
Apave Belgium
Chaussée de Namur 61
1400 Nivelles
Tél: 067 79 44 80
e-mail: apave.be@apave.com



Adresse de l'installation électrique
Nora Huybrechts
Av. Jan Oliebagers 1 Boite 5^{ème}
1150 Bruxelles

Signature of the installer

Installateur

p. 1/5
Schéma unifilaire
2 x 230V – 50Hz
V.2025-12-23 07:38:26

Schéma dessiné par: Ets Deserio srl - TVA BE 0836.921.542

c67360f1069881pu622785_20251223074937_779.jpg




PROCES-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITE – Installation domestique
Installations électriques à basse tension et à très basse tension
(Livre 1 – AR 8/09/2019) – Direction générale de l'Energie

Page 19 sur 22

VERSLAG VAN CONFORMITEITONDERZOEK – huishoudelijke installatie
Elektrische installaties op laag en zeer laagspanning
(Boek 1 – KB 8/09/2019) – Algemene directie voor Energie

Rapport n° / Verslag nr : AVA20251222-01-A

Date d'émission / Redactiedatum : 23/12/2025

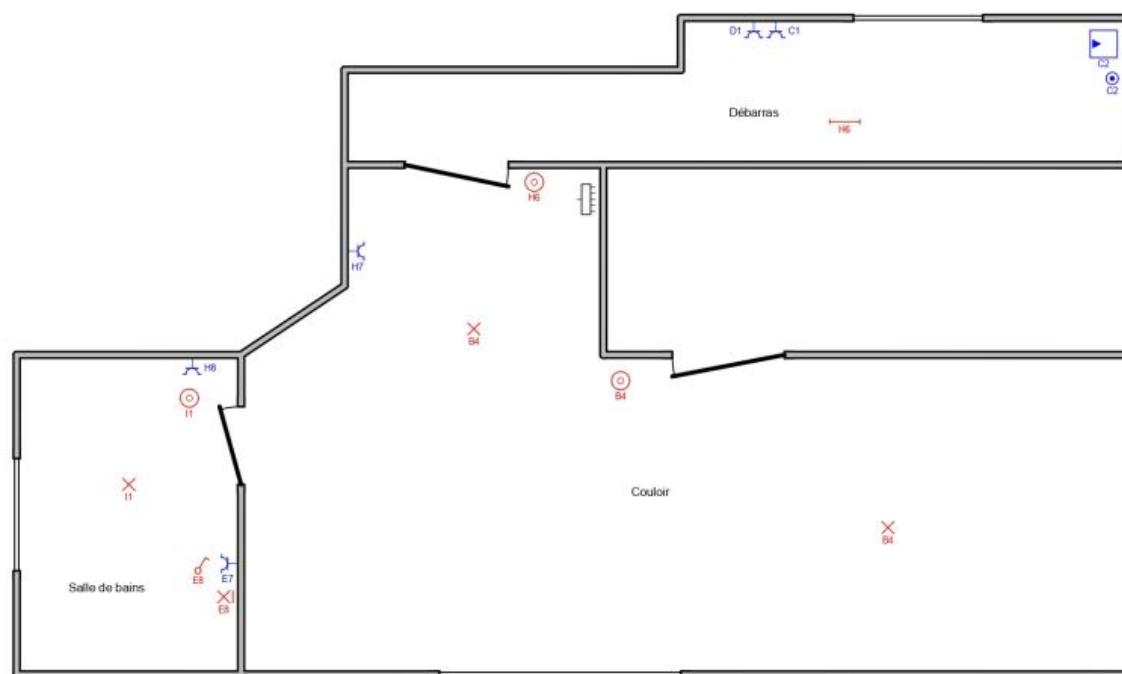

Organisme agréé
Apave Belgium
Chaussée de Namur 61
1400 Nivelles
Tél.: 067 79 44 80
e-mail: apave.be@apave.com



Adresse de l'installation électrique
Nora Huybrechts
Av. Jan Olieslagers 1 Boite 5 ème
1150 Bruxelles

[Signature]

Installateur

p. 3/5
Plan de position
2 x 230V – 50Hz
V.2025-12-23 07:38:26

Schéma dessiné par: Ets Deserio srl - TVA BE 0836.921.542

c67360f1069881pu622785_20251223074937_781.jpg




PROCES-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITE – Installation domestique
Installations électriques à basse tension et à très basse tension
(Livre 1 – AR 8/09/2019) – Direction générale de l'Energie

Page 20 sur 22

VERSLAG VAN CONFORMITEITONDERZOEK – huishoudelijke installatie
Elektrische installaties op laag en zeer laagspanning
(Boek 1 – KB 8/09/2019) – Algemene directie voor Energie

Rapport n° / Verslag nr : AVA20251222-01-A

Date d'émission / Redactiedatum : 23/12/2025

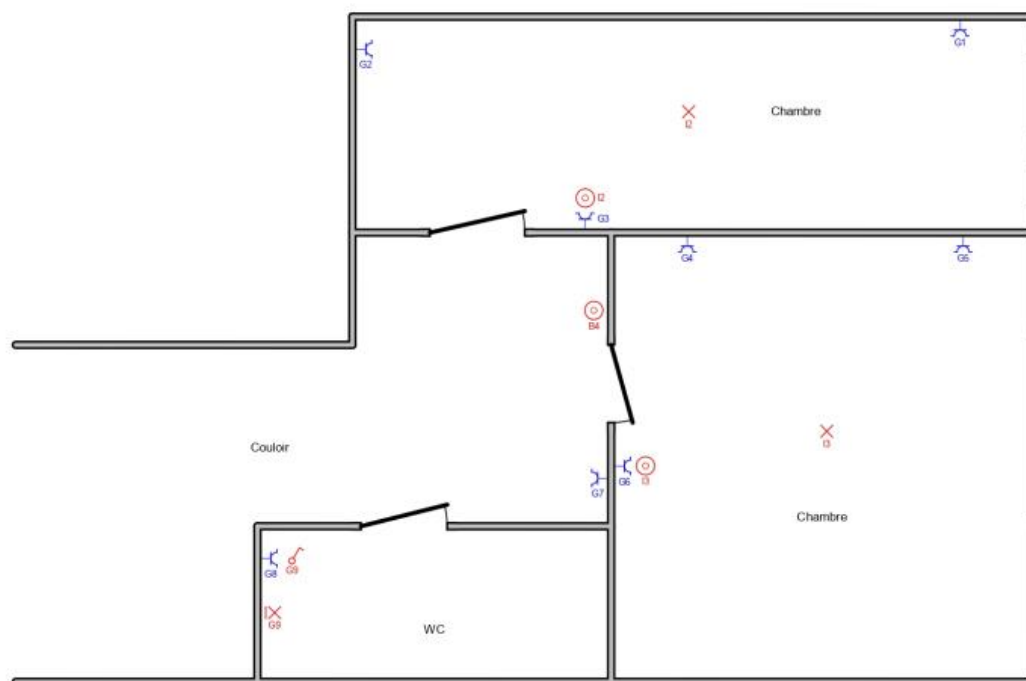

Organisme agréé
Apave Belgium
Chaussée de Namur 61
1400 Nivelles
Tél.: 067 79 44 80
e-mail: apave.be@apave.com



Adresse de l'installation électrique
Nora Huybrechts
Av. Jan Olieslagers 1 Boite 5 éme
1150 Bruxelles

[Signature]

Installateur

p. 4/5
Plan de position
2 x 230V – 50Hz
V.2025-12-23 07:38:26

Schéma dessiné par: Ets Deserio srl - TVA BE 0836.921.542

c67360f1069881pu622785_20251223074937_783.jpg



PROCES-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITE – Installation domestique
Installations électriques à basse tension et à très basse tension
(Livre 1 – AR 8/09/2019) – Direction générale de l'Energie

VERSLAG VAN CONFORMITEITONDERZOEK – huishoudelijke installatie
Elektrische installaties op laag en zeer laagspanning
(Boek 1 – KB 8/09/2019) – Algemene directie voor Energie

Page 21 sur 22

Rapport n° / Verslag nr : AVA20251222-01-A

Date d'émission / Redactiedatum : 23/12/2025

- A Combi taquefour
- B ECL
- C Buanderie, chaudière
- D Buanderie
- E Cuisine + salon + SDB
- F Circuit existant
- G Chambres + couloir + WC
- H Salon + couloir + SDB
- I ECL

Organisme agréé
Apave Belgium
Chaussée de Namur 61
1400 Nivelles
Tél.: 067 79 44 80
e-mail: apave.be@apave.com



Adresse de l'installation électrique
Nora Huybrechts
Av. Jan Olieslagers 1 Boite 5 ème
1150 Bruxelles

Installateur

p. 5/5
Liste des circuits

2 x 230V – 50Hz
V.2025-12-23 07:38:26

Schéma dessiné par: Ets Deserio srl - TVA BE 0836.921.542

[c67360f1069881pu622785_20251223074937_785.jpg](#)

	PROCES-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITE – Installation domestique <i>Installations électriques à basse tension et à très basse tension</i> (Livre 1 – AR 8/09/2019) – Direction générale de l'Energie VERSLAG VAN CONFORMITEITONDERZOEK – huishoudelijke installatie <i>Elektrische installaties op laag en zeer laagspanning</i> (Boek 1 – KB 8/09/2019) – Algemene directie voor Energie	Page 22 sur 22
Rapport n° / Verslag nr : AVA20251222-01-A	Date d'émission / Redactedatum : 23/12/2025	

Fin du rapport / Einde van dit rapport
