

Bruxelles : 126, b°12 – Avenue des Croix de Guerre – 1120 Buxelles
 Mons : Parc Initialis – 2 – Avenue Descartes – 7000 Mons
 Liège : 61/63 – Rue Grand-Vinave – 4101 Jemeppe

Tel : 02/245.46.95
 Tel : 065/32.15.51
 Tel : 04/234.17.00

Fax : 02/215.12.78
 Fax : 065/32.15.77
 Fax : 04/234.17.80

Compte Bancaire : 340-0298168-28 T.V.A. BE 406.671.312

- CONFIDENTIEL -**PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BT ET TBT**

(Contrôle effectué selon la procédure interne PRO-INS-E-01).

Rapport N° : 2206092702 Personne responsable de l'exécution du travail :
 Date du Contrôle : 27/09/2006 Nom-Prénom : STEINMETZ
 Propriétaire Nom-Prénom : STEINMETZ Christian N°TVA/N°C.Ident. :
 Adresse : Avenue des Merles 15 Adresse de l'installation : Rue des Atrebatés 137
1150 BXL (3^e étage) 1150 BXL

TYPE DE CONTROLE :

- ☒ A) Examen de conformité d'une installation électrique BT et TBT domestique effectué sur base des prescriptions du RGIE :
☒ Contrôle avant mise sous tension - ☐ Contrôle d'une installation existante avant remise en service.
☒ B) Examen de contrôle d'une installation électrique BT et TBT domestique en vue d'un renforcement de puissance de raccordement au réseau public de distribution, effectué sur base des prescriptions du RGIE.

TYPE D'INSTALLATION :

☒ Unité d'habitation ☐ Parties communes ☐ Autres soumise à : ☒ l'Art.86 ☐ l'Art.87 du RGIE.
 Distributeur : SIBELGA Raccordement suivant câblage tableau : Tension : 230 V.
 Alimentation tableau principal : 2 X 20 mm². Protection raccordement : 40 A. (☒ In max. à prévoir)
 Colonne d'alimentation : 2 X 20 mm². Interr-Sect.Général : 40 A.
 Nombre de tableaux : 2 Nombre de circuits terminaux : 6 R_E = 24 Ω R_{GEN} = 200 MΩ.
 Type prise de terre : ☐ boucle ☒ piquets -

Différentiels	I _n en A	I _{cc} en kA	I _Δ en A	Circuits protégés	I _n en A	I _{cc} en kA	I _Δ en A	Circuits protégés	I _n en A	I _{cc} en kA	I _Δ en A	Circuits protégés
	<u>60</u>	<u>3</u>	<u>0,3</u>	<u>Tous</u>	<u>40</u>	<u>3</u>	<u>0,03</u>	<u>6</u>				

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION :

Circuits	Protections	Sections	Circuits	Protections	Sections
<u>Voir Schémas</u>					

MANQUEMENTS (INFRACTIONS / REMARQUES) :

rien

NOTES :

- Le différentiel général : ☐ était plombé ☐ n'a pu être plombé ☒ a été plombé ☐ n'est pas plombable ☐ absence de différentiel
 - Les schémas ☒ ont été signés ☐ n'ont pas été signés ☐ absence de schémas

CONCLUSION :

- ☒ - L'installation est conforme. La prochaine visite est à prévoir avant le : 27/09/2007
☒ - L'installation n'est pas conforme. Les travaux nécessaires pour faire disparaître les manquements (i/r) constatés doivent être exécutés sans retard, et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.
☒ - Dans le délai d'un an à dater de ce jour, en cas de refus d'une seconde visite ou au cas où des infractions subsisteraient, une copie du procès verbal sera envoyée conformément à l'Art. 276.02 du RGIE à l'Administration de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.
☒ - Les résultats du contrôle ne permettent pas de déclarer l'installation conforme. Un examen supplémentaire est à exécuter par le même organisme avant la (re) mise en usage de l'installation.


Inspecteur (Nom+signature)

Pour CIB-asbl

C.I.B. - CONTROLE AGREE**JEAN PAISANTZIS**

Le demandeur (Nom+signature)

[Signature]

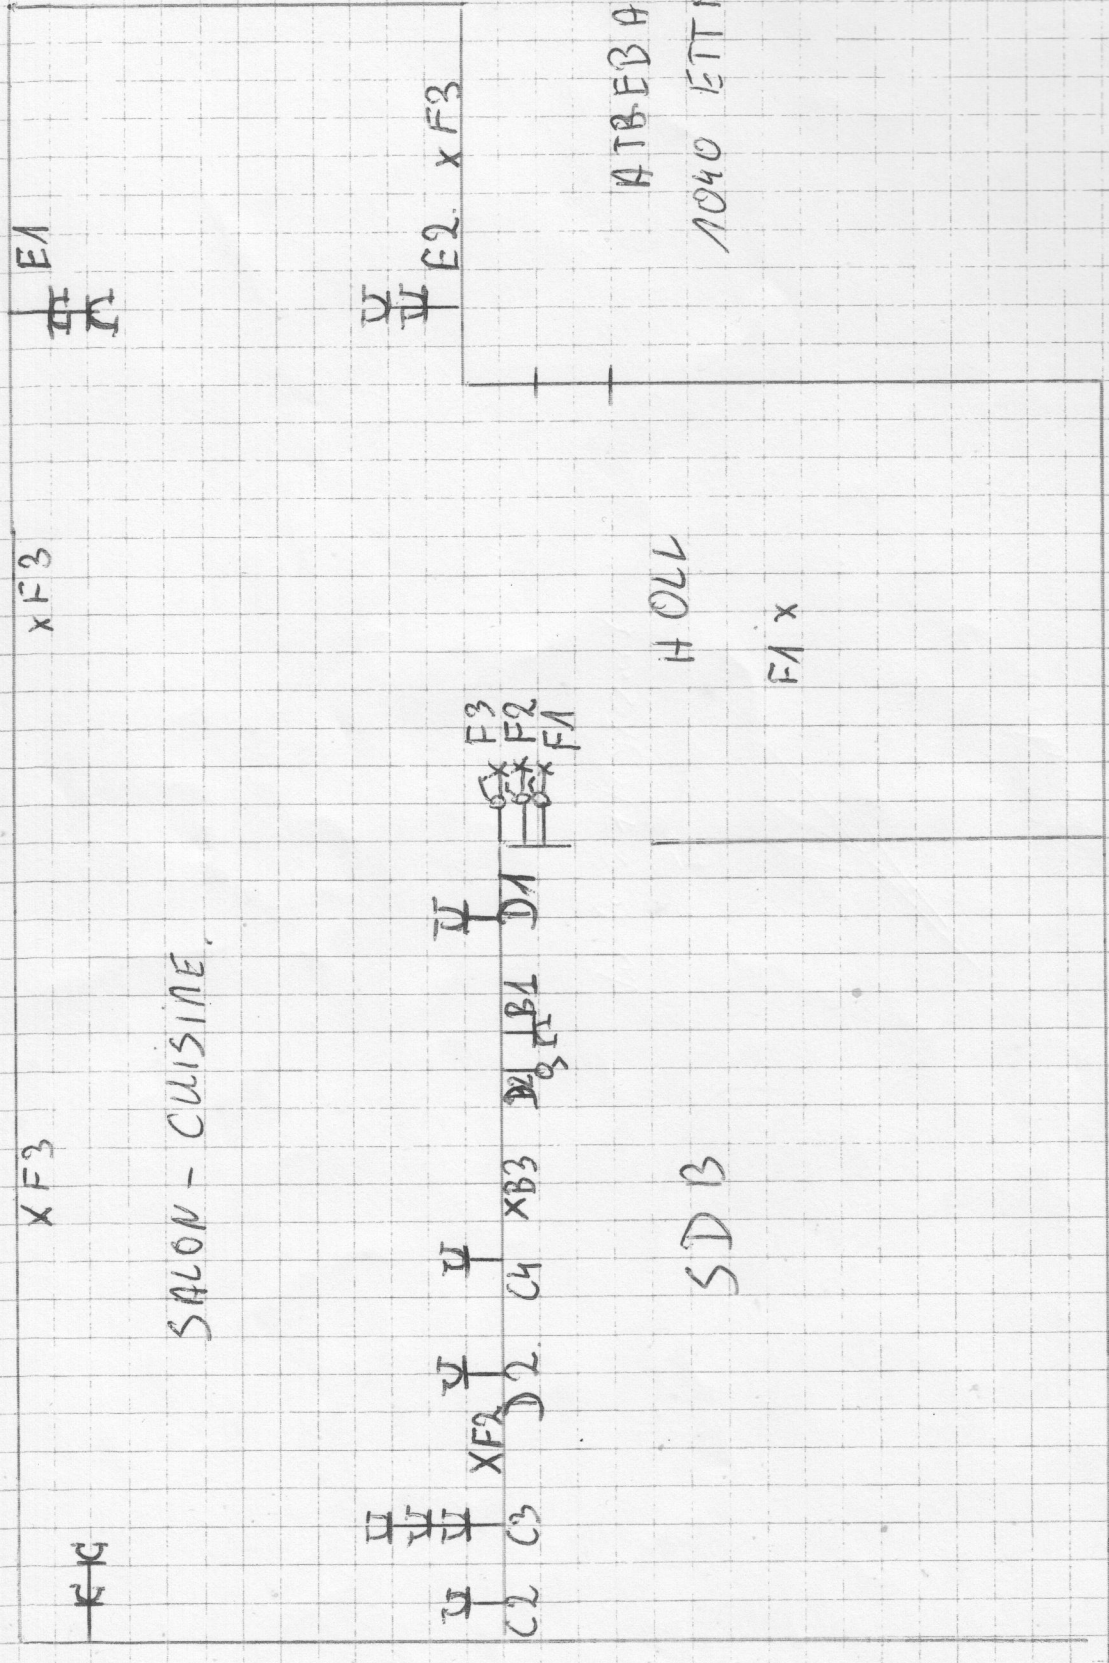

du 27/09/2006

C.I.B. - CONTROLE AGREE

JEAN PATSANIZIS

3^e stage

ATREBATES 187


1040 ETTERBEEK

Chaudière

Verd 27/09/2006

C. I. B. - CONTROL AGREE

JEAN PATSANTZIS

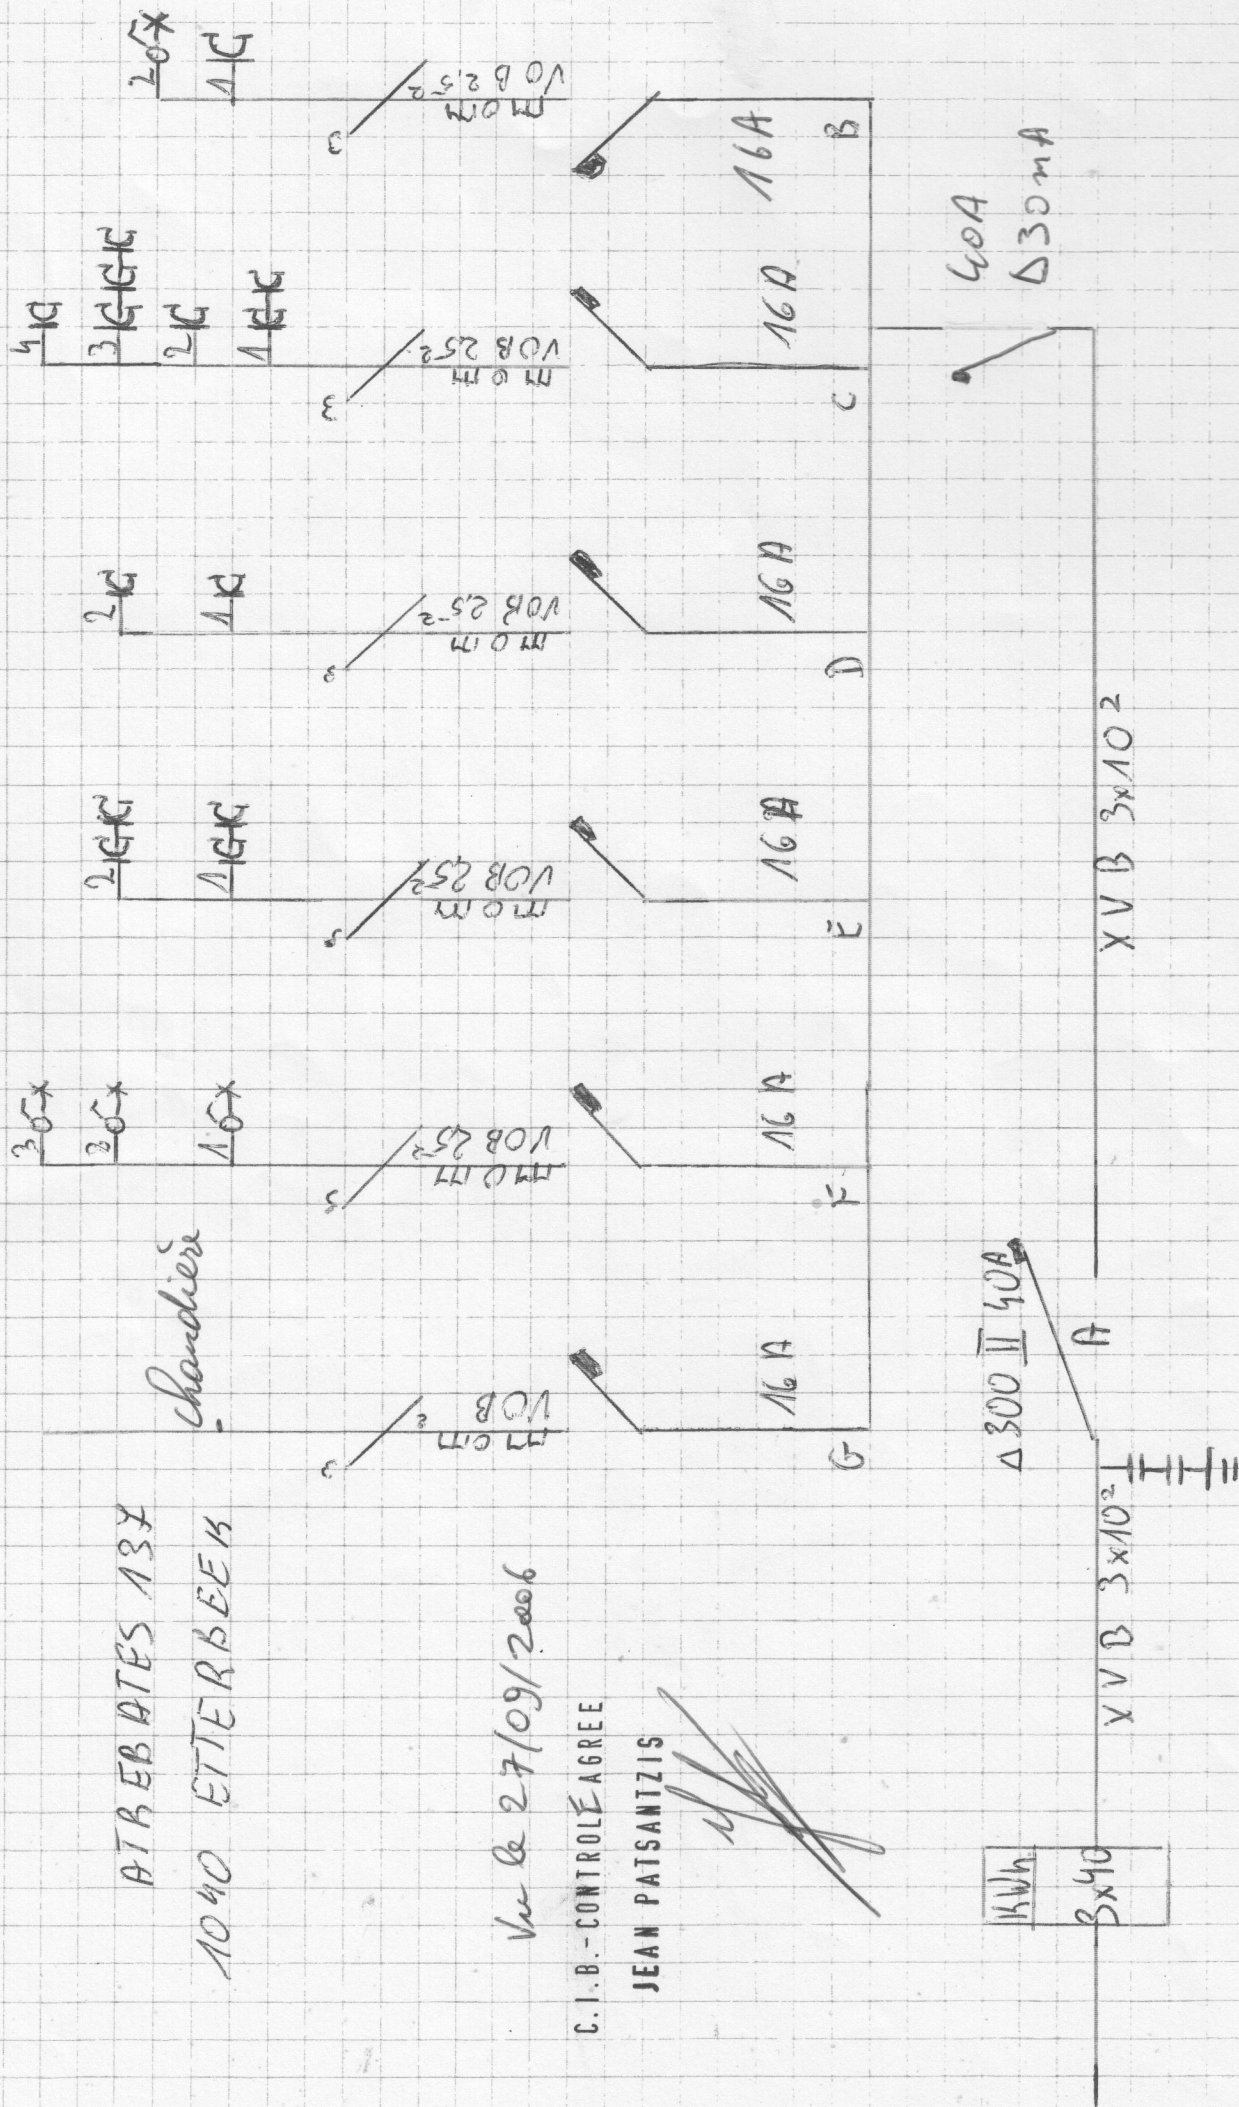

Verlust

24.16



Cuisine.

cu Ø 22. m²

ATBATES 132

AD40 Ettevöck

3^e etage.
