

PANELEN GROEP 1	
Merk	Phone Solar
Type	Mono
Aant. strings	1
Aant./string	11
P _{piek} / stuk	415 W
Totaal P _{piek}	4,57 Kwp

Solar kabel

6 mm²

Batterijen	
Merk	GROWATT
Type	ARK
Capaciteit	5
SN: ARJ2000022440030	
QQK20000222000DL	

125A 2P

Batterijkabel

25mm²

OMVORMER 1	
Merk	GROWATT
Type	MIN 4200 TL-XH
Max Pac	4,20 Kva
Serienr	KKK0BK402V

XVB 3g2,5


GROENESTROOMTELLER	
Serienr	

AUTOMAAT
20 A

10 mm



BESTAANDE INSTALLATIE



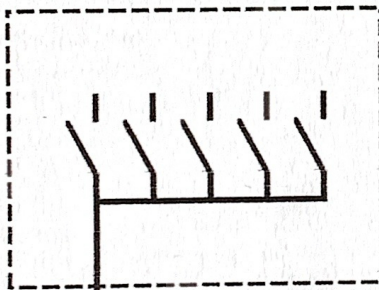


Tussen automaat
40 A

Algemene differentieel
40 A 300 mA

Hoofdautoomaat
40 A

kWh teller
1 x 230V



INSTALLATIEADRES	
Klant	Ankie peeters
Adres	Laaglandlaan 176 2170 Merksem

Gegevens aanmelding EANDIS/INFRAX	
EAN	.541448820046416412
Email	ankiepeeters2@gmail.com
Tel.	.0473806102

Seneca

Verklaring op eer van de installateur in het kader van de aanvraag van een premie voor de installatie van een thuisbatterij vanaf 1 november 2021

In te vullen door de installateur van het batterijsysteem

1 Gegevens van de onderneming van de installateur die de werkzaamheden uitvoerde

naam onderneming Sun4power – La Pensée Sauvage
telefoonnummer of +32498114444
gsmnummer _____
emailadres info@sun4power.be
ondernemingsnummer BE0672370940

2 Gegevens van de persoon waar de werkzaamheden worden uitgevoerd

naam Ankie Peeters
adres Laaglandlaan 176, Antwerpen, België

3 Gegevens van de geplaatste installatie voor opslag van elektriciteit

Merk batterijsysteem Growatt ARK
Bruikbare capaciteit 5
(tot één cijfer na de komma in kWh)

Investeringskost
batterijsysteem
(in euro incl. BTW) 5.481,26

! OPGELET: De investeringskost is het deel van het bedrag op de factuur (incl. btw) dat in aanmerking komt voor de berekening van de premie: de aankoop prijs van de thuisbatterij, de installatie- en plaatsingskosten van de thuisbatterij en de volledige kostprijs van de (hybride) omvormer van de thuisbatterij. Werd de hybride omvormer in het verleden geplaatst (langer dan 9 maanden ten opzichte van de eindfactuur thuisbatterij) dan komt de hybride omvormer niet in aanmerking bij het berekenen van de investeringskost.

Type of technologie batterij

- ☐ Li-ion
☐ Zoutwater
☐ Lood (andere dan lood met watervulmogelijkheid¹)
☐ Nikkel
☒ Andere: specificeer LFP

¹ Een batterij op basis van lood met watervulmogelijkheid komt niet in aanmerking voor een premie

VLAAMS ENERGIE- & KLIMAATAGENTSCHAP

Wijze van aansluiting met PV-installatie

☐ AC

☒ DC

4 Verklaring

Kruis onderstaande verklaring aan².

- ✓ Ik verklaar op eer dat de geplaatste installatie voor opslag van elektriciteit beschikt over een tweerichtingscommunicatie-interface.
- ✓ Ik verklaar op eer dat er een decentrale productie-installatie aanwezig is op het toegangspunt en correct is aangemeld bij Fluvius.
- ✓ Ik verklaar op eer dat er een digitale meter werd geplaatst door de netbeheerder Fluvius.
- ✓ Ik verklaar op eer dat de thuisbatterij correct is aangemeld bij de netbeheerder Fluvius.

5 Ondertekening en datering

Ik bevestig dat alle gegevens op dit attest naar waarheid zijn ingevuld.

datum 29-03-2023

handtekening

voor- en achternaam
installateur Paul De Bruyne & Watze Schilstra

² Meer informatie over de batterijpremie en de opgelegde voorwaarden via <https://www.energiesparen.be/thuisbatterij>

Verslag van onderzoek: controle van een zonnepaneelinstallatie

Datum van bezoek:

29-12-2022

Plaats van onderzoek::

Laaglandlaan 176 - Antwerpen 2170

Inspecteur:

Ertugrul Sener

Keurtype:

De ingebruikname nieuwe
installatie (6.4)

Besluit:

Conform

Verslagnummer:

4.883

Verslag van onderzoek: controle van een zonnepaneelinstallatie

Datum van bezoek:

29-03-2023

Plaats van onderzoek:

Laaglandlaan 176 - Antwerpen 2170

Verslagnummer:

6.634

Inspecteur:

Ertugrul Sener

Keurtype:

De ingebruikname nieuwe
installatie (6.4)

Besluit:

Conform

Meettoestel:

TI-013/5534126
