ACEG asbl
Organisme agrée

Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

BELAC 522-INSP
ISO/IEC 17020

Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

CONFORME

Date inspection: 16/01/2024 **Inspecteur:** Arnaud Cornet **Mentor:** - **Installateur:** RT technics

Étiquette d'identification: **Référence client:**

N° TVA:BE 0754 402 751

Marque et type d'appareil de mesure: Metrel MI 3102 BT

Numéro de serie: 23120921

Date rapport: 16/01/2024

Adresse de l'installation

Rue	Hé du Seigneur
Numéro	39
Boîte	
Postcode	6960
Commune	Dochamps
Pays	Belgique

Propriétaire

Nom	Marco s'Heeren
Rue	Hé du Seigneur
Numéro	39
Boîte	
Postcode	6960
Commune	Dochamps
Pays	Belgique

Installateur

Nom	RT technics
N° TVA	BE 0754 402 751
Numéro de téléphone	0495673944
E-mail	info@rttechnics.be

Type : maison **EAN** : 54 **N° compteur:** : 44 581 418

☑ **Non communiqué**

Image du tableau de repartition et de manoeuvre:

Type de contrôle: Visite de contrôle d'une ancienne installation électrique qui date d'avant 1981 (AR 08/09/2019) - AREI Livre 1 - 8.4.3. et 4.2.4.3. en 8.2.1

Distributeur: ORES Tension: 3N400V Liaison comp / tableau: 6 mm^2 Protection Max: 25 A

Nombres tableaux: 1 Nombre de circuits: 9

Prise de terre: Electrode verticale ou barres de terre enterrée(s)

Ri général: 3,31 MΩ

OK

RE: 82,6 Ω

OK

DISPOSITIF DE PROTECTION À COURANT DIFFÉRENTIEL - RÉSIDUEL

IΔ (mA)	In (A)	In - autres (A)	I²t	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	Tous	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	2	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	2	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	2	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	2	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	1	OK	OK

DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits	Curve	Protection IN (A)	(autres)	P	Section (mm²)
9	C	16		2	2,5

Contrôle visuel (général)	OK	**Contact direct**	OK	**Contact indirect**	OK
Raccordement	OK	**schéma en annexe par Aceg asbl**	NA		
Liaisons équipotentielles	BON	**Section des conducteurs**	OK		
Continuité	OK	**Éclairage / machines**	OK		

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

nota/note 19 Tous les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel ont été testés et sont en ordre.

nota/note 27 Le code EAN de l'installation n'a pas pu nous être communiqué durant notre visite.

nota/note 31 Cette installation date d'avant 1981, il a été tenu compte des dérogations mentionnées à Livre 1 Section 8.2.1.

CONCLUSION

☑ **L'installation électrique est conforme aux prescriptions de l'AR 08/09/2019 - RGIE Livre 1.** La prochaine visite de contrôle est à prévoir avant le 16/1/2049

☑ Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que les bornes d'entrée du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage.

☑ Le(s) schéma(s) unifilaires et le(s) plan(s) de position ont été signés par l'organisme agréé.

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut etre diffusé en copie.

Nombre d'annexe(s):

PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

L'inspecteur Arnaud Cornet

Arnaud Cornet
ACEG VZW- #371

Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au RGIE Livre 1 section 9.1.2.
Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie.

Qualité
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.

Feuille de route pour une installation qui est conforme:			
Etape 1	**Etape 2**	**Etape 3**	**Etape 4**
Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes.	Si vous faites des modifications ou extensions importantes à l'installation, vous devez les faire contrôler.	Le prochain contrôle périodique est prévu pour 16/1/2049	ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires.

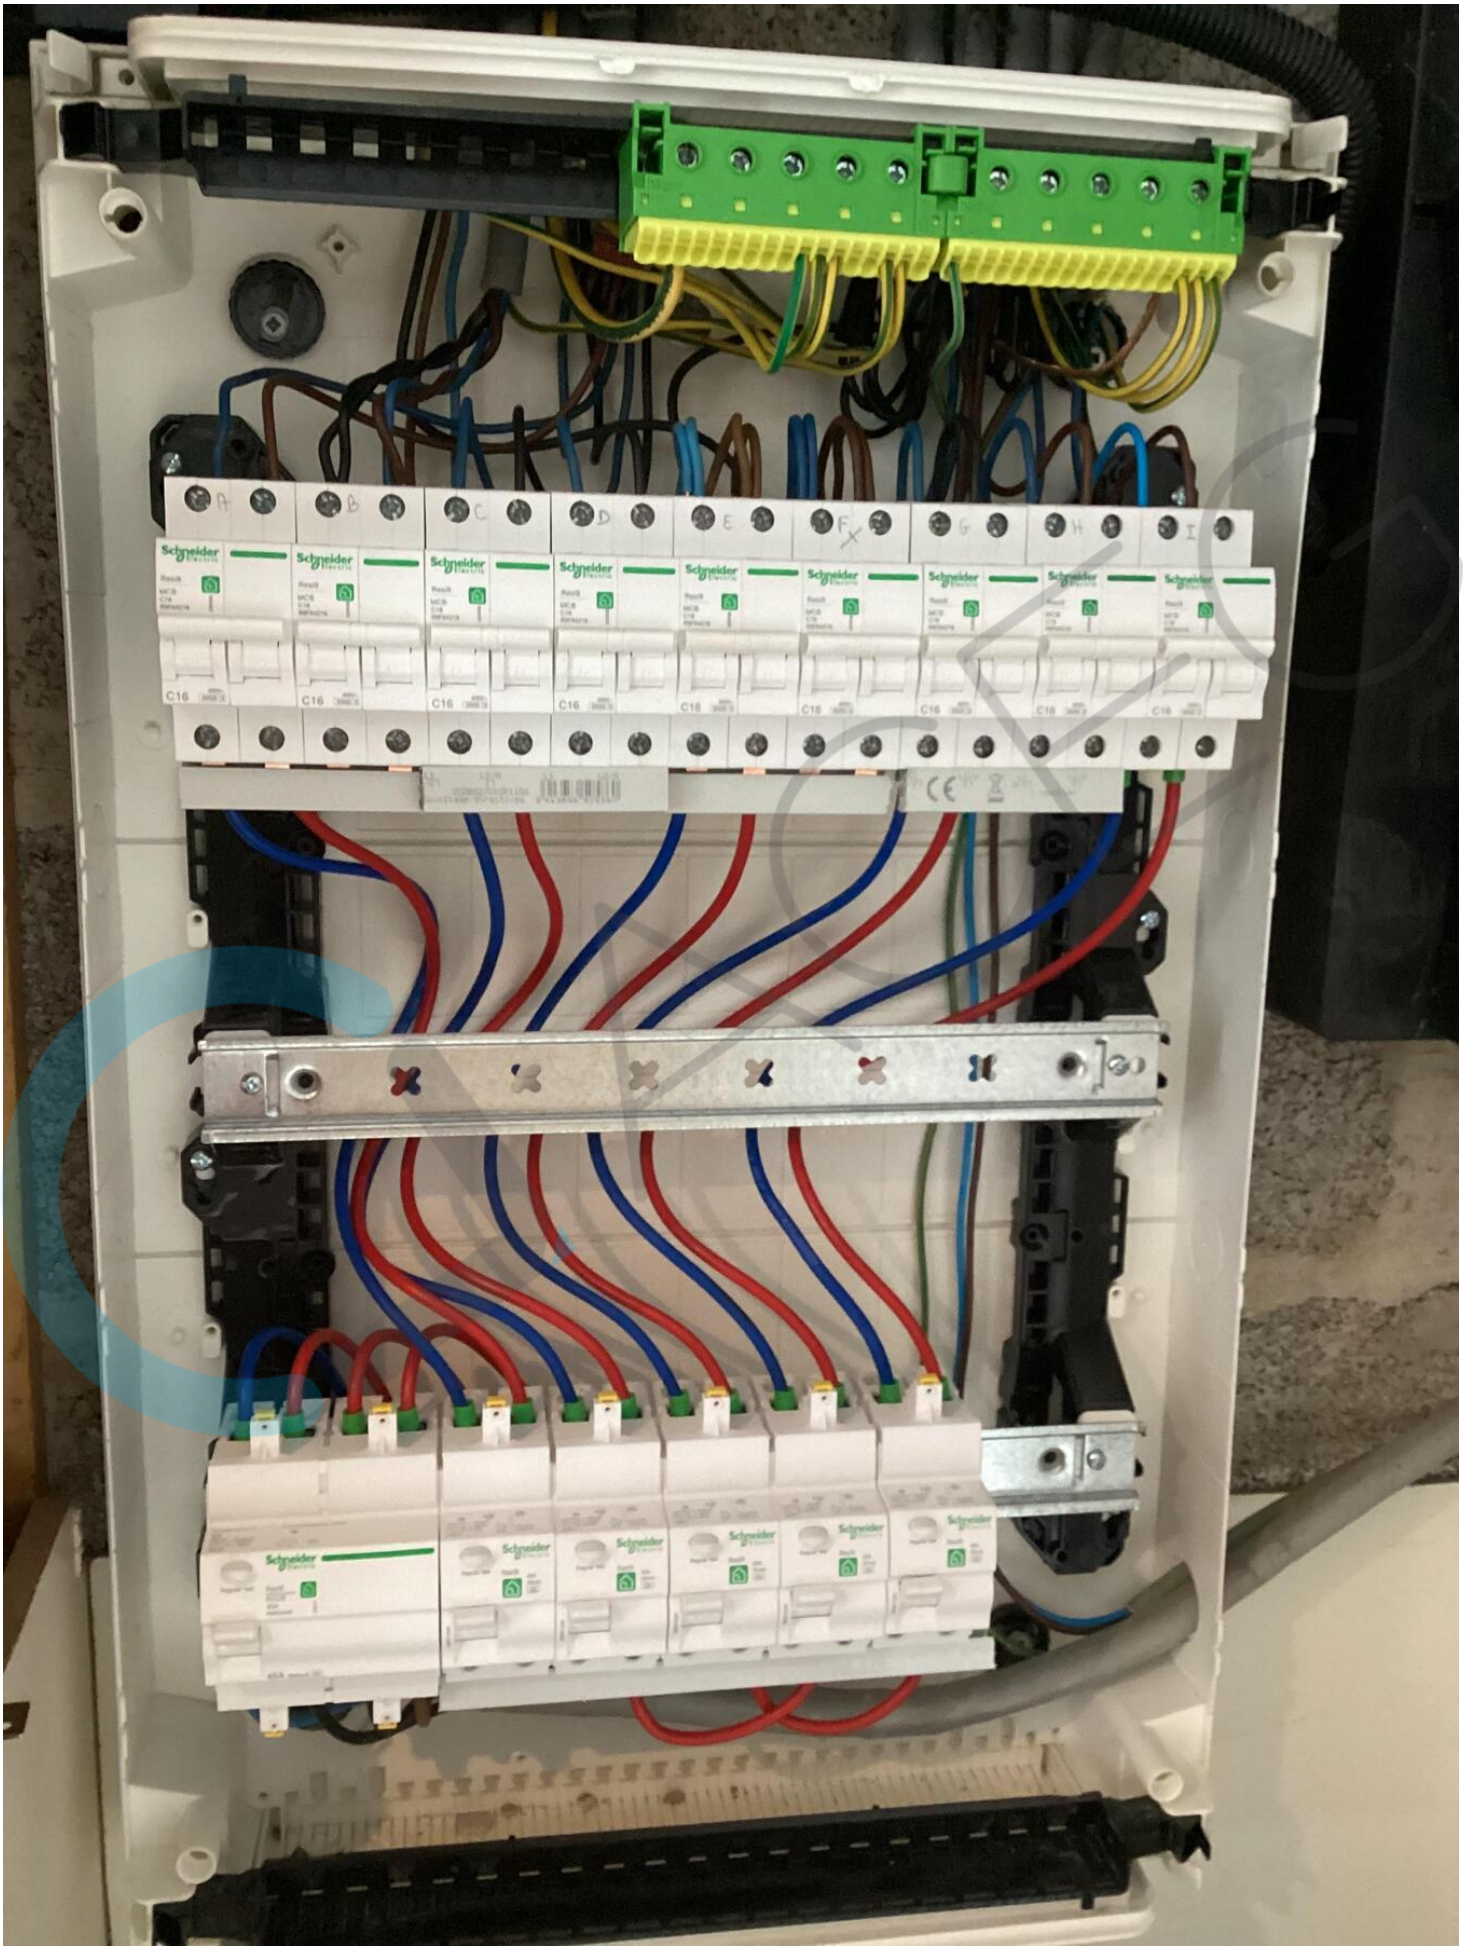
Schneider Electric
C16

WHO 86

I 63214.
kWh
II 30195.
LANDIS & GYR
ML240xdf3
220/380 V
No. 44 581 618
3x(10)40 A
120 r/kWh
50 Hz
UNERG
5825O6

DS IV/3
15/40 A
400 V~
180 A
N° 00054214/3
30mA
300mA
15A
30A
L1
L2
L3
N

Nouveau formulaire (641)

Terminé

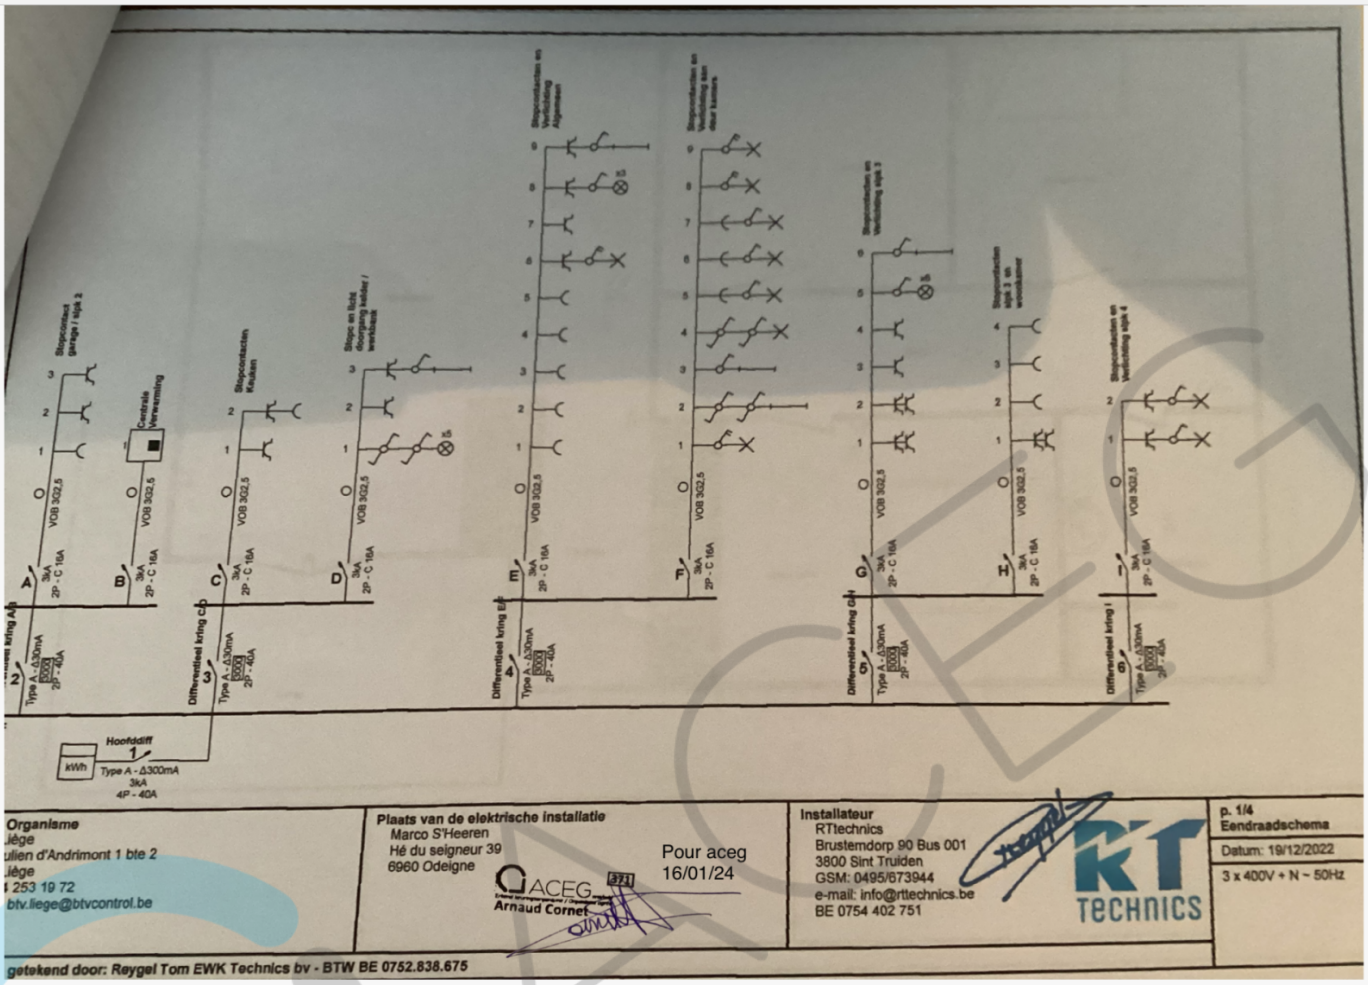

Nouveau formulaire (643)

Terminé

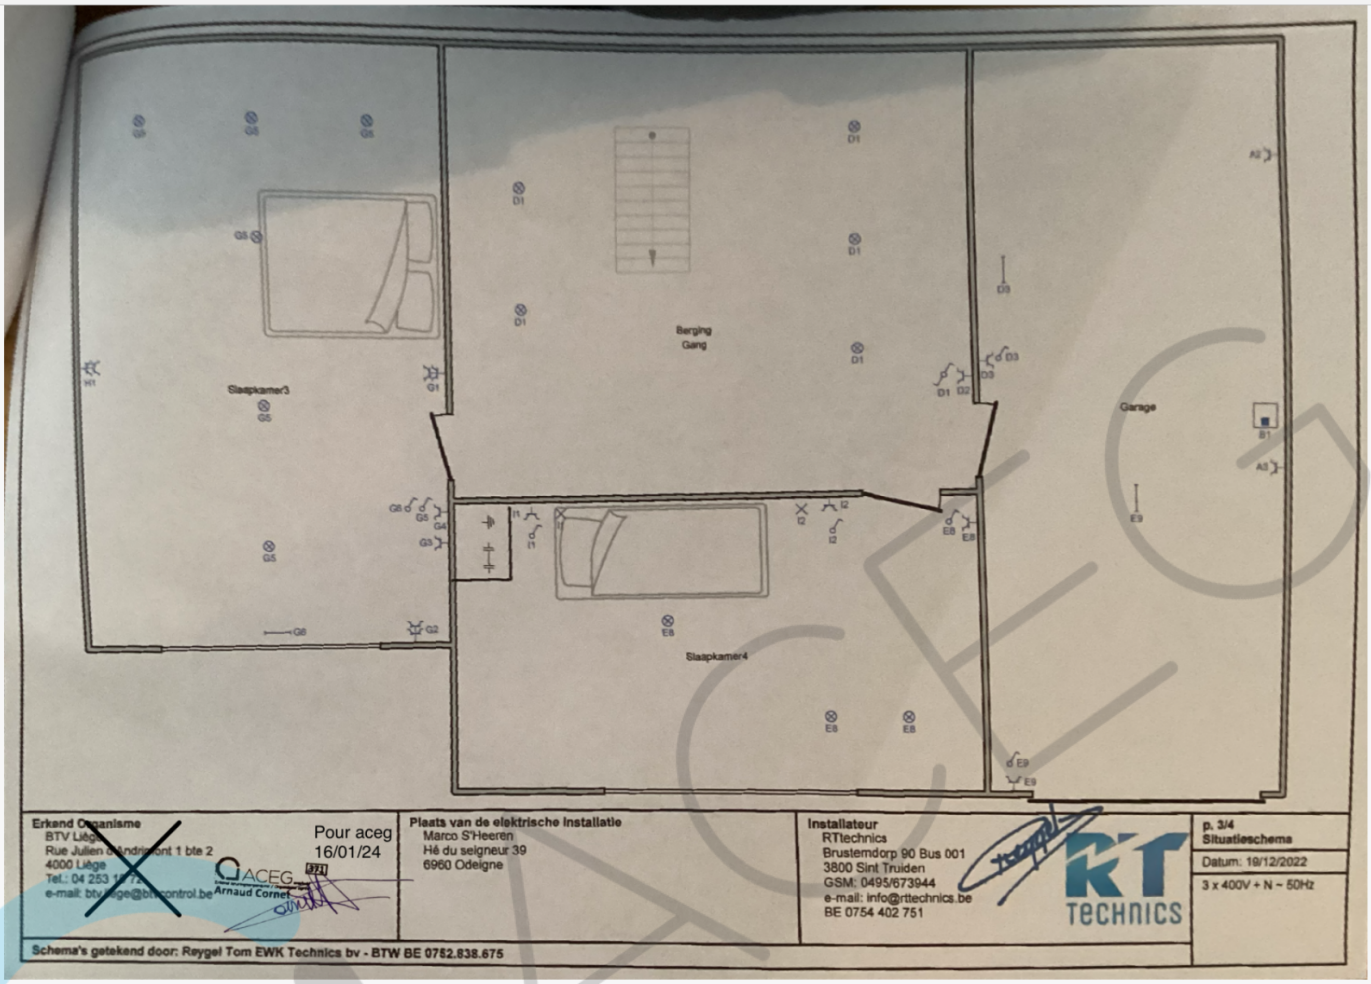

Nouveau formulaire (642)

Terminé

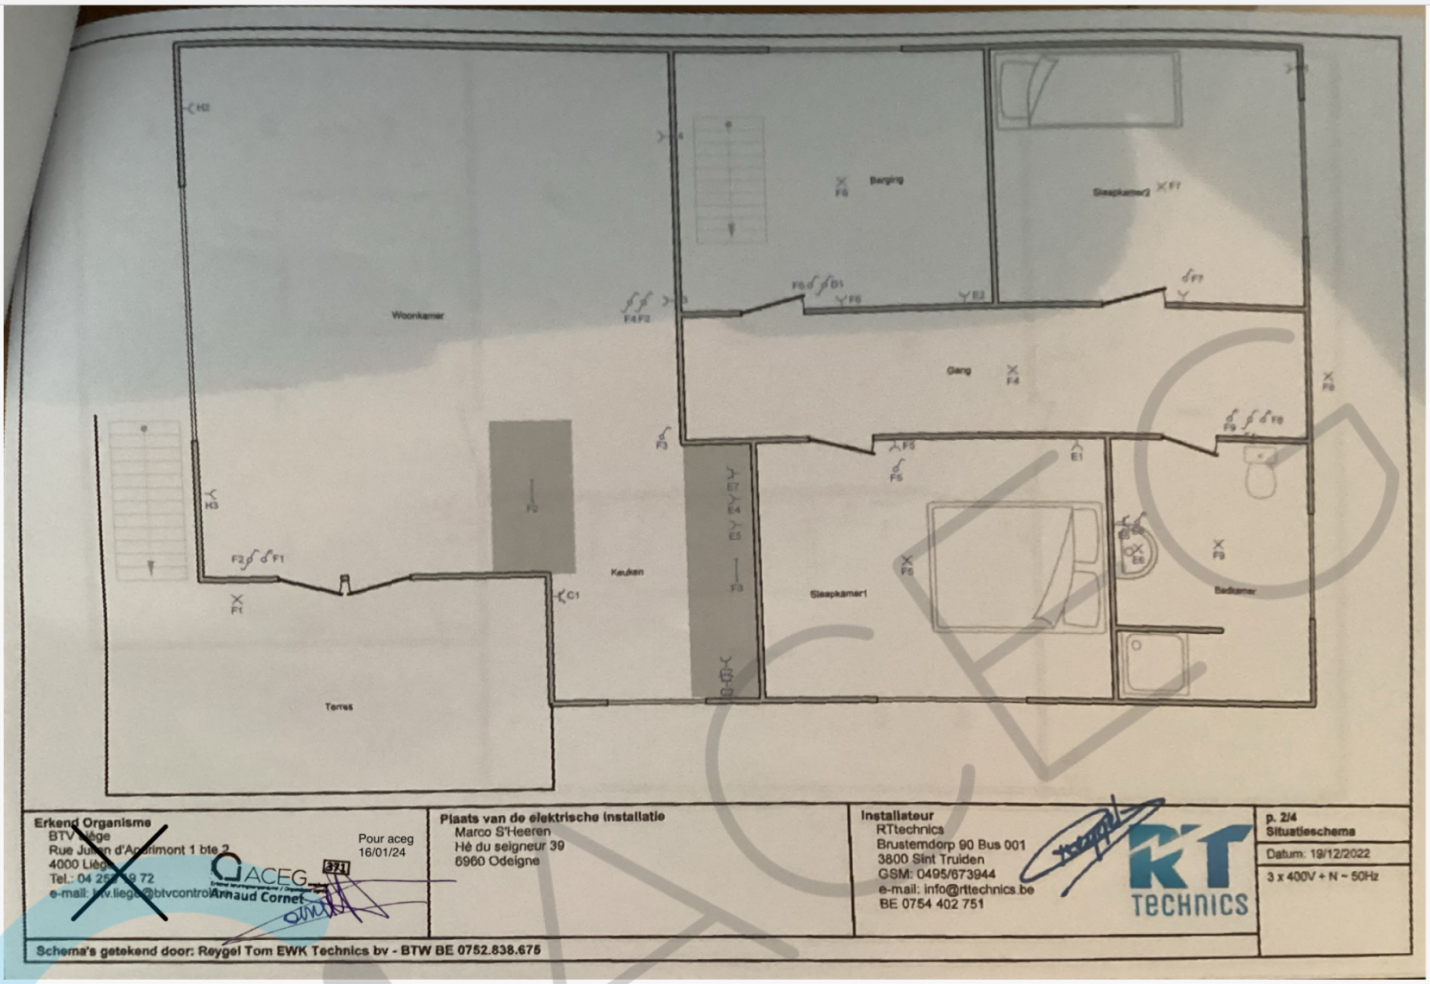

Nouveau formulaire (644)

Terminé

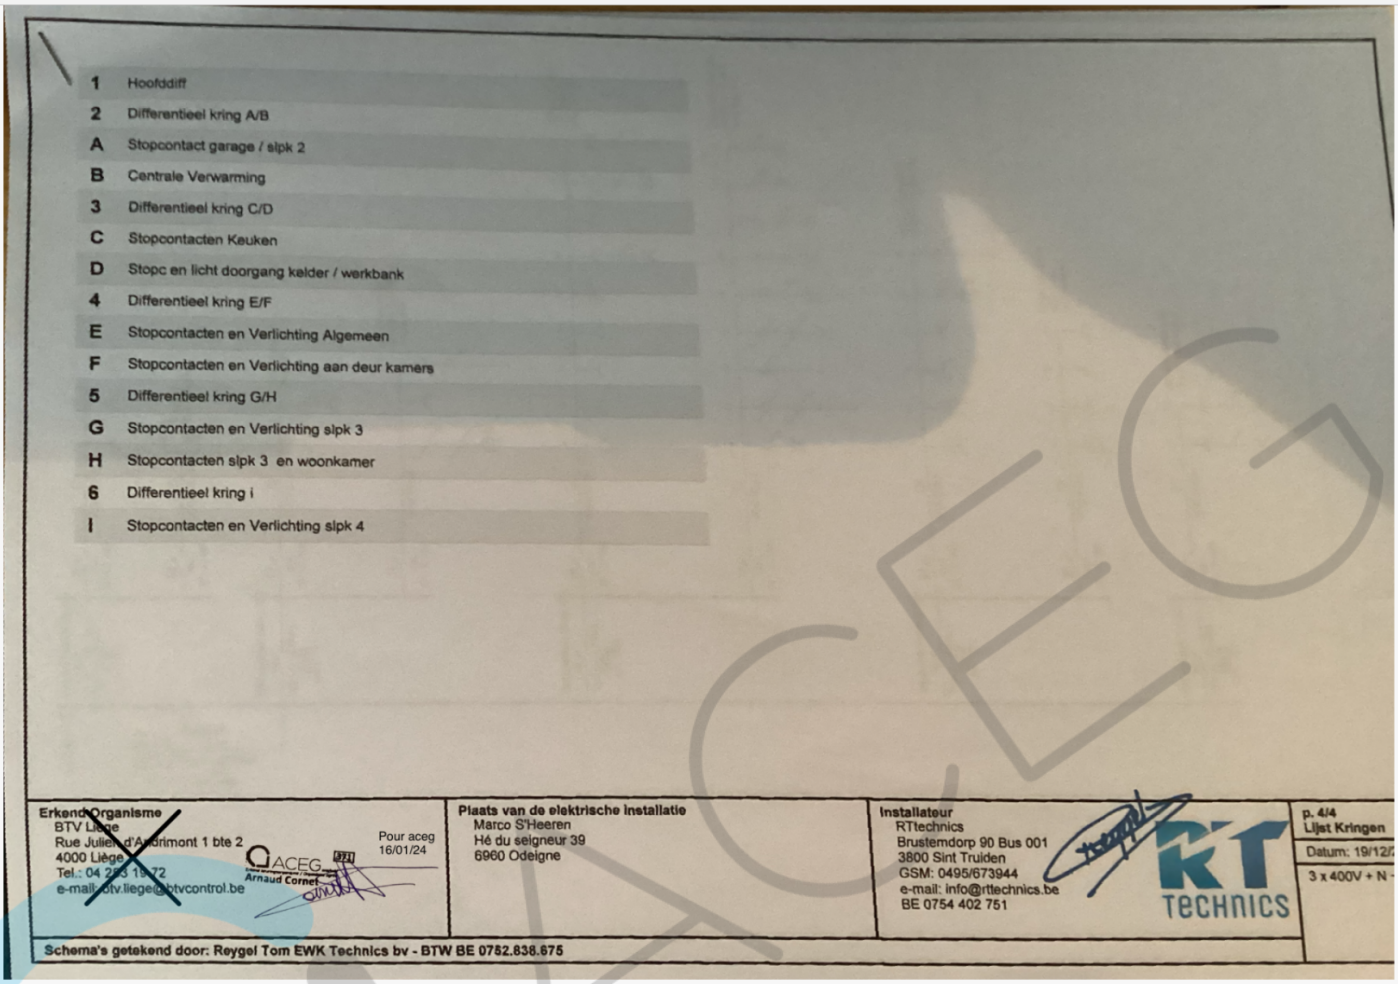

1	Hoofddiff
2	Differentieel kring A/B
A	Stopcontact garage / slpk 2
B	Centrale Verwarming
3	Differentieel kring C/D
C	Stopcontacten Keuken
D	Stopc en licht doorgang kelder / werkbank
4	Differentieel kring E/F
E	Stopcontacten en Verlichting Algemeen
F	Stopcontacten en Verlichting aan deur kamers
5	Differentieel kring G/H
G	Stopcontacten en Verlichting slpk 3
H	Stopcontacten slpk 3 en woonkamer
6	Differentieel kring i
I	Stopcontacten en Verlichting slpk 4

Erkend Organisme
BTV Liège
Rue Julien d'Andrimont 1 bte 2
4000 Liège
Tel.: 04 253 19 72
e-mail: btv.liege@btvcontrol.be

ACEG Arnaud Cornet
Pour aceg
16/01/24

Plaats van de elektrische installatie
Marco S'Heeren
Hé du seigneur 39
6960 Odeigne

Installateur
RTtechnics
Brustemdorp 90 Bus 001
3800 Sint Truiden
GSM: 0495/673944
e-mail: info@rttechnics.be
BE 0754 402 751

RT TECHNICS

p. 4/4
Lijst Kringen
Datum: 19/12/
3 x 400V + N

Schema's getekend door: Reygel Tom EWK Technics bv - BTW BE 0752.838.675

MI 3102 BT
METREL
EARTH RE
100Ω
R:82.6Ω
Rc:0.0kΩ
Rp:0.0kΩ
L
PE
N
AUTO
BACK

MI 3102 BT
METREL
R ISO
500V 0.50MΩ
R: 3.31 MΩ
Um: 525V
L
PE
N
AUTO SEQUENCE
EurotestXE
