ACEG vzw
Erkend keuringsorganisme

Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

BELAC 522-INSP
ISO/IEC 17020

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 09/10/2026 **Inspecteur:** Bram Van Nuffel **Mentor:** **Installateur:** -
ID-label: **Klantreferentie:**

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557 Serienummer: 19481267

Datum verslag: 09/10/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Lindenstraat
Huisnummer	38
Busnummer	
Postcode	9300
Gemeente	AALST
Land	België

Eigenaar

Naam	-
Straatnaam	Lindenstraat
Huisnummer	38
Busnummer	
Postcode	9300
Gemeente	AALST
Land	België

Installateur

Naam	-
BTW nr.	-
Telefoonnummer	-
E-mail	-

Type : woning **EAN** : 5414488200626527 57 **Teller Nr.:** : 1SAG3105244550

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek: Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 3~230V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1 Aantal kringen: 22

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 2.31 MΩ RE: 18.53 Ω

OK OK





DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I²t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	22	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	5	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen		Curve		Bescherming IN (A)		(andere)		P		Sectie (mm²)
Visueel nazicht (algemeen)	OK		**Directe aanraking**	OK			**Indirecte aanraking**	OK		
Aansluitingen	OK		**schema in bijlage door Aceg vzw**	NA						
Equipotentiale verbindingen	OK		**Doorsnede geleiders**	OK						
Continuiteit	OK		**Verlichting / toestellen**	NVT						

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

N37 Aanvang installatie dateert van voor 01/06/2020

BESLUIT

☑ **De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1.** Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 9/10/2051

☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

☑ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 08:30 tot 09:06


De inspecteur Bram Van Nuffel

ACEG VZW - #128
De werknemer,



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.
Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	**Stap 2**	**Stap 3**	**Stap 4**
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 9/10/2051	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

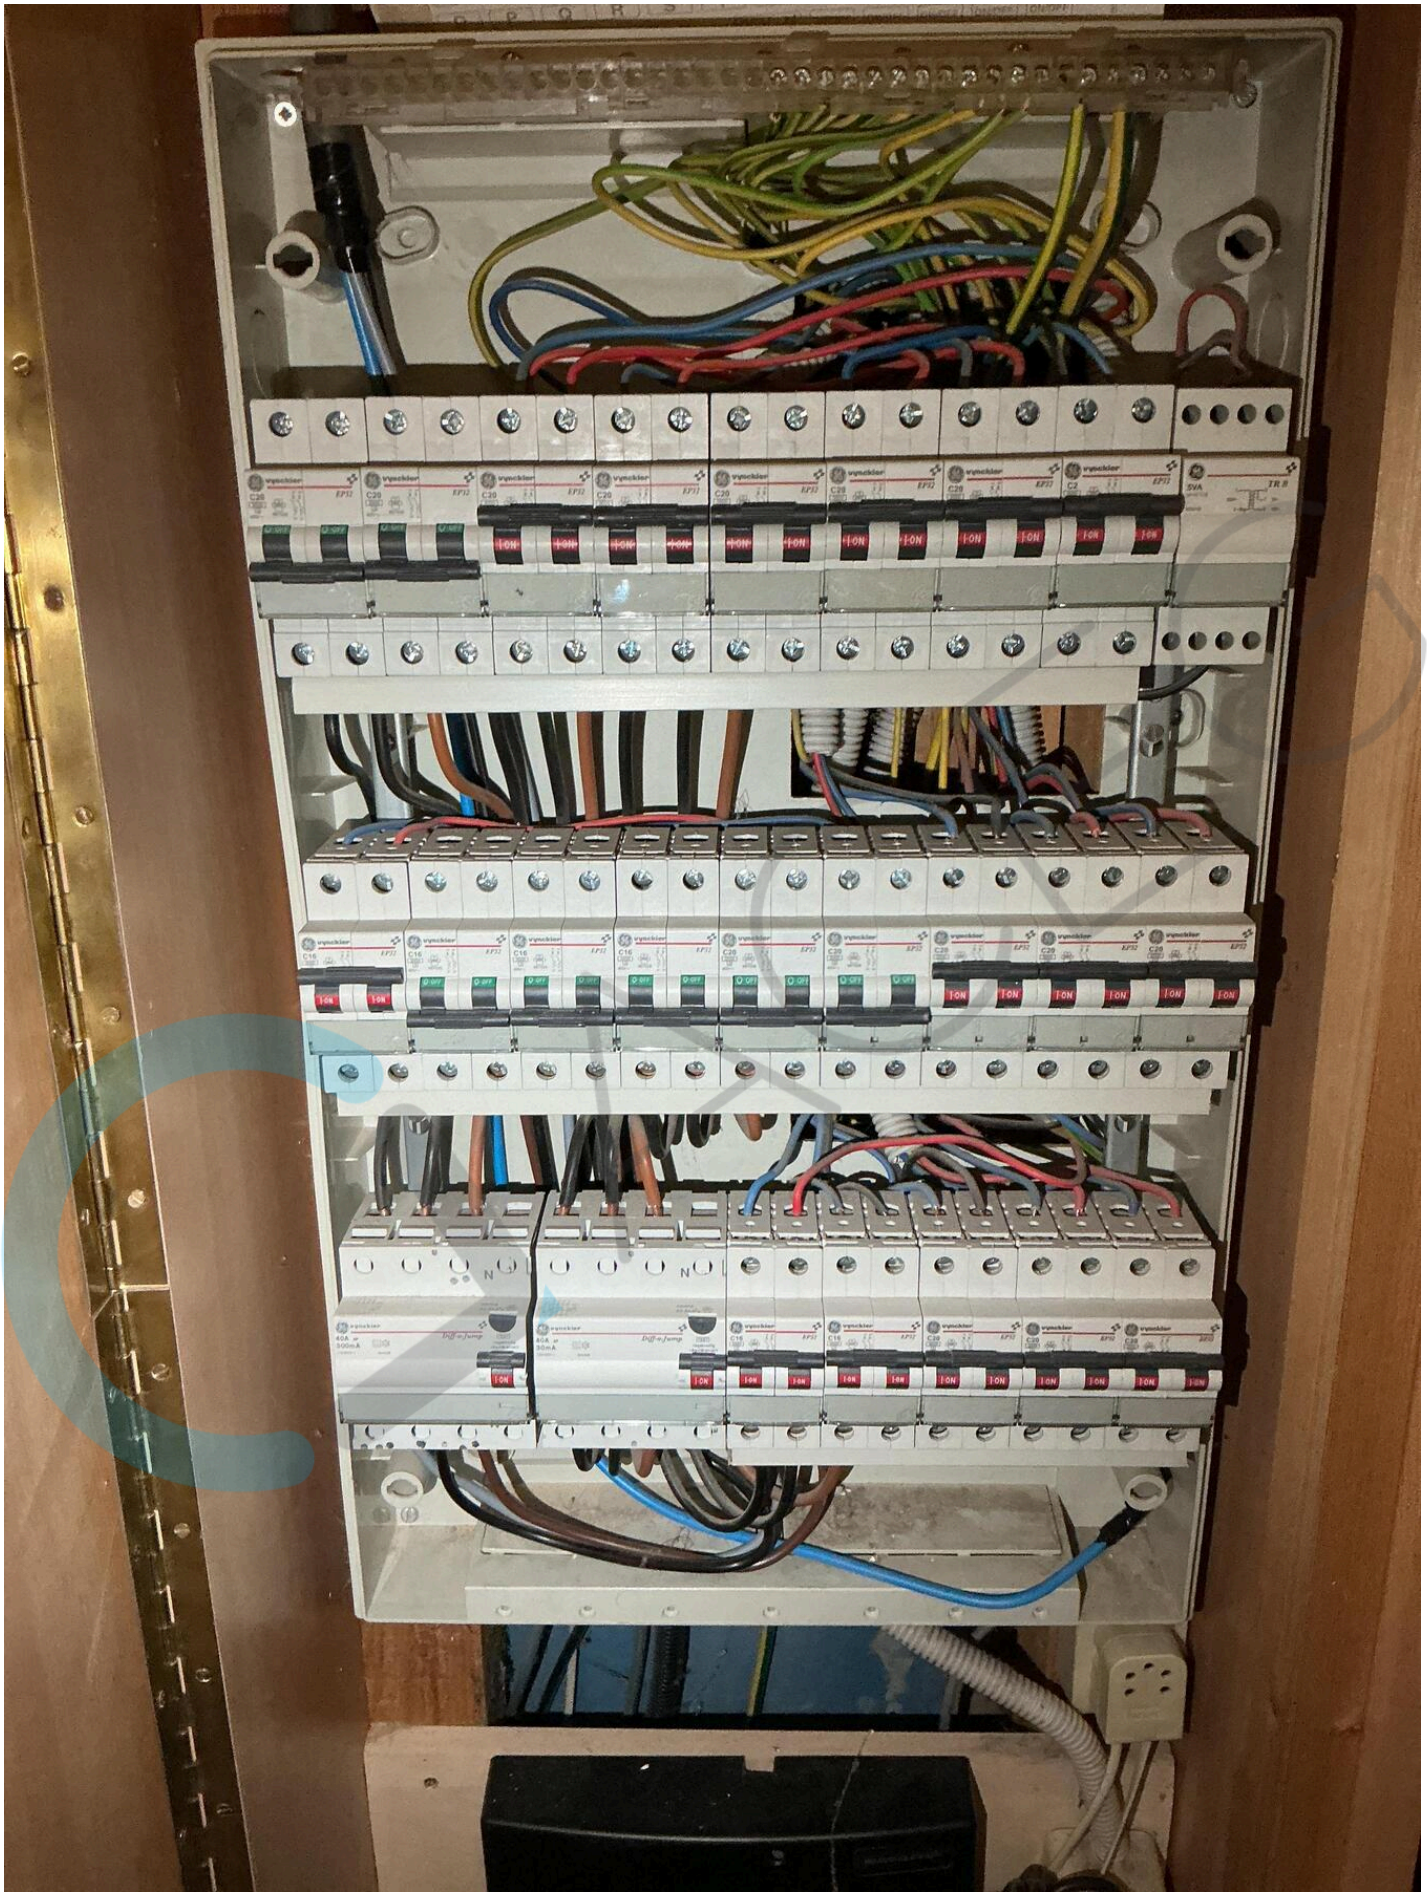



IP40 100A
EN 60439-3
AC 50Hz 415V
3x230V
A
B
C
D
E
F
G
H
9
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V


fluvius.
Alle info
www.fluvius.be
Gasgeur?
0800 65 0 65
Onderbreking of defect?
078 35 35 00
L9-F40/3N


EAN E: 541 448 820 062 652 757
N R 38
T211
SICONIA
19/180381 ON
M22 0071
OVC III
3 x 230 / 400 V ~ 50Hz
3 x 230 V ~ 50Hz
0,25 - 5 (100) A
-25°C / +55°C
IP51
UC3
1.8.1
000000.000 kWh
kWh
kvarh
1000 imp/kWh
1000 imp/kvarh
LTE NB1
wM-BUS
dlms
1.8.1
1.8.2
2.8.1
2.8.2
Sagemcom
CS 50001
92848 RUEIL CEDEX
FRANCE
253769484
2022
1SAG3105244550

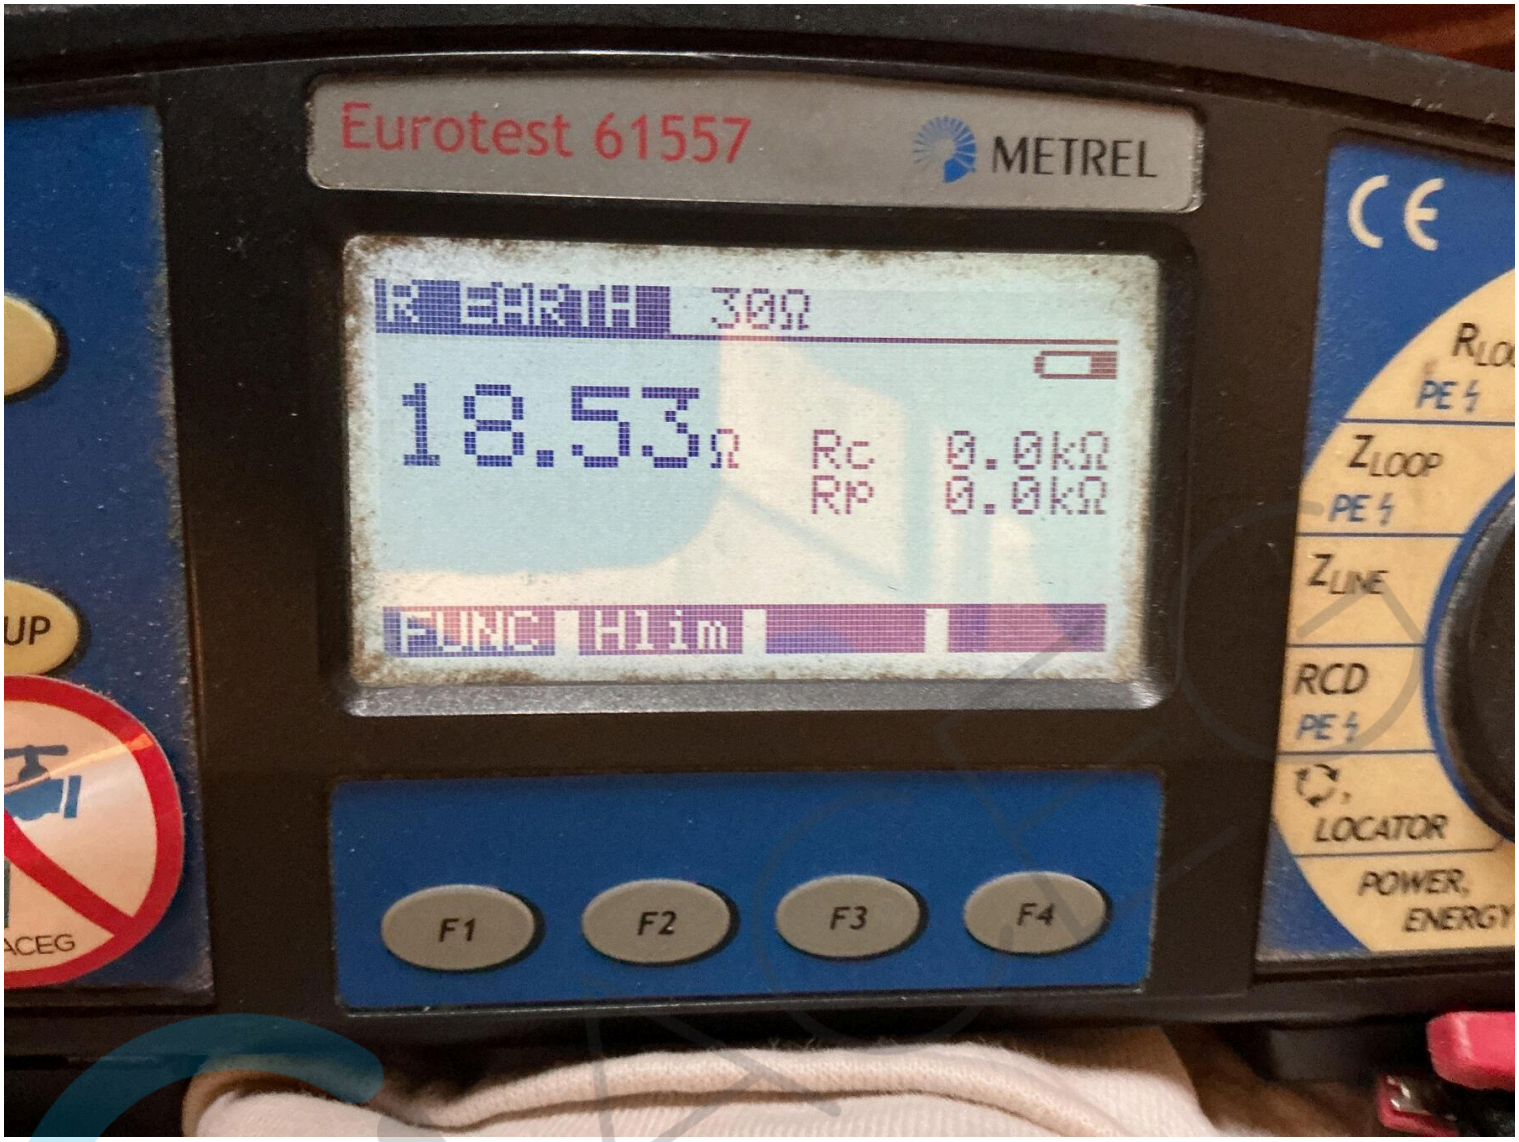
Eurotest 61557
METREL
CE
18.53Ω
Rc 0.0kΩ
Rp 0.0kΩ
FUNC
F1
F2
F3
F4
RCD
LOCATOR
POWER,
ENERGY


Eurotest 61557
METREL
ISO 500V 0.50MΩ
2.31 MΩ Um 519V
FUNC Uiso Uim
F1
F2
F3
F4
RLOOP N-PE
PE
ZLOOP
PE
ZLINE
RCD
PE
LOCATOR
POWER,
ENERGY
ETUP
ACEG

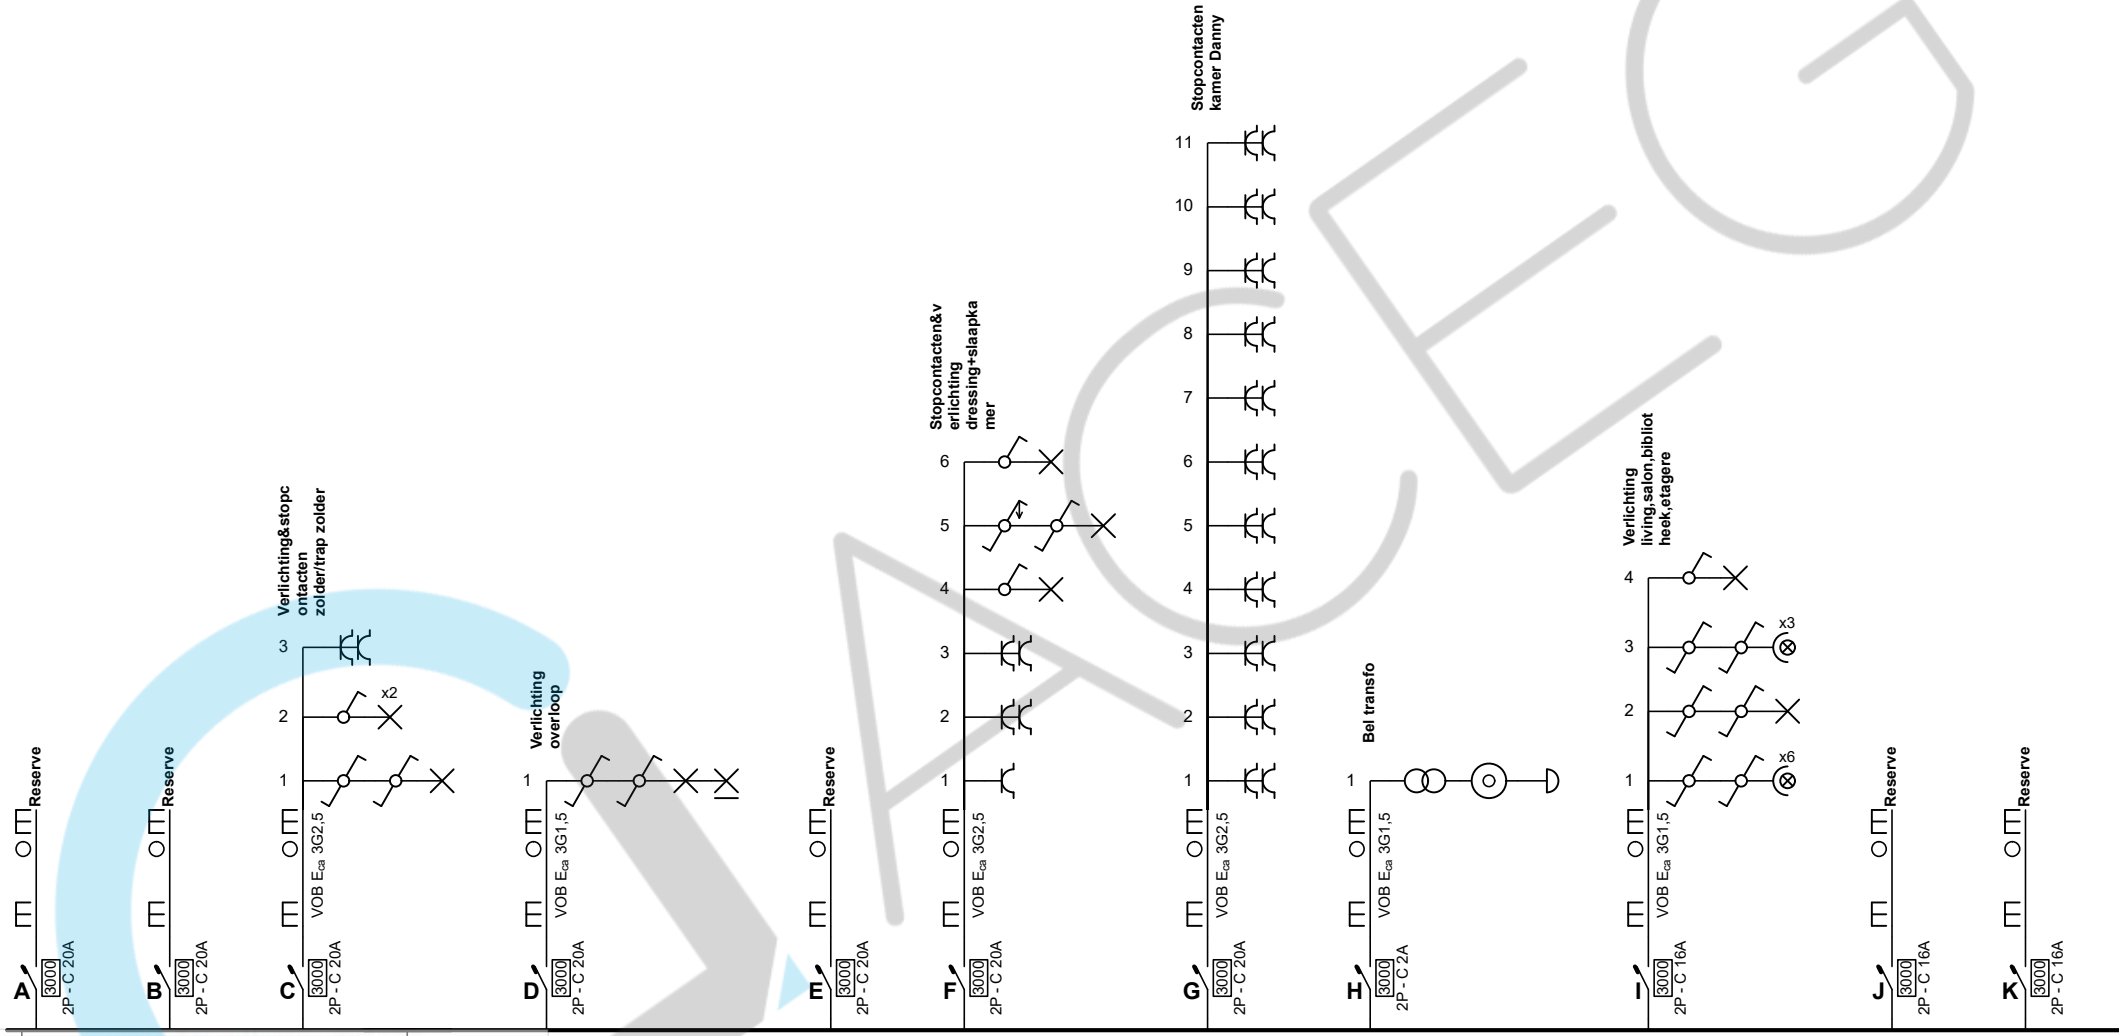

ACEG VZW - #128

De werknemer,


09/10/2026

Plaats van de elektrische installatie
Danny De Schrijver
Lindenstraat 38
9300 AALST

Installateur
V-LEC bvba
Voistraat 5 Stratenplan
9420 Erpe-Mere
GSM: 0476 43 05 69
e-mail: antoonroevens@hotmail.com
BTW BE 0643.953.603

p. 1/6
Eendraadschema

3 x 230V ~ 50Hz

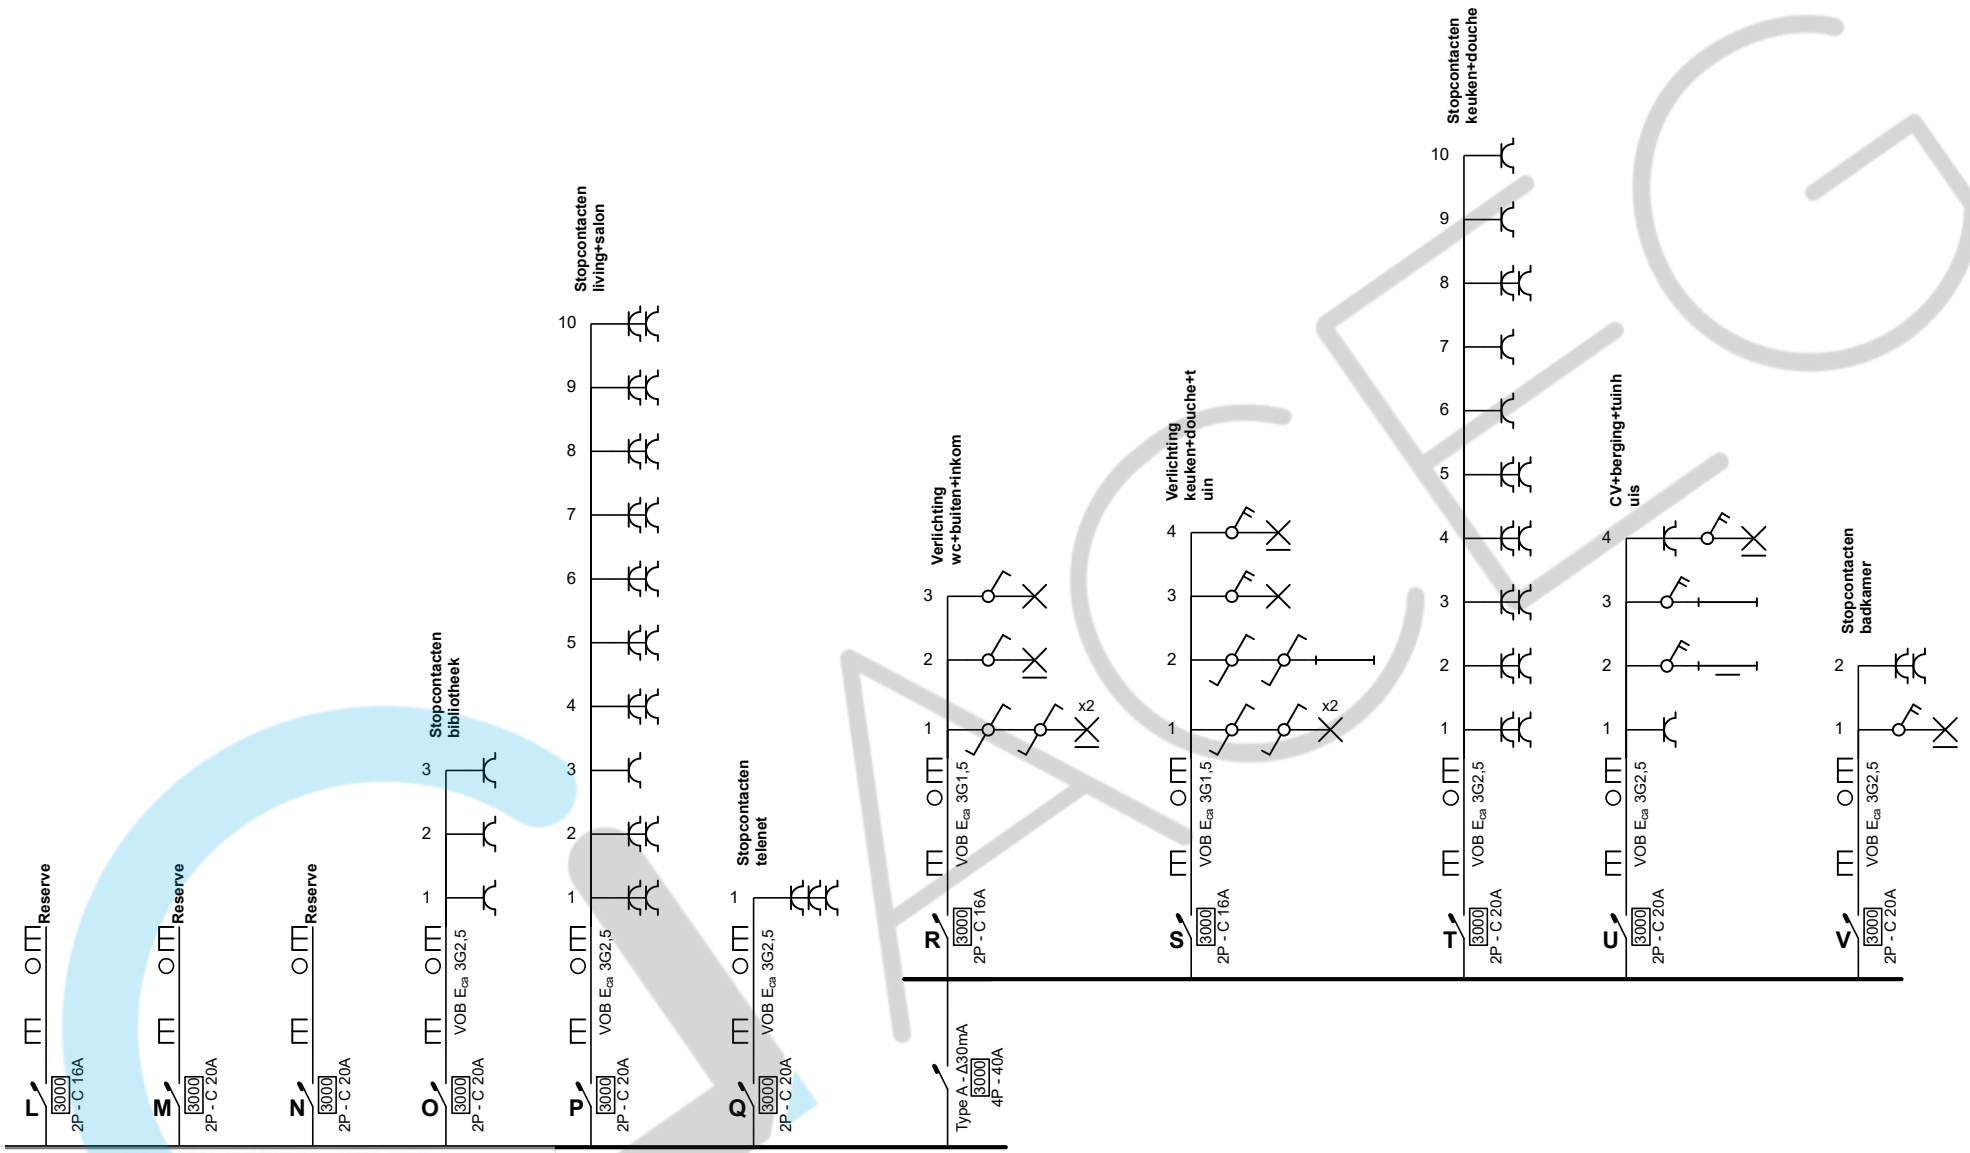

ACEG VZW - #128

De werknemer,


09/10/2026

Plaats van de elektrische installatie
Danny De Schrijver
Lindenstraat 38
9300 AALST

Installateur
V-LEC bvba
Voistraat 5 Stratenplan
9420 Erpe-Mere
GSM: 0476 43 05 69
e-mail: antoonroevens@hotmail.com
BTW BE 0643.953.603

p. 2/6
Eendraadschema

3 x 230V ~ 50Hz

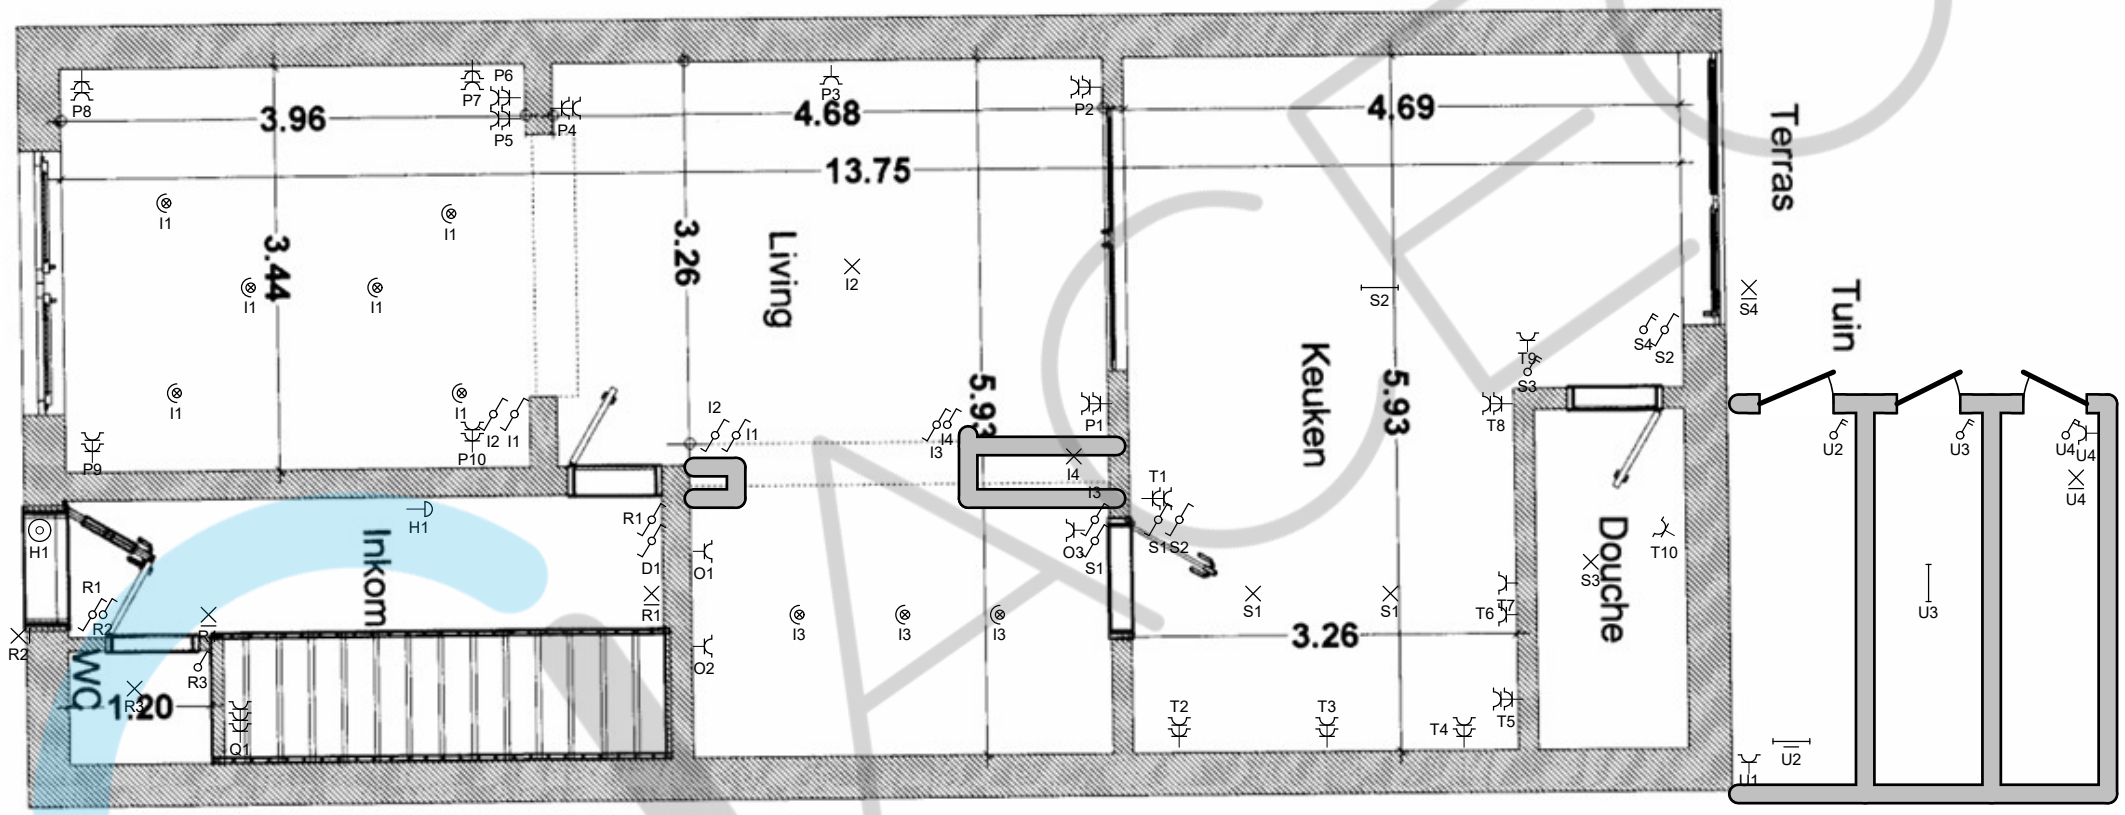

ACEG VZW - #128

De werknemer,

09/10/2026

Plaats van de elektrische installatie
Danny De Schrijver
Lindenstraat 38
9300 AALST

Installateur
V-LEC bvba
Voistraat 5 Stratenplan
9420 Erpe-Mere
GSM: 0476 43 05 69
e-mail: antoonroevens@hotmail.com
BTW BE 0643.953.603

p. 3/6
Situatieplan

3 x 230V ~ 50Hz



ACEG VZW - #128

De werknemer,


09/10/2026

Plaats van de elektrische installatie
Danny De Schrijver
Lindenstraat 38
9300 AALST

Installateur
V-LEC bvba
Voistraat 5 Stratenplan
9420 Erpe-Mere
GSM: 0476 43 05 69
e-mail: antoonroevens@hotmail.com
BTW BE 0643.953.603

Situatieplan

3 x 230V ~ 50Hz

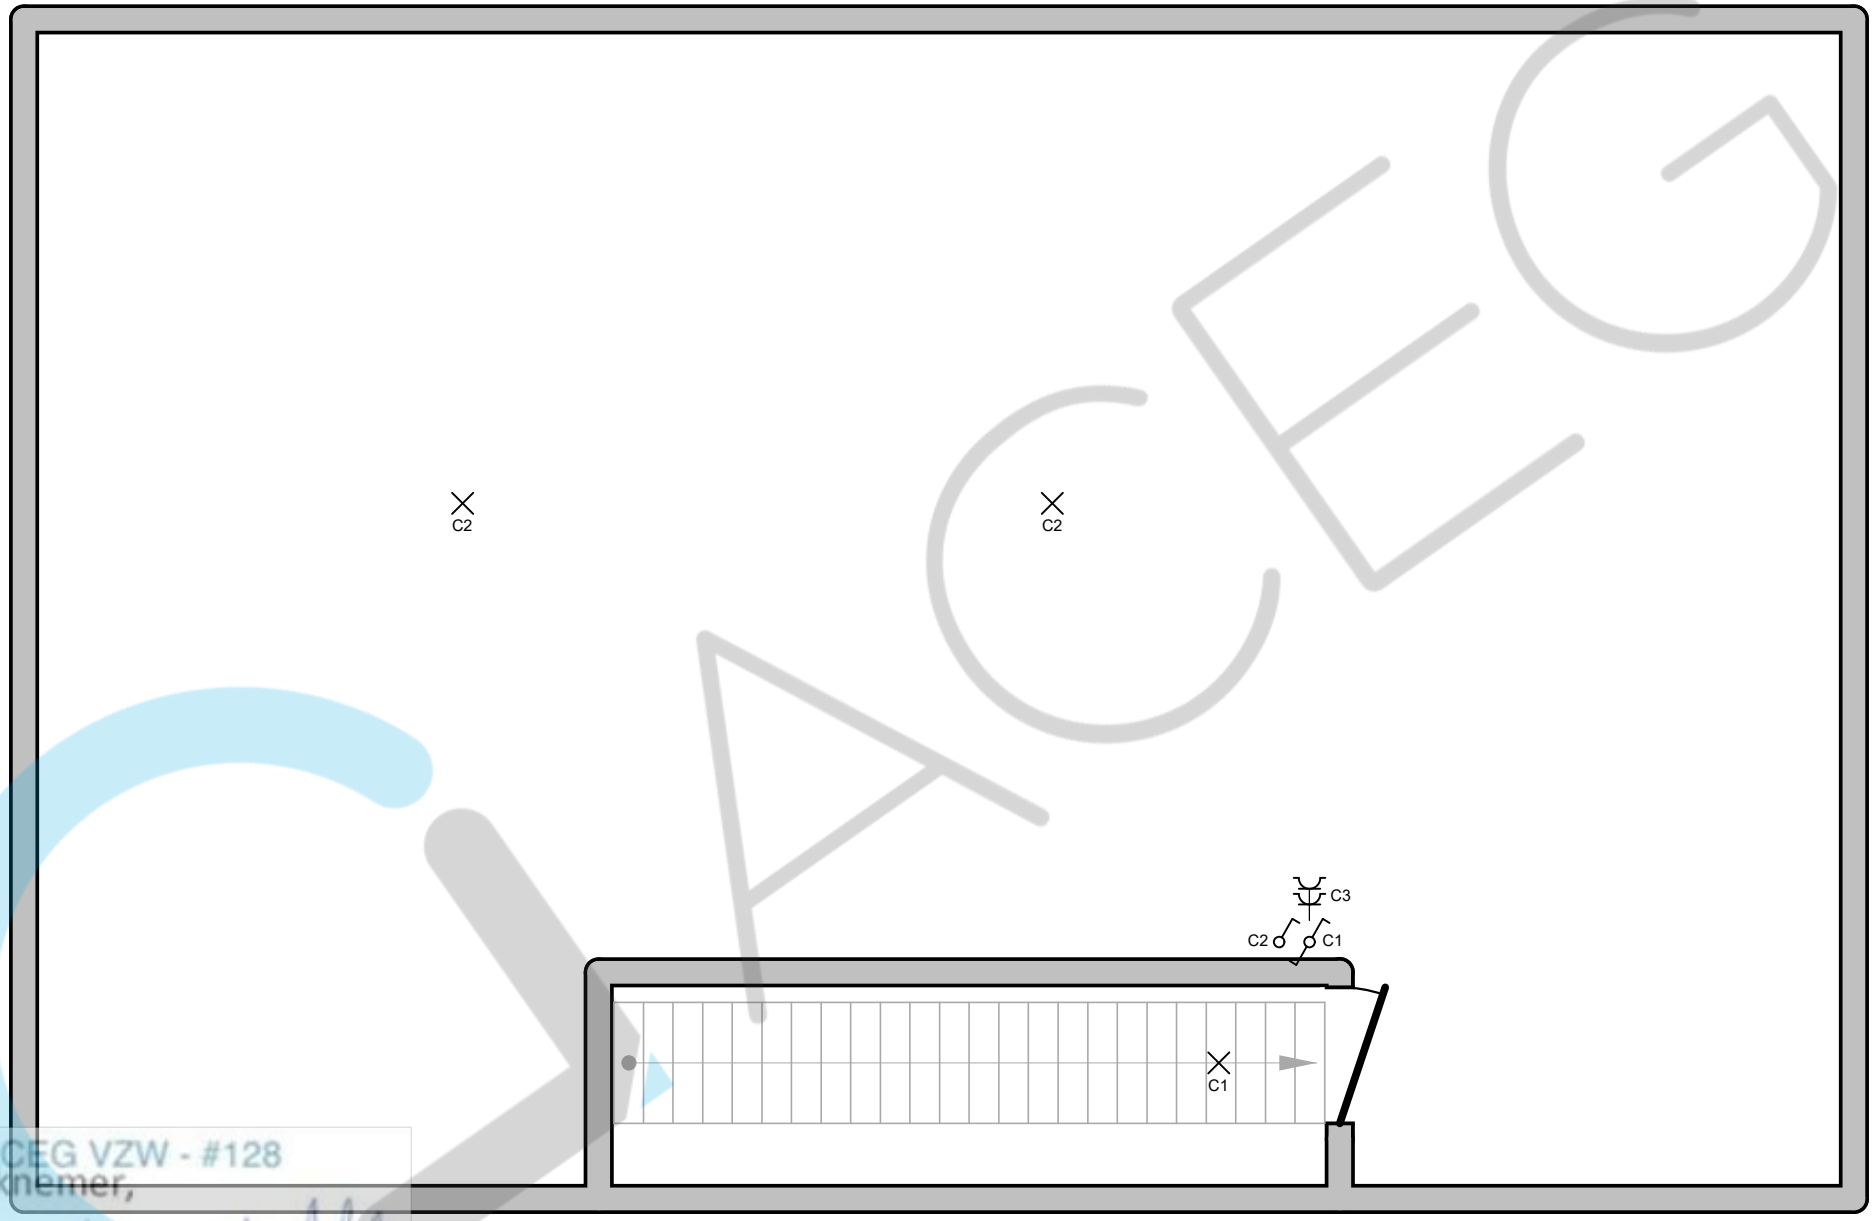

ACEG VZW - #128

De werknemer,

09/10/2026

Plaats van de elektrische installatie
Danny De Schrijver
Lindenstraat 38
9300 AALST

Installateur
V-LEC bvba
Voistraat 5 Stratenplan
9420 Erpe-Mere
GSM: 0476 43 05 69
e-mail: antoonroevens@hotmail.com
BTW BE 0643.953.603

Situatieplan

3 x 230V ~ 50Hz

A	Reserve
B	Reserve
C	Verlichting&stopcontacten zolder/trap zolder
D	Verlichting overloop
E	Reserve
F	Stopcontacten&verlichting dressing+slaapkamer
G	Stopcontacten kamer Danny
H	Bel transfo
I	Verlichting living,salon,bibliotheek,etagere
J	Reserve
K	Reserve
L	Reserve
M	Reserve
N	Reserve
O	Stopcontacten bibliotheek
P	Stopcontacten living+salon
Q	Stopcontacten telenet
R	Verlichting wc+buiten+inkom
S	Verlichting keuken+douche+tuin
T	Stopcontacten keuken+douche
U	CV+berging+tuinhuis
V	Stopcontacten badkamer

ACEG VZW #128

De werknemer,

09/10/2026

Plaats van de elektrische installatie
Danny De Schrijver
Lindenstraat 38
9300 AALST

Installateur
V-LEC bvba
Voistraat 5 Stratenplan
9420 Erpe-Mere
GSM: 0476 43 05 69
e-mail: antoonroevens@hotmail.com
BTW BE 0643.953.603

Lijst Kringen

3 x 230V ~ 50Hz
