Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. : 132298
Cont.pers.: Michael Leon
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0486404532
e-mail: michael@elektreon.be

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5394027
Voorl. verslagnr.:
Datum: 14/04/2020

OCB
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

Klant / Opdrachtgever:
MICHAEL LEON
BARELDREEF 48
2880 BORNEM

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: **Aard installatie::** nieuwe **Type lokalen:** woning
Plaats onderzoek: MICHAEL LEON KIMPELBERG 5 PUURS 2870
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling **Volgens AREI Art.:** 86/270
Datum onderzoek: 14/04/2020 **Volgende binnen** 300 **maand of vóór** 30/04/2045 **Onderzoeker:** CUYPERS VINCENT
Eigendom van: -
Installateur: - MICHAEL LEON BARELDREEF 48 2880 BORNEM
B.T.W.: - **ID-kaart :** - **Uitgereikt te:** - **Datum:** -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - **Teller nr.:** - **Stand I :** - **Stand II** -
Aansluiting: ondergronds **Wachtbuis:** geplaatst **Isolatieplaat:** aanwezig
Dienstspanning: 1 x 230V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** aut. 2p 40A **Schak.:** alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: **kabeltype:** XVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 **mm²**
Voedingsbekabeling: **kabeltype:** EXVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 **mm²**
Aardelektrode: **type:** pennen **sectie:** 16 **mm²** **spreidingswaarde:** 16,18 **Ohm**
Diff. schak.: **algemene:** 2p 40A/300mA **is verzegeld met loodje:** in orde **bijkomende diff.:** 2p 40A/30mA
Werking testknop: in orde **Controle foutlus:** in orde **Algemene isolatieweerstand:** 10,97 **MOhm**
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde **Staat van het vast elektrisch materieel:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: **rechtstreekse aanraking:** in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde **Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel:** in orde
Beschrijving installatie - toestellen: ■ **zie schema in bijlage** ■ **ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend**
Nog niet geplaatst: ☐ **keuken** ☐ **badkamer** ☐ **C.V.** ☐ **verlichting** ☐ ☐ **gasmeter** ☐ **watermeter** ☐ **hoofd -** ☐ **bijkomende - equipotentiaal verbinding**
Aantal borden: 1 **Aantal eindstroombanen:** 14

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	1. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle. 2. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit. 3. Bij een keuring "verkoop wooneenheid" volgens AREI art. 276 bis dienen verkoper en koper verplichtingen na te komen. Lees meer hierover via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2018/Informatienota_overdracht_eigendom.pdf
I	Geen

BESLUIT

■ De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

Ir. G. Croes

controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijk zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49

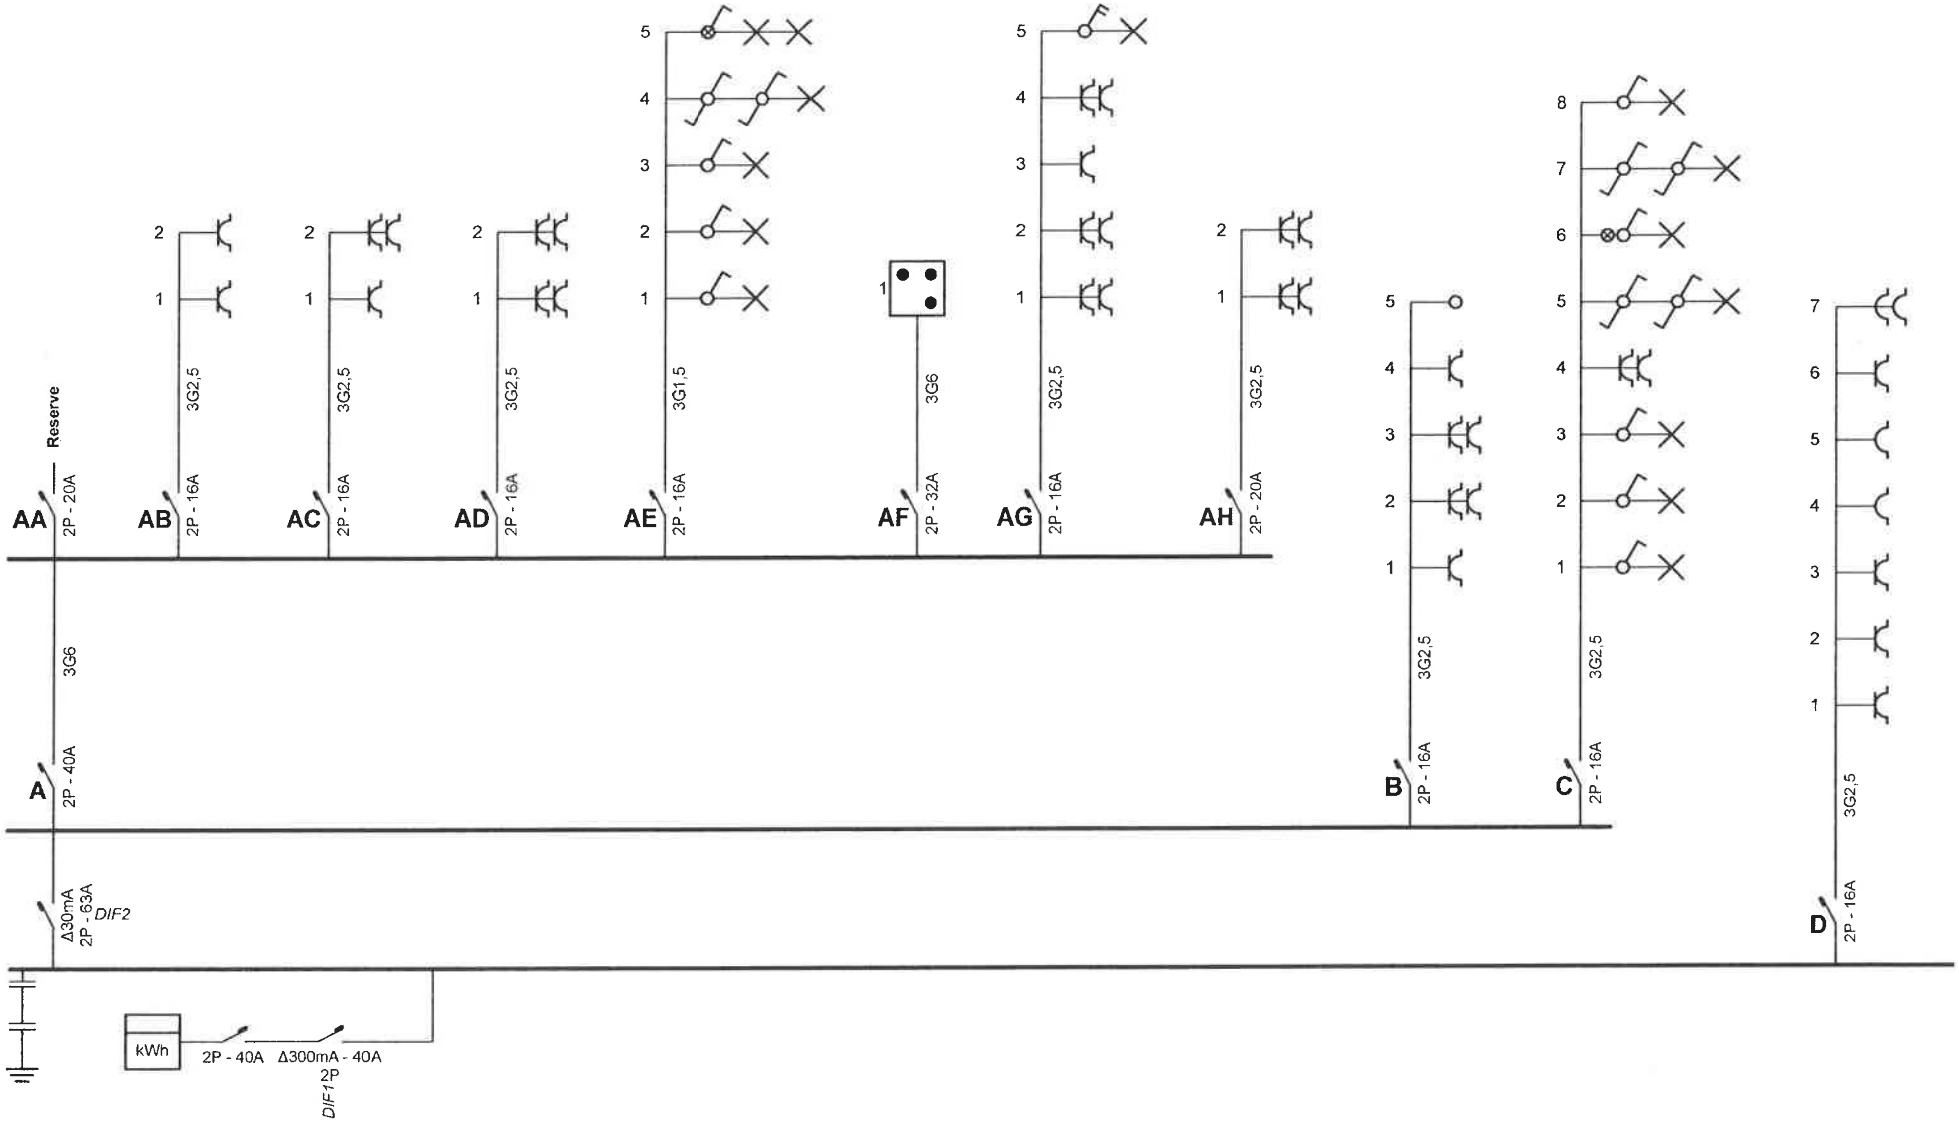

Plaats van de elektrische installatie	Installateur	p. 1/6 Eendraadschema
Goossens Kimpelberg 5 2870 Puurs	Elektreon Bareldreef 48 2880 Bornem e-mail: info@elektreon.be BE0687970817	Datum: 16/03/2019 1 x 230V ~ 50Hz

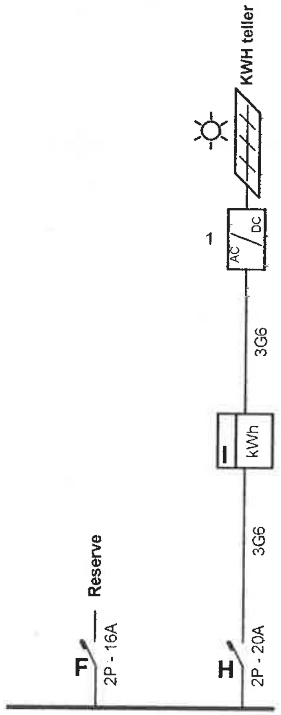

Plaats van de elektrische installatie Goossens Kimpelberg 5 2870 Puurs	**Installateur** Elektreon Bareldreef 48 2880 Bornem e-mail: info@elektreon.be BE0687970817	**p. 2/6** **Eendraadschema** Datum: 16/03/2019 1 x 230V ~ 50Hz

Gelijkvloers

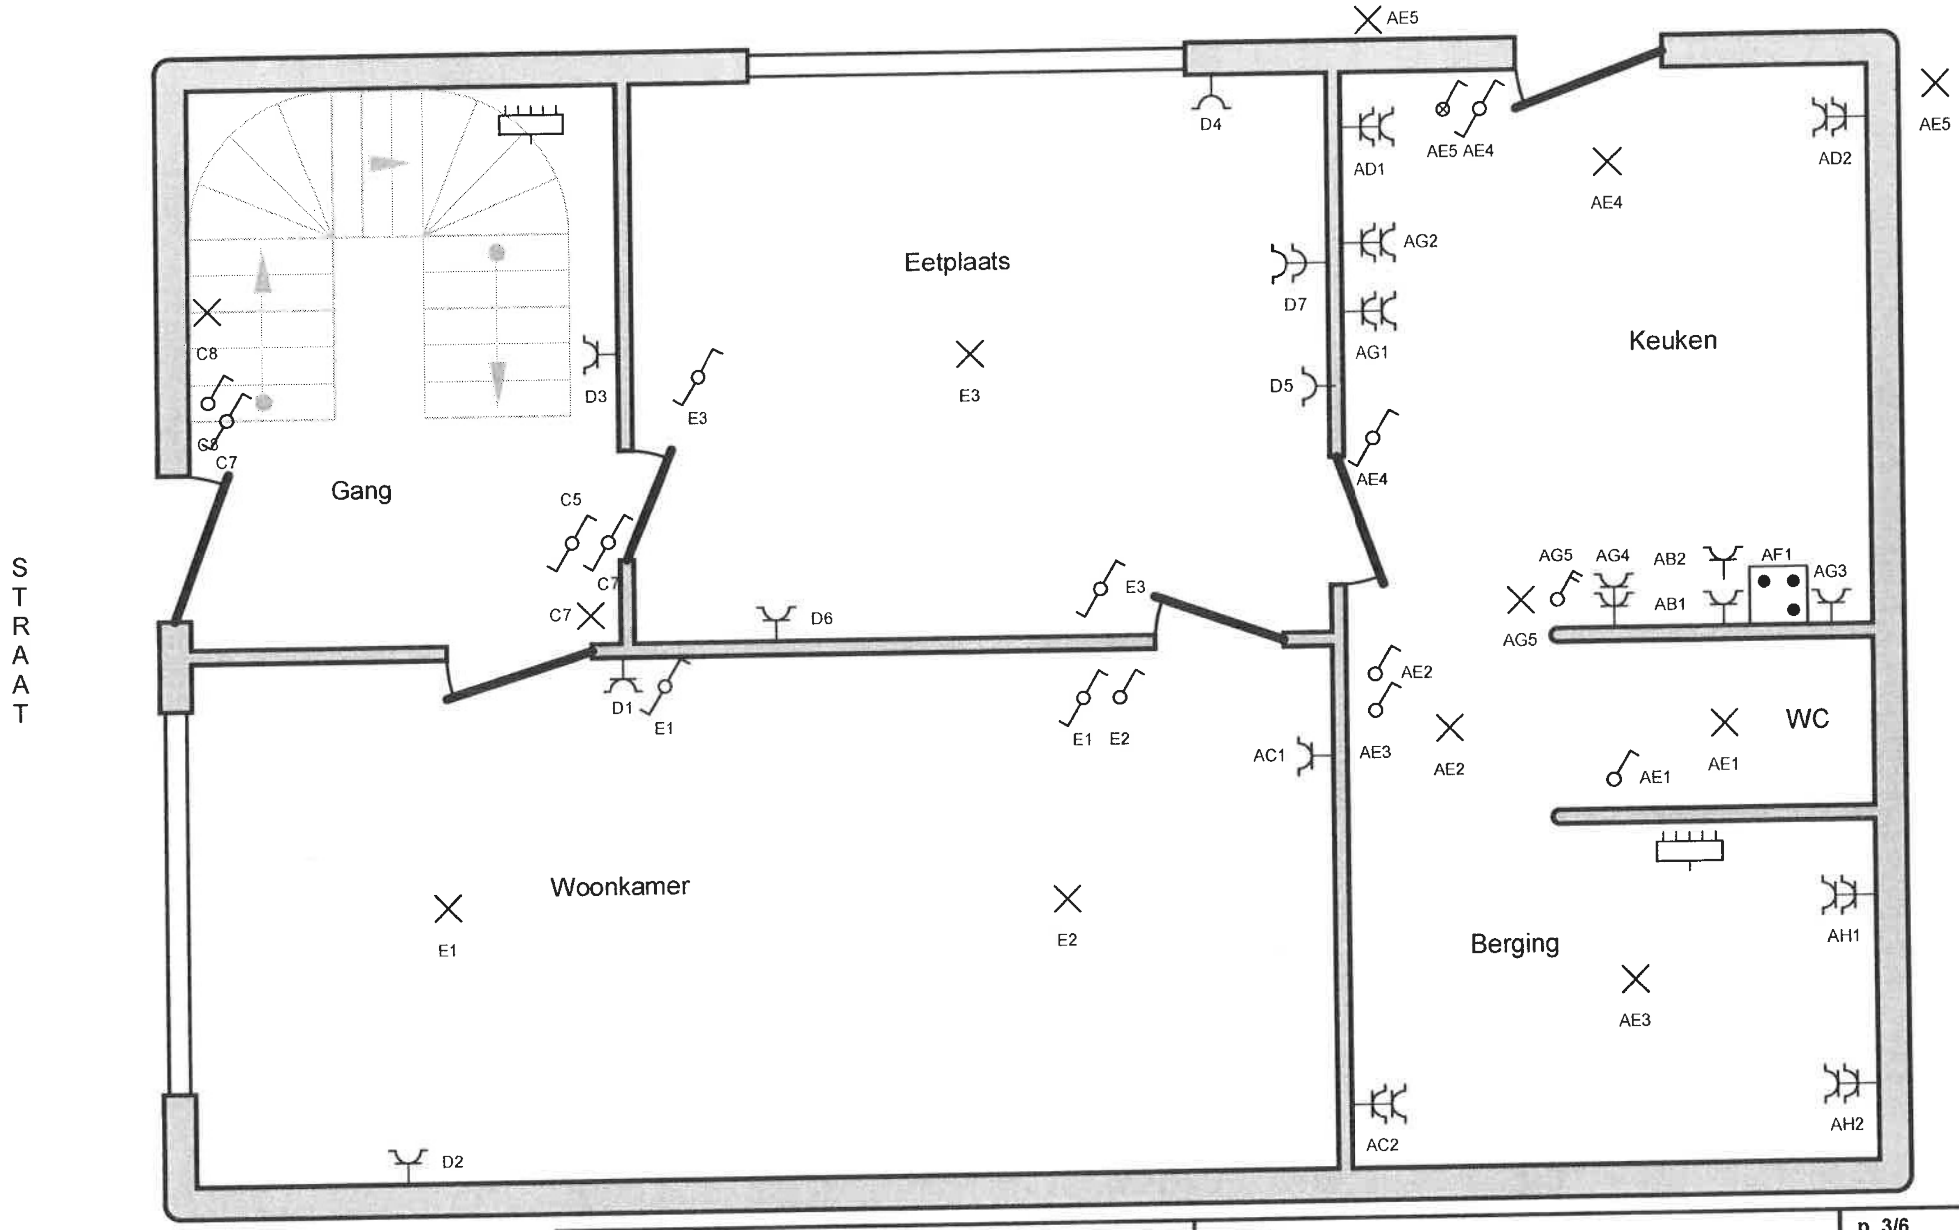

Plaats van de elektrische installatie
Goossens
Kimpelberg 5
2870 Puurs

Installateur
Elektreon
Bareldreef 48
2880 Bornem
e-mail: info@elektreon.be
BE0687970817

p. 3/6
Situatieschema

Datum: 16/03/2019

1 x 230V ~ 50Hz

1e verdiep

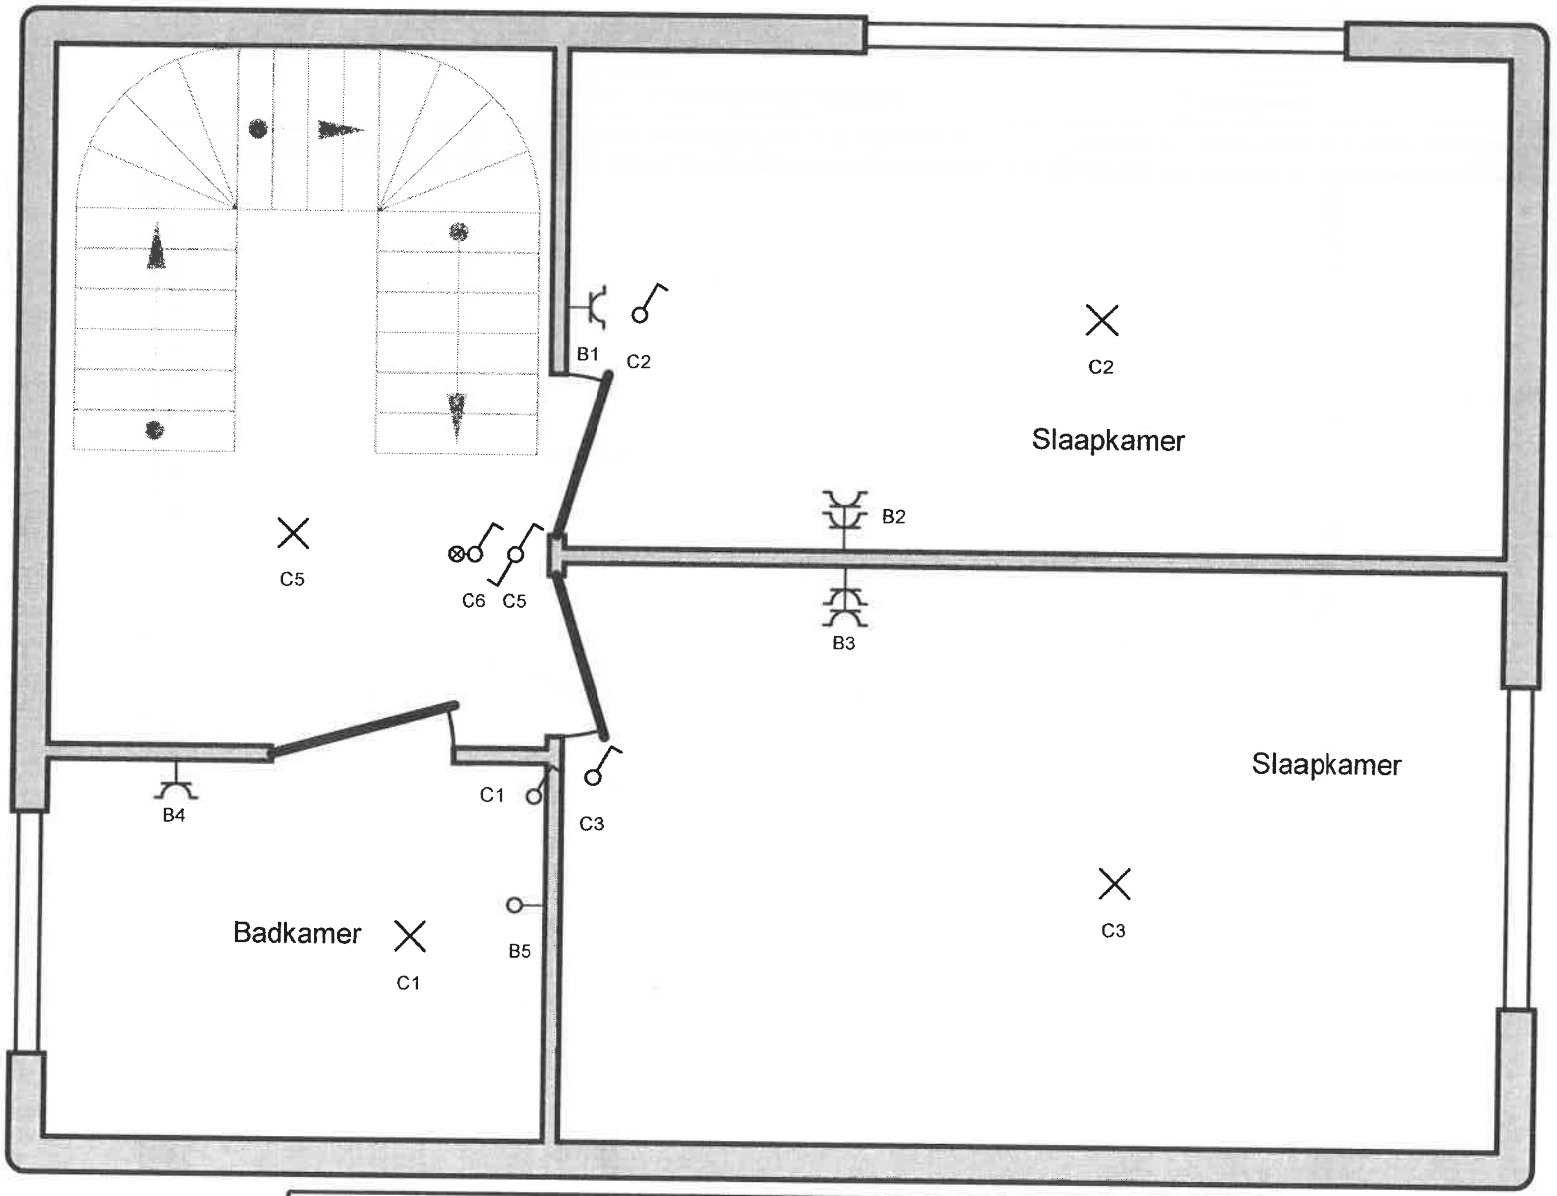

Plaats van de elektrische installatie
Goossens
Kimpelberg 5
2870 Puurs

Installateur
Elektreon
Bareldreef 48
2880 Bornem
e-mail: info@elektreon.be
BE0687970817

p. 4/6
Situatieschema

Datum: 16/03/2019

1 x 230V ~ 50Hz

Zolder

STRAAT

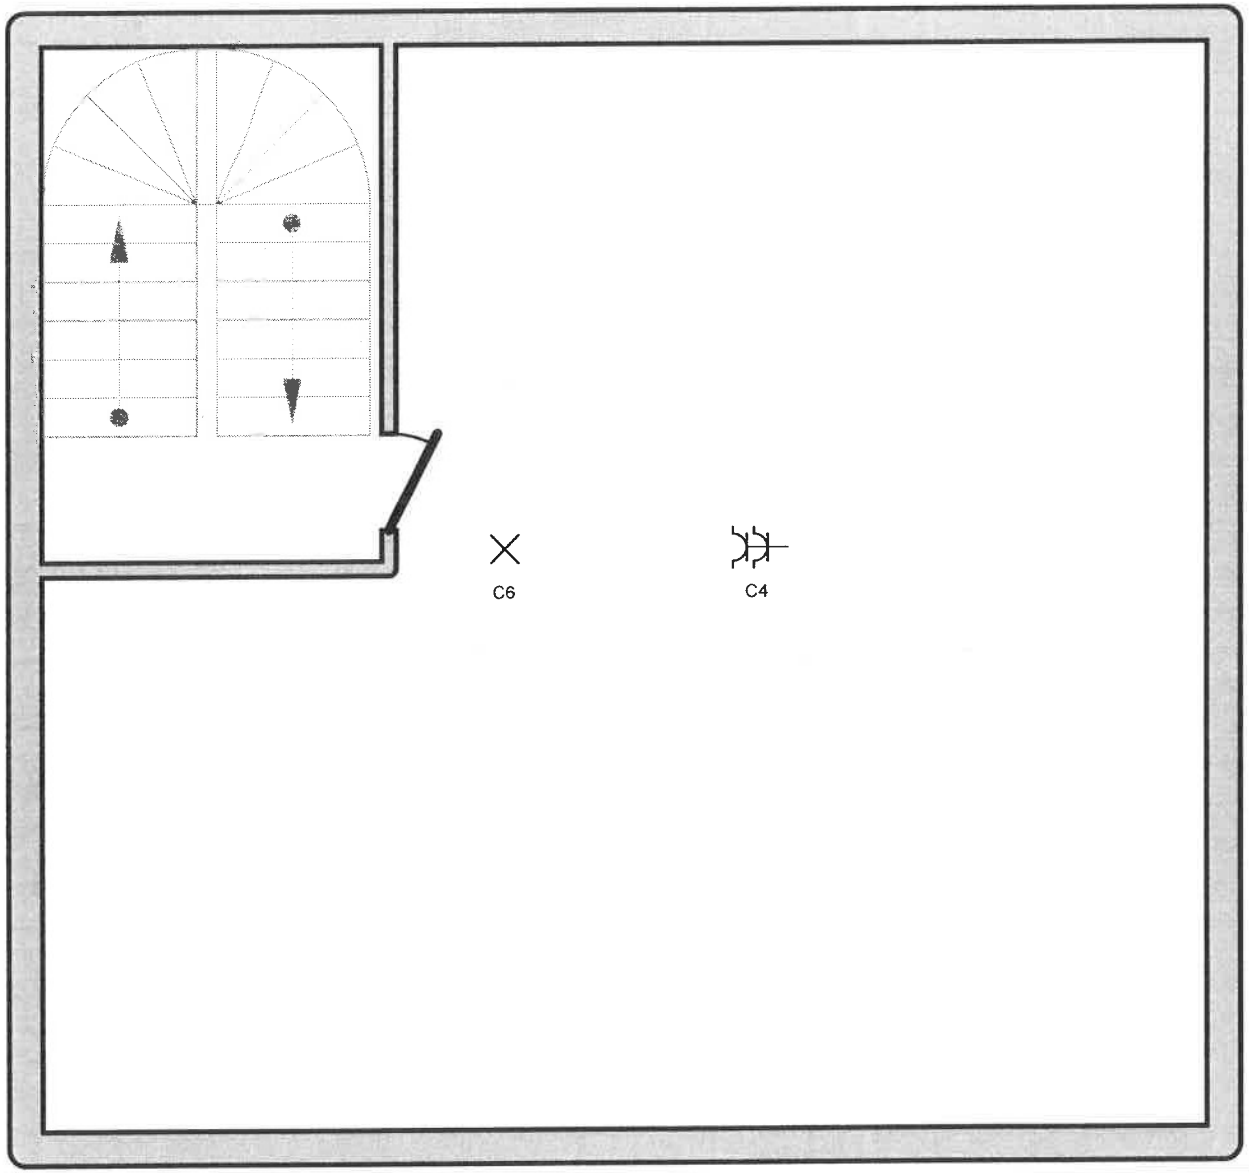

Plaats van de elektrische installatie
Goossens
Kimpelberg 5
2870 Puurs

Installateur
Elektreon
Bareldreef 48
2880 Bornem
e-mail: info@elektreon.be
BE0687970817

Situatieschema

Datum: 16/03/2019

1 x 230V ~ 50Hz

keringskast achteraan
serve
twasser + stopcontact boven aanrecht links
pcontact woonkamer achteraan + berging (kant woonkamer)
pcontacten keuken (zijkant huis)
hten keuken, wc, berging en buitenlichten
okplaat
pcontacten oven + boven aanrecht rechts + dampkap
pcontact berging achteraan
pcontacten 1 ste verdieping
hten 1 ste verdieping en gang gelijkvloers + stopcontact zolder
pcontacten woonkamer (buiten stopcontacct achteraan)+ eetplaats + ng gelijkvloers
hten woonkamer + eetplaats
serve
nepanelen
H teller

Plaats van de elektrische installatie Goossens Kimpelberg 5 2870 Puurs	**Installateur** Elektreon Bareldreef 48 2880 Bornem e-mail: info@elektreon.be BE0687970817	**p. 6/6** **Lijst Kringen** Datum: 16/03/2019 1 x 230V ~ 50Hz
