ACEG vzw
Erkend keuringsorganisme

Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

BELAC 522-INSP
ISO/IEC 17020

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 18/04/2024 **Inspecteur:** Luc De Schutter **Mentor:** **Installateur:** Elektriciteitswerken J. Nuyts Bvba

ID-label:

B.T.W. nr.:BE 0687 761 474

Merk en type meettoestel: Metrel ET61557

Serienummer: 18120206

Datum verslag: 18/04/2024

Klantreferentie:

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Turnhoutsebaan
Huisnummer	175
Busnummer	B
Postcode	2970
Gemeente	Schilde
Land	België

Eigenaar

Naam	Nikias
Straatnaam	Turnhoutsebaan
Huisnummer	175
Busnummer	B
Postcode	2970
Gemeente	Schilde
Land	België

Installateur

Naam	Elektriciteitswerken J. Nuyts Bvba
BTW nr.	BE 0687 761 474
Telefoonnummer	+32 477 46 38 96
E-mail	info@jnuytselektriciteit.be

Type : appartement **EAN** : 541448820048268910 **Teller Nr.:** : 1SAG1105198345

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek: Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 1N400V Meter / bord verbinding: 10 mm^2 Max beveiliging: 63 A

Aantal borden: 1 Aantal kringen: 13

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 1,721 MΩ

OK



RE: 26,1 Ω

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I²t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	13	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	6	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	32		2	6
1	C	16		2	1,5
8	C	20		2	2,5
2	C	16		2	2,5
1	C	40	Hoofdzekering	2	10

Visueel nazicht (algemeen)	OK	**Directe aanraking**	OK	**Indirecte aanraking**	OK
Aansluitingen	OK	**schema in bijlage door Aceg vzw**	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	**Doorsnede geleiders**	OK		
Continuiteit	OK	**Verlichting / toestellen**	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

Aardingsonderbreker bevindt zich in de kruipkelder.

BESLUIT

☑ **De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1.** Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 18/4/2049

☑ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

☑ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Luc De Schutter

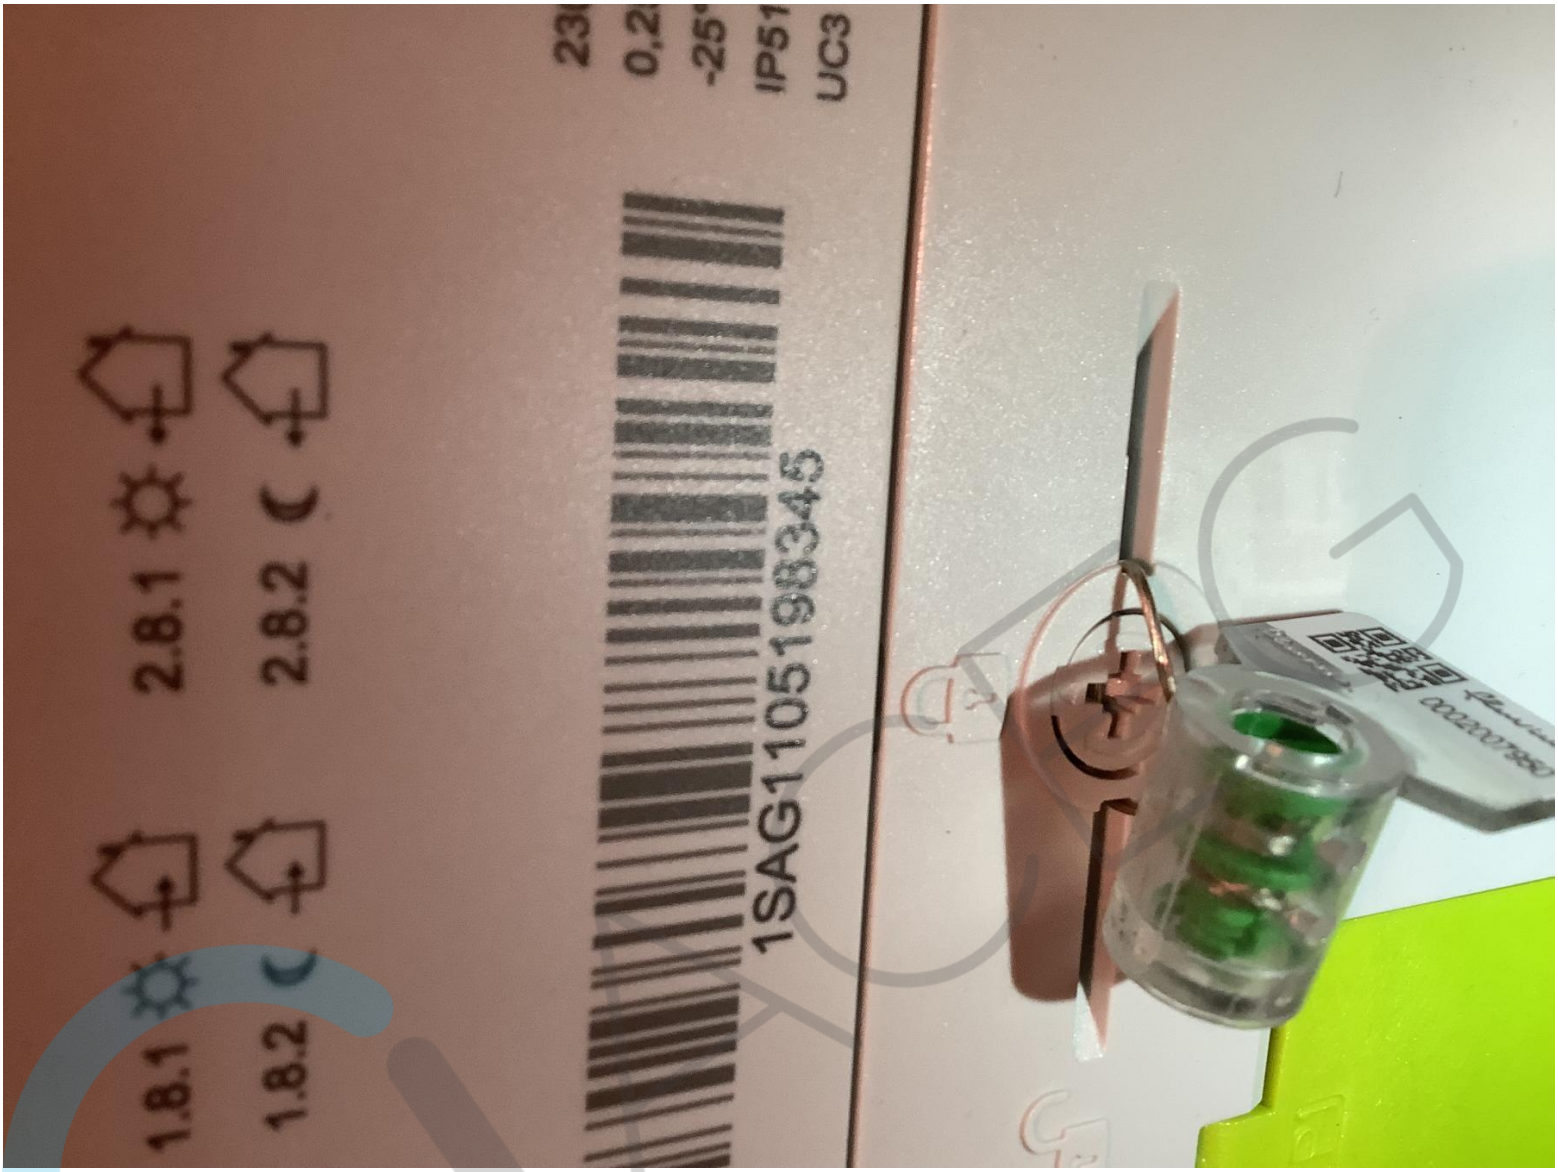


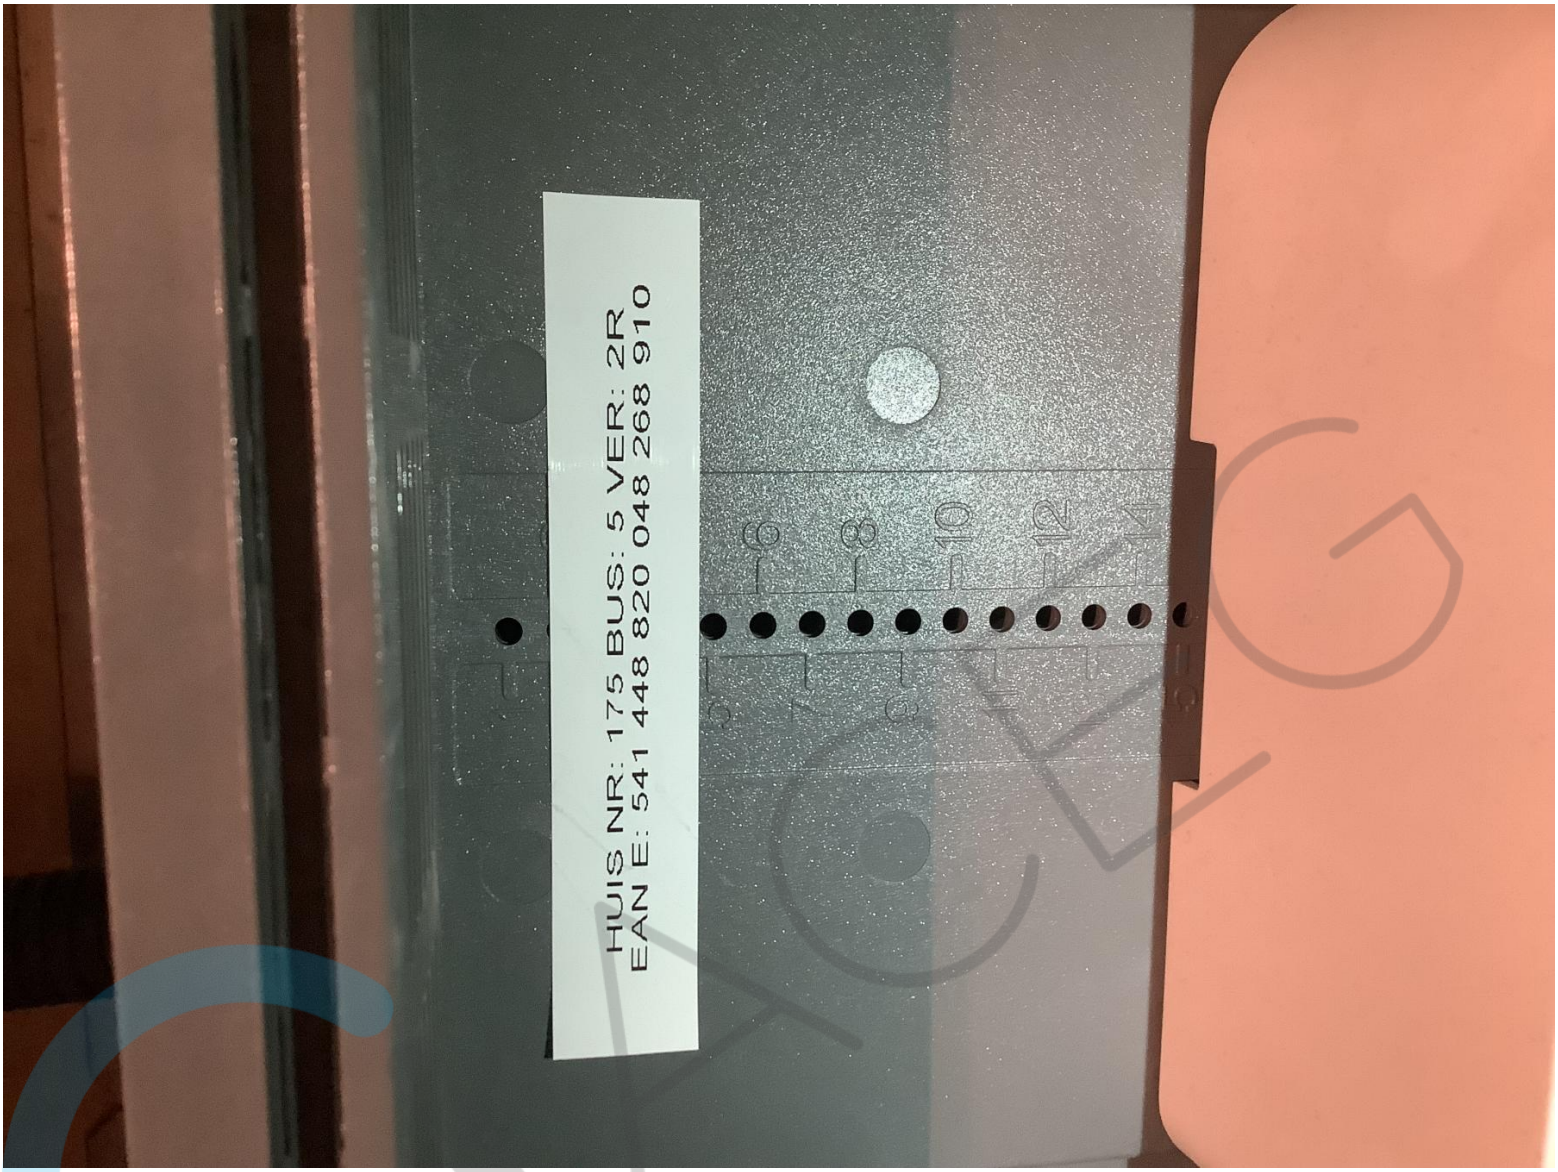
Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.
Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

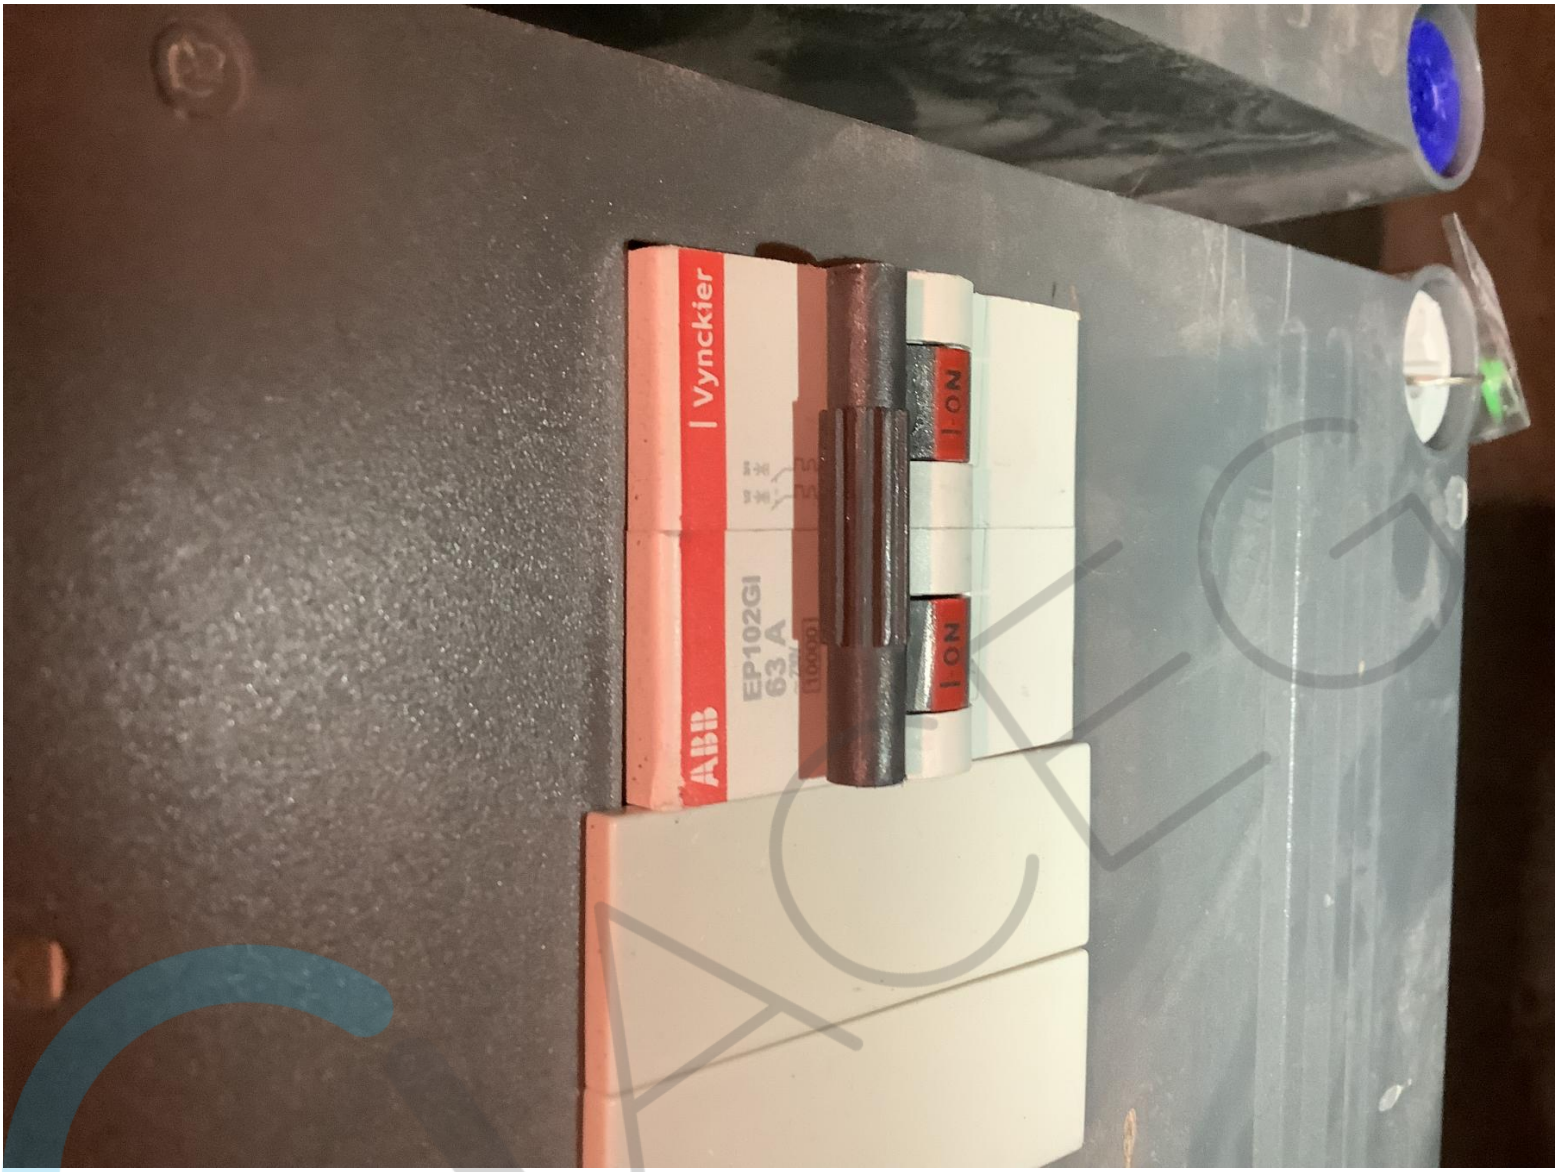
Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

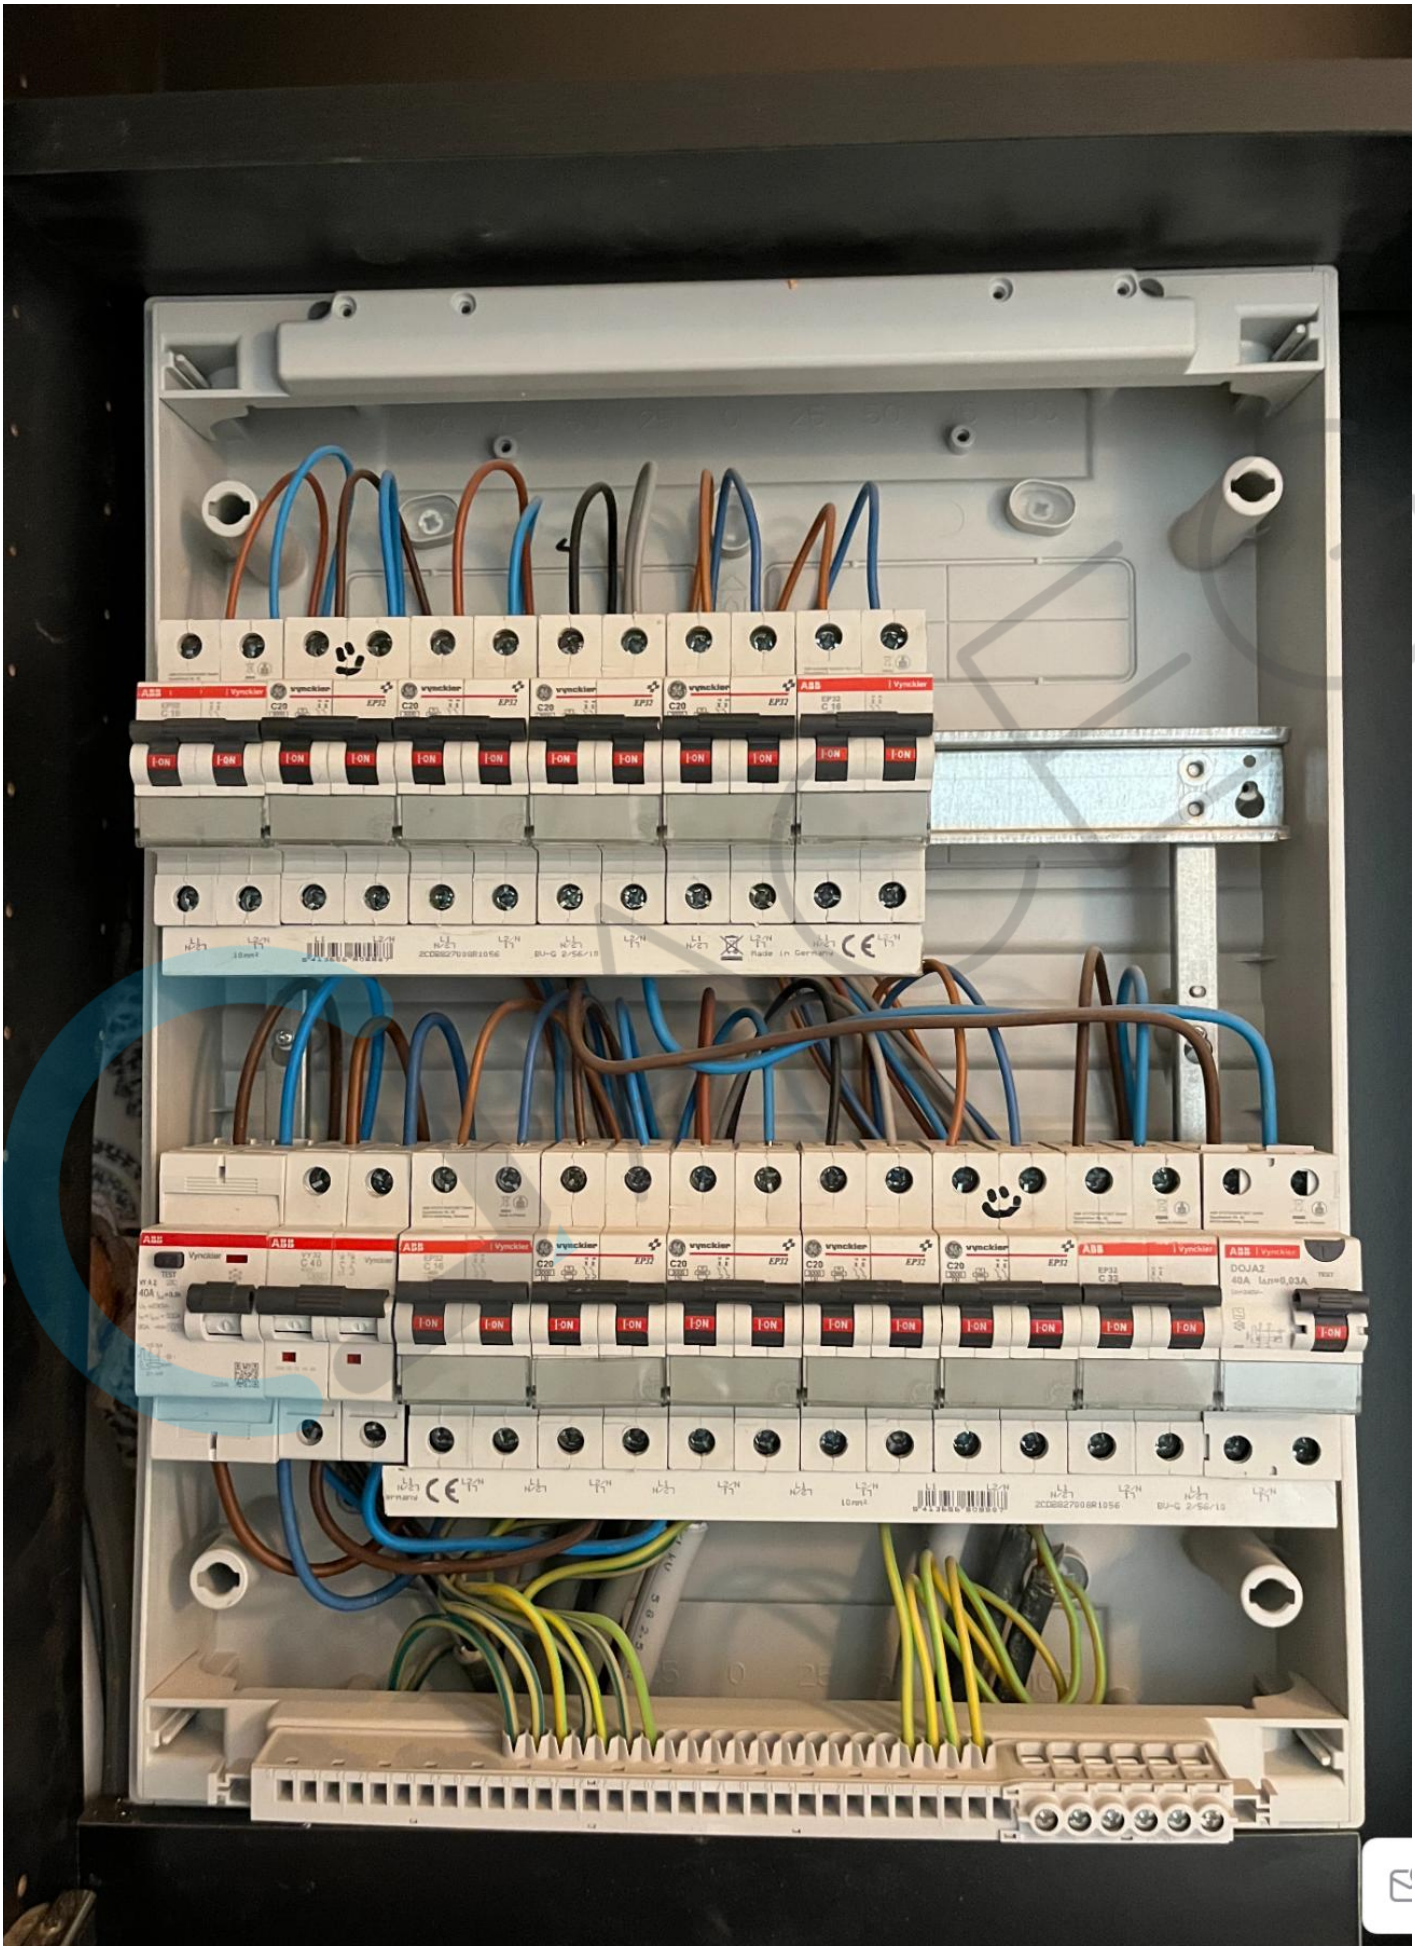
Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	**Stap 2**	**Stap 3**	**Stap 4**
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 18/4/2049	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.


ABB Vynckier
Fix-O-Rail 15Q
230V/N
B
C
D
E
F
G
A
H
I
J
K
L
M


2.8.1
2.8.2
1.8.1
1.8.2
1SAG110519R0345
IP51
UC3

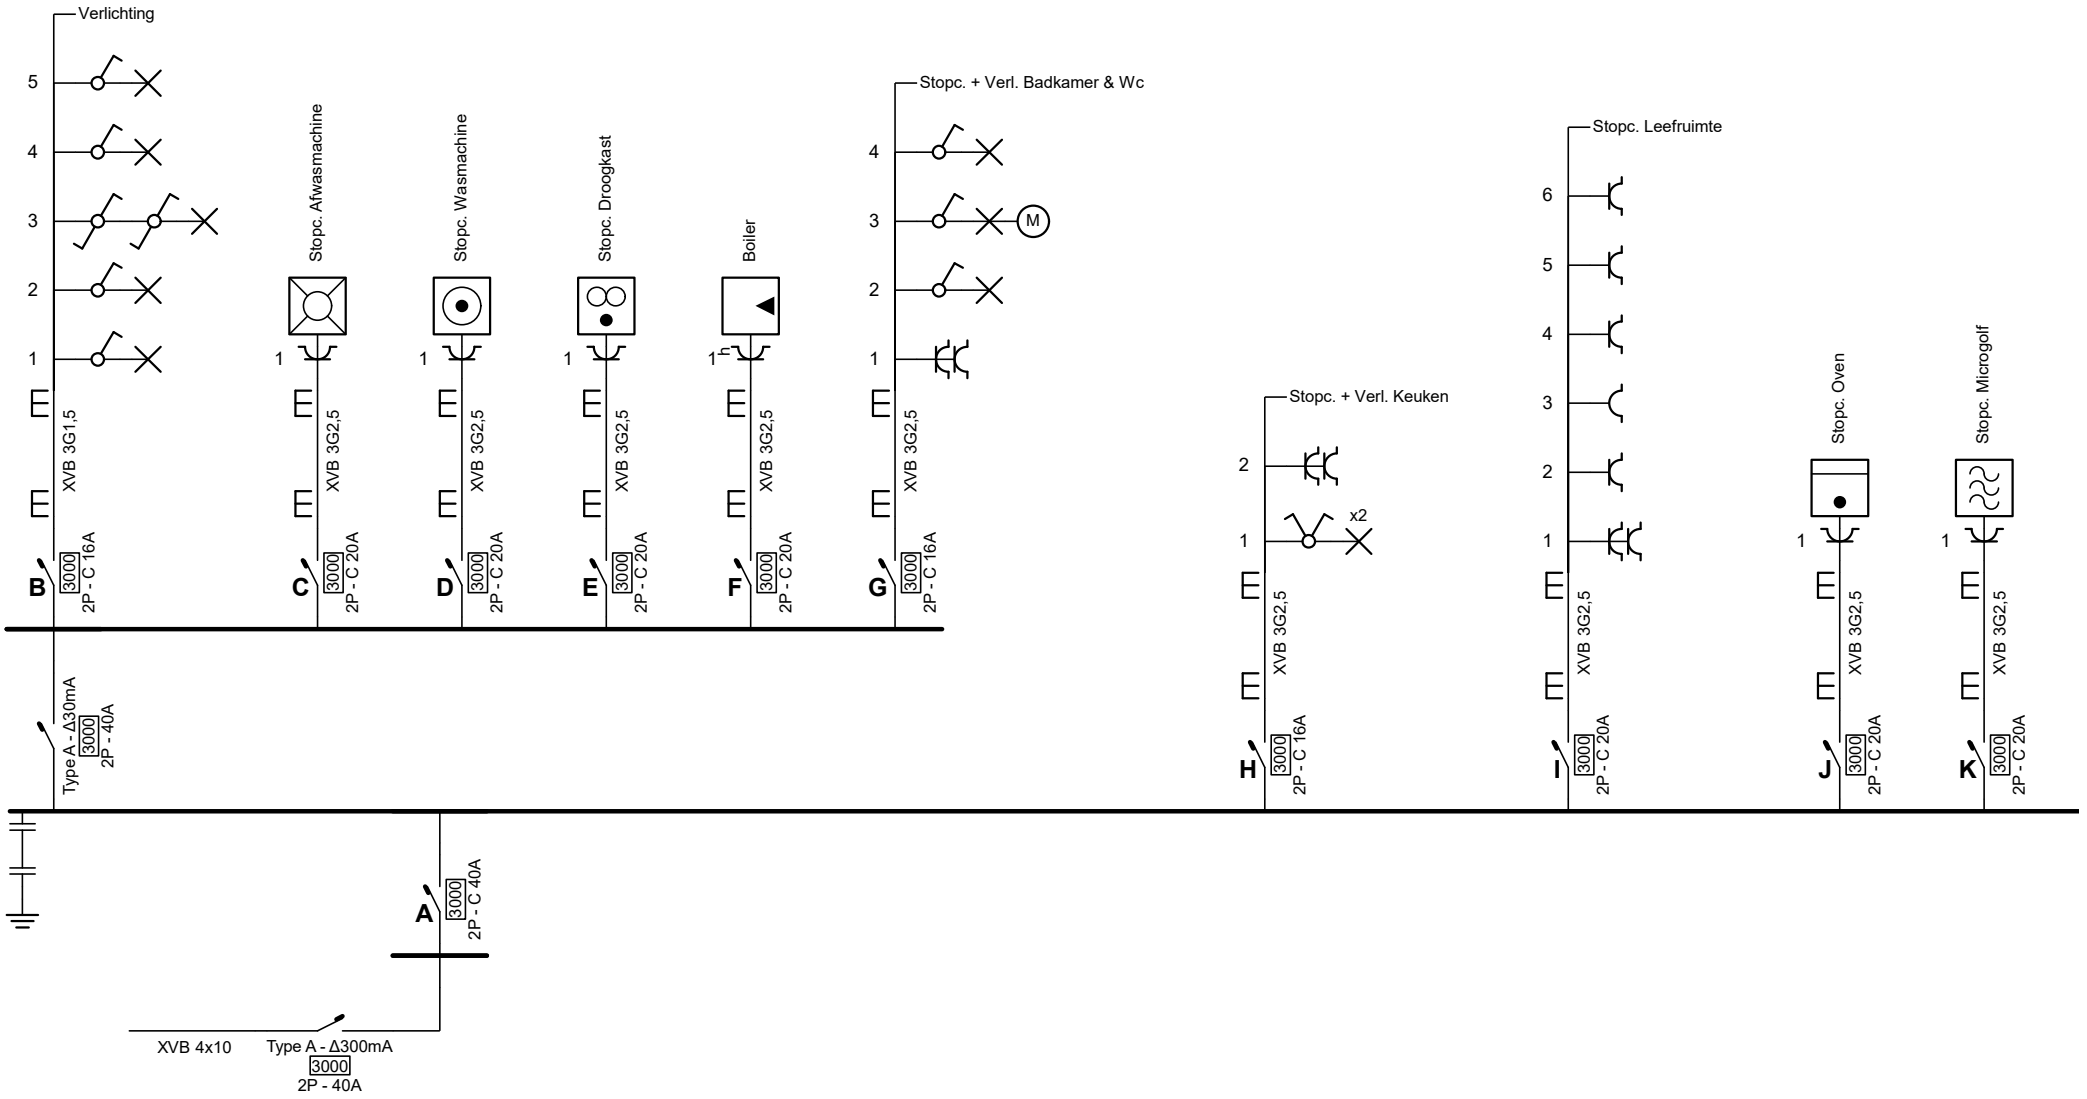

HUIS NR: 175 BUS: 5 VER: 2R
EAN E: 541 448 820 048 268 910


ABB
Vynckier
EP102GI
63 A
ON
ON


ABB
Vynckier
C20
EP32
I·ON
Made in Germany


Eurotest 61557
METREL
R EARTH 30Ω
26.1Ω
RS 0.0kΩ
RP 0.0kΩ
FUNC H1m
F1
F2
F3
F4
RLOOP
PE
ZLOOP
PE
ZLINE
RCD
PE
LOCATOR


STANLEY
Eurotest 61557
METREL
500V 0.50MΩ
172.1 MΩ Um 522V
ESC
SETUP
ON/OFF
F1
F2
F3
F4
RCD
PE



18/04/2024

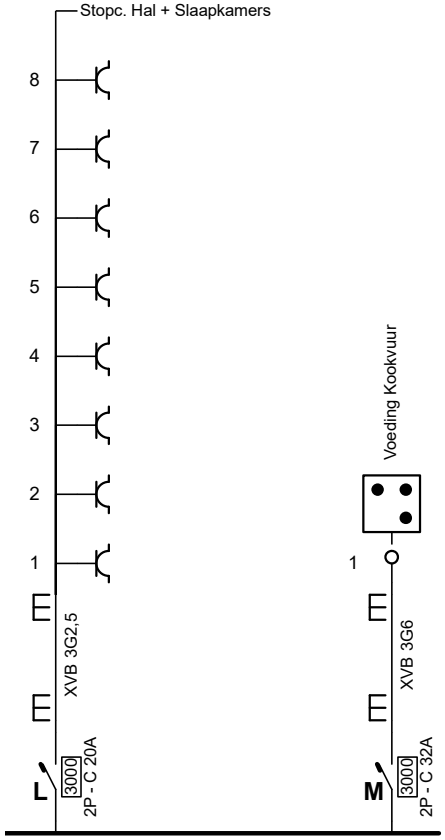
Luc De Schutter 263

Plaats van de elektrische installatie
Nikias Van Winckel
Turnhoutsebaan 175 B (1ste V. Links)
2970 Schilde

Installateur
Elektriciteitswerken J. Nuyts Bvba
Paleisstraat 82
2018 Antwerpen
GSM: +32 477 46 38 96
e-mail: jorne_nuyts@hotmail.com
BTW BE 0687.761.474

p. 1/3
Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz



18/04/2024

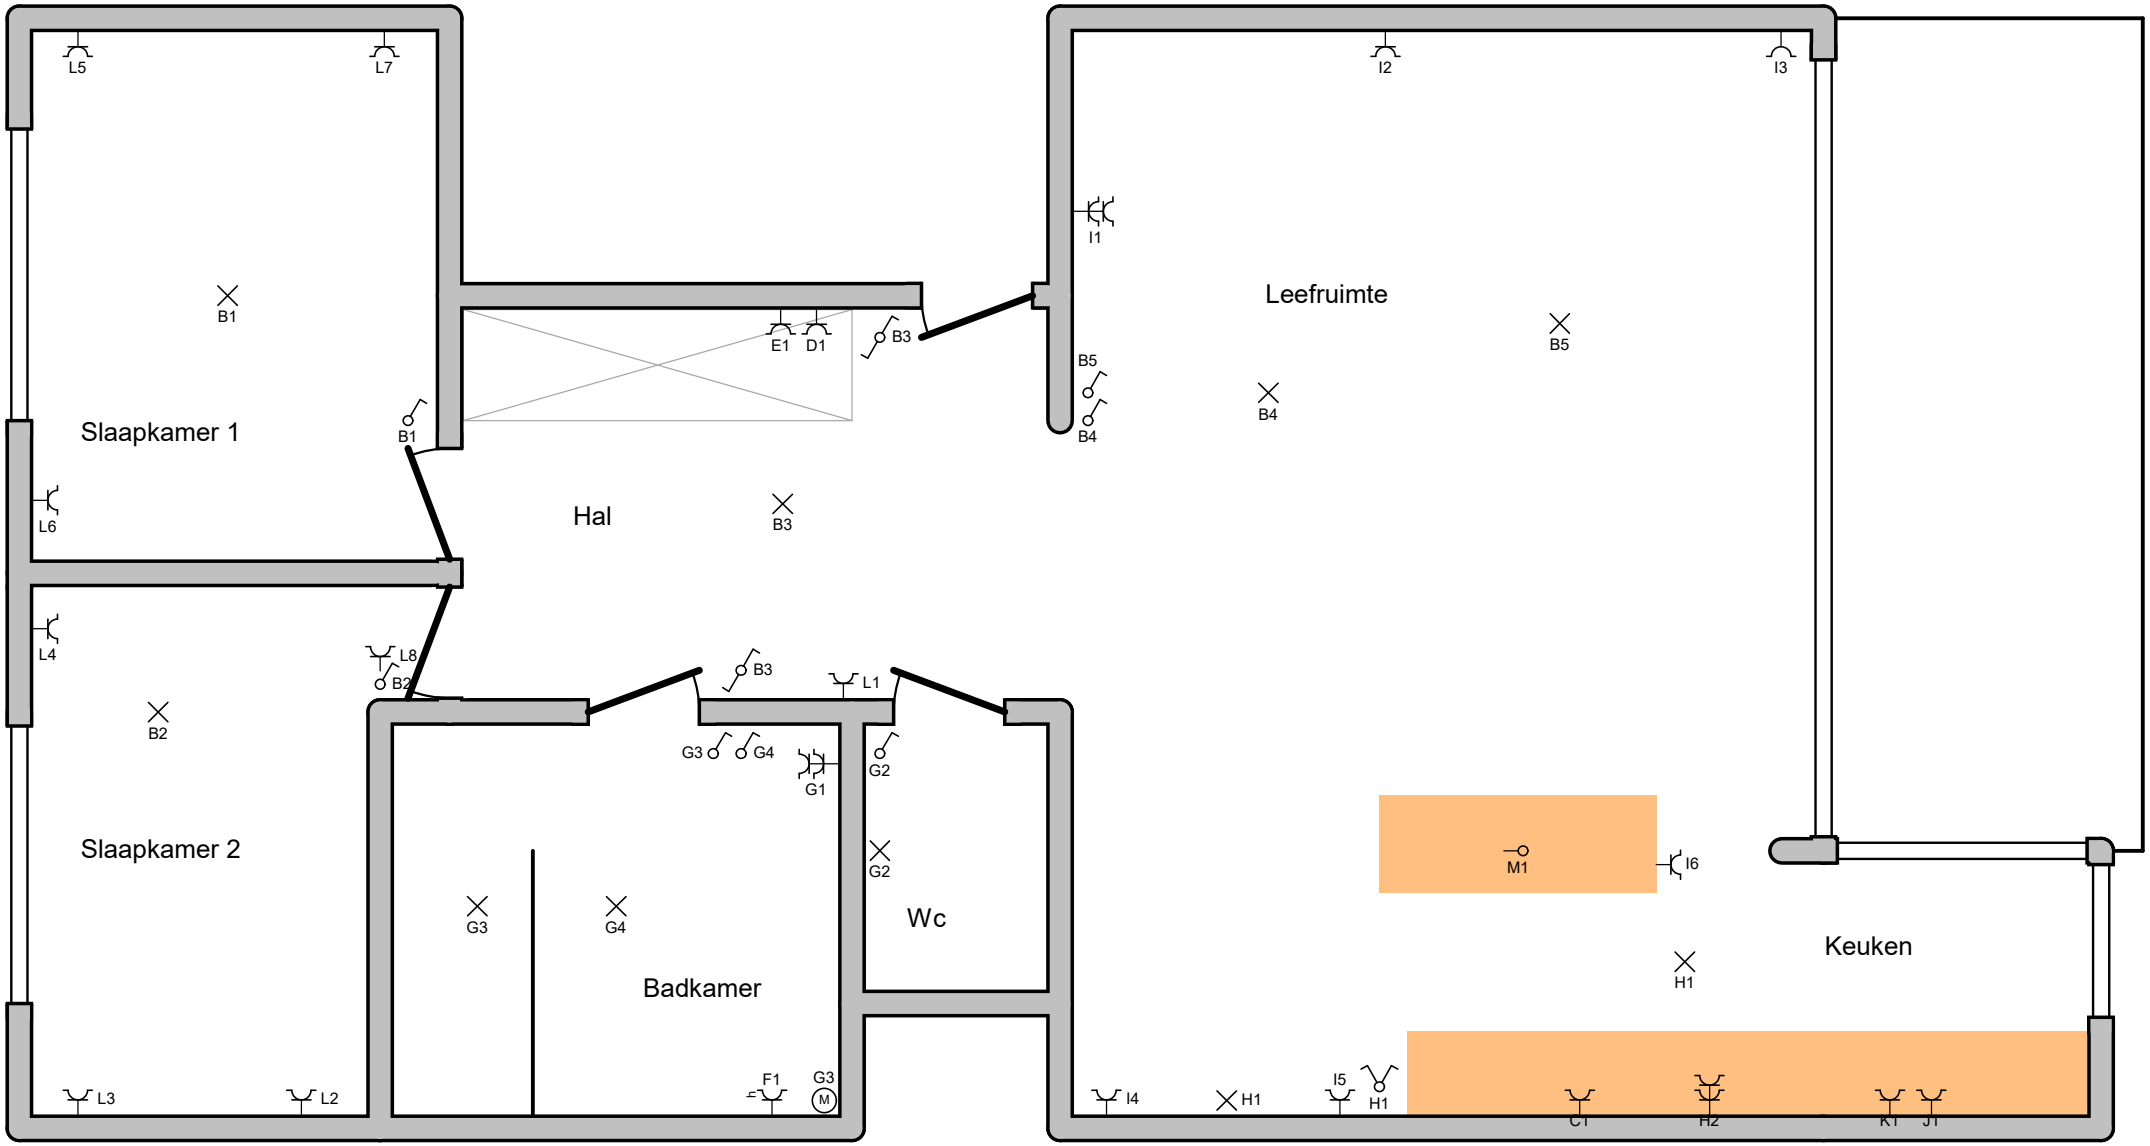
Luc De Schutter

Plaats van de elektrische installatie
Nikias Van Winckel
Turnhoutsebaan 175 B (1ste V. Links)
2970 Schilde

Installateur
Elektriciteitswerken J. Nuyts Bvba
Paleisstraat 82
2018 Antwerpen
GSM: +32 477 46 38 96
e-mail: jorne_nuyts@hotmail.com
BTW BE 0687.761.474

Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz



18/04/2024

Luc De Schutter

Plaats van de elektrische installatie
Nikias Van Winckel
Turnhoutsebaan 175 B (1ste V. Links)
2970 Schilde

Installateur
Elektriciteitswerken J. Nuyts Bvba
Paleisstraat 82
2018 Antwerpen
GSM: +32 477 46 38 96
e-mail: jorne_nuyts@hotmail.com
BTW BE 0687.761.474

p. 3/3
Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz
