ACEG vzw
Erkend keuringsorganisme

Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

BELAC 522-INSP
ISO/IEC 17020

Inspectieverslag van een Aardgasbinneninstallatie

Datum keuring: 29/11/2022	**Inspecteur:** Yoni Genicot	**Mentor:**
Datum verslag: 29/11/2022	**ID-label:**	**Klantreferentie:**

Merk en type meettoestel: Testo 312-3 **Serienummer:** 03127157/611

Plaats van het onderzoek	
Straatnaam	Leopold Beosierlaan
Huisnummer	33
Busnummer	0201
Postcode	3010
Gemeente	Leuven
Land	

Eigenaar	
Naam	, beosier
Straatnaam	Leopold Beosierlaan
Huisnummer	33
Busnummer	0201
Postcode	3010
Gemeente	Leuven
Land	

Opdrachtgever	
Naam contactpersoon	, beosier
Telefoon	32478591518
Gsm nr. (SMS)	+32 478 59 15 18

Installateur	
Naam	, beosier
BTW nr.	BE 757 968 688
Telefoonnummer	+32 478 59 15 18
E-mail	bert@immolivit.be

TYPE

- [x] **1e Indienstelling**
- [ ] **Aanpassing**
- [ ] **Periodiek onderzoek**

GECONTROLEERD GEDEELTE

- [x] **NBN D51-003**
- [ ] **NBN D51-004**
- [x] **NBN/DTD B61-002**
- [ ] **Dichtheidsproef volgens punt 3**

1. GEGEVENS

- [ ] **Meter dient nog te worden geplaatst**

Distributienetbeheerder:	Fluvius	**EAN:**	541448860021886496
			Niet meegedeeld
Teller Nr:	21049638	**Index:**	0.0012 m3



G:	4	**Qmax:**	6 m3/h
Pmax:	200mbar	**Soort gas:**	Aardgas G20

Druk aan teller of tank:	21 mbar
Opstellingsplaats:	Technische kast



2. INSTALLATIE

ElgaCert digitaal conformiteitsattestnummer

N.v.t.

Art. 48 nummer(s)

#	Nummer
1	1634077

3. DICHTHEIDSPROEF

Uitgevoerd met:	☑ **Druk**	150 mbar
	☐ **Teller Nr**	**Merk:** **Precisie + tijd dichtheidscontrole** ☐ **0,0000m3 (10 min)** ☐ **0,000m3 (10 min)** ☐ **0,00m3 (100 min)** ☐ **0,0 m3 (andere teller of debietmeter gebruiken)**
	☐ **Debietmeter**	**Merk:** **Type:** **Precisie:**
	☐ **Zeep of schuim**	
Waargenomen lekdebiet:	☑ **Nieuwe installatie**	☑ **Geen lek: OK** ☐ **Lek waargenomen: NOK**
	☐ **Bestaande installatie**	☐ **≤ 6L/h OK** ☐ **> 6L/h en ≤12L/h : NOK** ☐ **> 12L/h: NOK en verwittigen maatschappij**

4. AANGESLOTEN TOESTELLEN

Aangesloten toestellen

1	**Merk / Model:**	De Dietrich
	Type:	Type C 13
	Categorie:	I2E(s)
	Pn in kW:	24
	Serie Nr:	213538803
	Bouwjaar:	21



Opstellingsplaats: Technische ruimte



Uitmonding schouw: Zichtbaar



5. INBREUKEN, OPMERKINGEN EN NOTA'S

Opmerking	Extra detail
nota/note 1.1 De door de fabrikant aanbevolen autovulkaniserende wikkelband of thermokrimpkous is nog aan te brengen op elke PLT fitting. Dit is nodig om het indringen van vocht tussen de kunststof mantel en de roestvast stalen plooibare gegolfde buis te voorkomen en om het losmaken van de fitting door onbevoegden te	

vermijden.Indien dit niet gebeurt, bestaat de kans dat de distributienetbeheerder de gasteller niet in dienst zal nemen.

6. BESLUIT

☑ **De gasinstallatie voldoet aan de normen zoals bovenaan aangeduid.**

Vrijgave van het keuringsverslag

De inspecteur Yoni Genicot







A 1634066

GETUIGSCHRIFT AF TE LEVEREN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER (DNB)
VOOR HET OPENEN VAN DE GASMETER OVEREENKOMSTIG
HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 JUNI 1971

Ondergetekende : Naam :TORFS Voornaam :Jaffy
Vertegenwoordiger van de onderneming :Jaffy B.T.W. nr:0[illegible]
Straat :SPEKSTRAAT Nr. :9 Bus :
Postcode: 3[illegible] Gemeente :Herent Tel: Fax:
(in geval van onderaanneming, voor rekening van de firma:
Adres + tel:)
bevestigt formeel en garandeert hierbij de gasinstallatie
nieuwe installatie / ~~**nieuw gedeelte van installatie**~~ (het onnodige schrappen) volgens het plan hierna
in het gebouw gelegen te :Straat :Leopold Vreuren laan Nr. 33 Bus 02a Verdieping: 2.
Postcode :3010 Gemeente :Leuven
Gasmeter merk: t.b.m.v. gasmeter nummer: 2104963[illegible]
voor rekening van : Naam :(idem) Voornaam :
Straat : Nr.: Bus :
Postcode : Gemeente :

- te hebben geplaatst volgens de betrokken voorschriften die momenteel van toepassing zijn, waaronder de normenreeksen NBN D 51 en NBN B 61 en de technische aanbevelingen van Gas.be en Cerga. Deze normen en regels van goed vakmanschap hebben zowel betrekking op de leidingen als op de toestelgebonden eisen, zoals de toevoer van verse verbrandingslucht en de afvoer van de verbrandingsproducten. Alleen gastoestellen conform de specifieke normen van aardgastoestellen zijn aangesloten op de binneninstallatie.
- te hebben beproefd op dichtheid.

Dit getuigschrift moet aan de aardgasdistributienetbeheerder overhandigd worden vóór deze de gasmeter opent.


Voorbehouden aan de installateur:	**Voorbehouden aan de DNB:**
Ik verklaar dat ik een "Cerga–professionele gasinstallateur" ben	
☐ ja ☒ neen	
indien ja: Cerga nr:	

Datum: 28/11/2022
Handtekening + naam

Bijlage(n) .....

ISOMETRISCH SCHEMA VAN DE INSTALLATIE

Duid volgende elementen aan op het isometrisch schema: de gasmeter, de leidingen met materiaalsoort (Koper-Staal-PE), hun diameter en lengte (m), de knooppunten aangeduid d.m.v. hoofdletters A, B,…, het soort toestellen met merk, type en vermogen (kW).
Dit schema mag vervangen worden door een schema/ plan dat minstens dezelfde gegevens bevat.

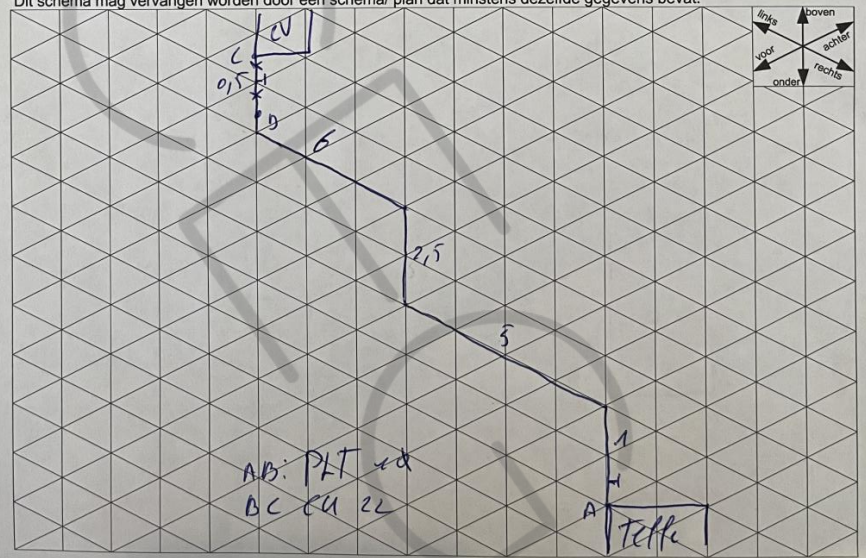

Wit: DNB – Roze: Klant – Groen: Controleorganisme – Geel: Installateur

Model 710628/15


De Dietrich
7770041 - Comm. 7770041
MCR-S 24/28 MI
230 V~50 Hz - 85 W - IP X5D
CN1=26 CN2=21
s/n: 213538803
3P - G31 - 30 mbar (LU)
7746443




UNIFLO
G4SRTV
S4
S/N: 21049638
Bouwjaar: 2021
M21 1259
DK-0200-MID-04171
EN1359:2017 Class 1.5
EN16314:2013
7FLO2121049638
FLONIDAN
Islandsvej 29
DK-8700 Horsens
huisnr 33 .bus 0201
ean 541 448 860 021 886 496
fluvius.
Alle info
www.fluvius.be
Gasgeur?
0800 65 0 65
Onderbreking of defect?
078 35 35 00

A 1634066

GETUIGSCHRIFT AF TE LEVEREN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER (DNB)
VOOR HET OPENEN VAN DE GASMETER OVEREENKOMSTIG
HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 JUNI 1971

Ondergetekende : Naam :TORFS Voornaam :JEFFY
Vertegenwoordiger van de onderneming :JEFFY B.T.W. nr:0[illegible]
Straat :SPEKSTRAAT Nr. :9 Bus :
Postcode: 3[illegible] Gemeente :HERENT Tel: Fax:
(in geval van onderaanneming, voor rekening van de firma:
Adres + tel:)
bevestigt formeel en garandeert hierbij de gasinstallatie
nieuwe installatie / ~~**nieuw gedeelte van installatie**~~ (het onnodige schrappen) volgens het plan hierna
in het gebouw gelegen te :Straat :Leopold Vreuren laan Nr. 33 Bus 02a Verdieping: 2.
Postcode :3010 Gemeente :Leuven
Gasmeter merk: Elster gasmeter nummer: 2104963[illegible]
voor rekening van : Naam :(idem) Voornaam :
Straat : Nr.: Bus :
Postcode : Gemeente :

- te hebben geplaatst volgens de betrokken voorschriften die momenteel van toepassing zijn, waaronder de normenreeksen NBN D 51 en NBN B 61 en de technische aanbevelingen van Gas.be en Cerga. Deze normen en regels van goed vakmanschap hebben zowel betrekking op de leidingen als op de toestelgebonden eisen, zoals de toevoer van verse verbrandingslucht en de afvoer van de verbrandingsproducten. Alleen gastoestellen conform de specifieke normen van aardgastoestellen zijn aangesloten op de binneninstallatie.
- te hebben beproefd op dichtheid.

Dit getuigschrift moet aan de aardgasdistributienetbeheerder overhandigd worden vóór deze de gasmeter opent.


Voorbehouden aan de installateur:	**Voorbehouden aan de DNB:**
Ik verklaar dat ik een "Cerga–professionele gasinstallateur" ben ☐ ja ☒ neen indien ja: Cerga nr:	.....

Datum: 28/11/2022
Handtekening + naam

Bijlage(n) .....

ISOMETRISCH SCHEMA VAN DE INSTALLATIE

Duid volgende elementen aan op het isometrisch schema: de gasmeter, de leidingen met materiaalsoort (Koper-Staal-PE), hun diameter en lengte (m), de knooppunten aangeduid d.m.v. hoofdletters A, B,…, het soort toestellen met merk, type en vermogen (kW).
Dit schema mag vervangen worden door een schema/ plan dat minstens dezelfde gegevens bevat.

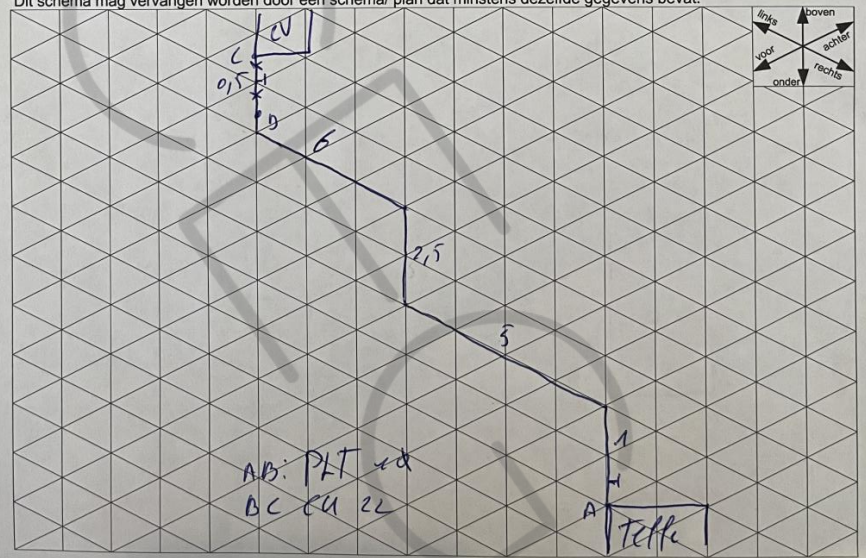

Wit: DNB – Roze: Klant – Groen: Controleorganisme – Geel: Installateur

Model 710628/15
