BELTEST
N° 294-I

ET

ELECTRO-TEST V.Z.W. ASBL Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : Gestionnaire de réseau de distribution : ..... Telenet	Nr teller : N° comp : .....

Verslag van onderzoek
Rapport de contrôle

N° : 23 / 0740 / 07

Aard onderzoek : Nature du contrôle :	AREI 86	87	88	95	97	270	271	276	TT TN IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
	RGIE ●	○	○	○	○	●	○	○	● ○ ○	●

Tijdelijk : Temporaire : ○	Kermisinstallatie : Install. Foraine : ○	Indienststelling : Mise en service : ●	Uitbreiding : Extension : ○	Vernieuwing : Renouvellement : ○

Plaats van het onderzoek : Guido Gezellestr. 58 9470 Denderleeuw
Lieu du contrôle : .....

Eigenaar Propriétair: [redacted] Adres : Adresse : /

Installateur : Stijnen Wim BTW / TVA : 826 432 997
Datum van het onderzoek : [redacted] Ik. / C.I. : /
Date du contrôle : Inspecteur : De Smedt Kurt
Onderzoek / Contrôle : ○ Woning / maison ● Appart. 6 (e) ○

Spanning : Tension : 2 x 230 V	Meter / bord verbinding : Liaison compteur-tableau : 4 x 6 mm²	Max. beveiliging : Prot. maximale : 1 x 40 A
Aardelectrode : Electrode de terre : 1,1 Ohm	Isolatie : Isolement : 24,2 Mohm	Aantal verdeelborden : Nombre de tableaux : 1

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels		Beschermde kringen - Circuits protégés : 12	AREI / RGIE	
In (A)	Δ In (mA)		270	276
40A	300mA	1 Hoofdafd → A.v.L	●	○
40A	30mA	1 Bykom afd → A.v.L	●	○
			○	○
			○	○
			○	○
			○	○
			○	○
			○	○

Opmerkingen / Remarques : *(zie keerzijde / voir verso)*	***VISUM :***
geen	***Datum/date :***

Besluit / Conclusion

De installatie is — ~~niet~~ — conform met het AREI en mag — ~~niet~~ — ~~tijdelijk~~ — in dienst gesteld worden — ~~in dienst blijven~~.
L' installation est — ~~n'est pas~~ — conforme au RGIE et peut — ~~ne peut pas~~ — ~~temporairement~~ — être mise en service — ~~rester en service~~.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l' art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 18 / 08 / 2030
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de technisch directeur, de inspecteur: pour l'inspecteur technique, le contrôleur: .....

NOTA ONDERNEMINGEN : Krachtens art. 14 van het hoofdstuk II van Titel II van de Codex moet dit document ter kennis worden gebracht van het Comité voor Preventie en Bescherming van het Werk.
NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachtens het AREI bent u verplicht : 1) dit proces verbaal te bewaren in het dossier v/d elektrische installatie ; 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier; 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken, direkte elektr. energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

NOTE AUX ENTREPRISES : Conformément à l'art. 14 du chapitre II du Titre II du Codex ce document doit être porté à la connaissance du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail.
NOTE AUX LOCATAIRES ET PROPRIETAIRES : Conformément au RGIE vous êtes tenu : 1) de conserver ce procès-verbal dans le dossier de l'installation électrique; 2) de noter dans le dossier toute modification apportée à l' installation électrique; 3) de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Economiques, direction "énergie électrique" tout accident survenu aux personnes, à imputer directement ou indirectement à la présence d' électricité.

TEL. : (02) 751.98.39
FAX : (02) 751 52 09
info@electro-test.be

Dexia 068-2117692-15
www.electro-test.be

KBC : 734-1126000-33
IBAN: BE 79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBB

BE 0434.433.603
RPR Brussel

LEGENDE APPARTEMENT 6 (C1)

A = licht

B = licht

C = elektrisch vuur

D = stopkontakt slaapkamer

E = badkamer

F = stopkontakt berging + living

G = vaatwas

H = droogkast

I = wasmachine

J = frigo + microgolf

K = stopkontakt keuken

L = centrale verwarming


M = diff. 30 mA/40A

N = diff. 300mA/40A


Spanning 400 V+N **Datum:**	**Installateur: Segers Wim** **B.T.W. : BE-0869829979**	**Erkend controle-organisme** **Naam** **Adres**
Guido Gezellestraat 58 **9470 Denderleeuw**	**Handtekening**	**Handteking** ELECTRO-TEST Kurt DE SMEDT G.s.m. : 0473/66 93 14

C1

N
M
Δ 300 mA / 40A
Δ 30 mA / 40A
XVB 2 x 10 mm²
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
16A
16A
16A
20A
20A
20A
20A
20A
20A
20A
20A
Flex 3G 1,5 mm²
Flex 3G 1,5 mm²
Flex 3G 6 mm²
Flex 3G 2,5 mm²
Flex 3G 2,5 mm²
Flex 3G 2,5 mm²
Flex 3G 2,5 mm²
Flex 3G 2,5 mm²
Flex 3G 2,5 mm²
Flex 3G 2,5 mm²
Flex 3G 2,5 mm²

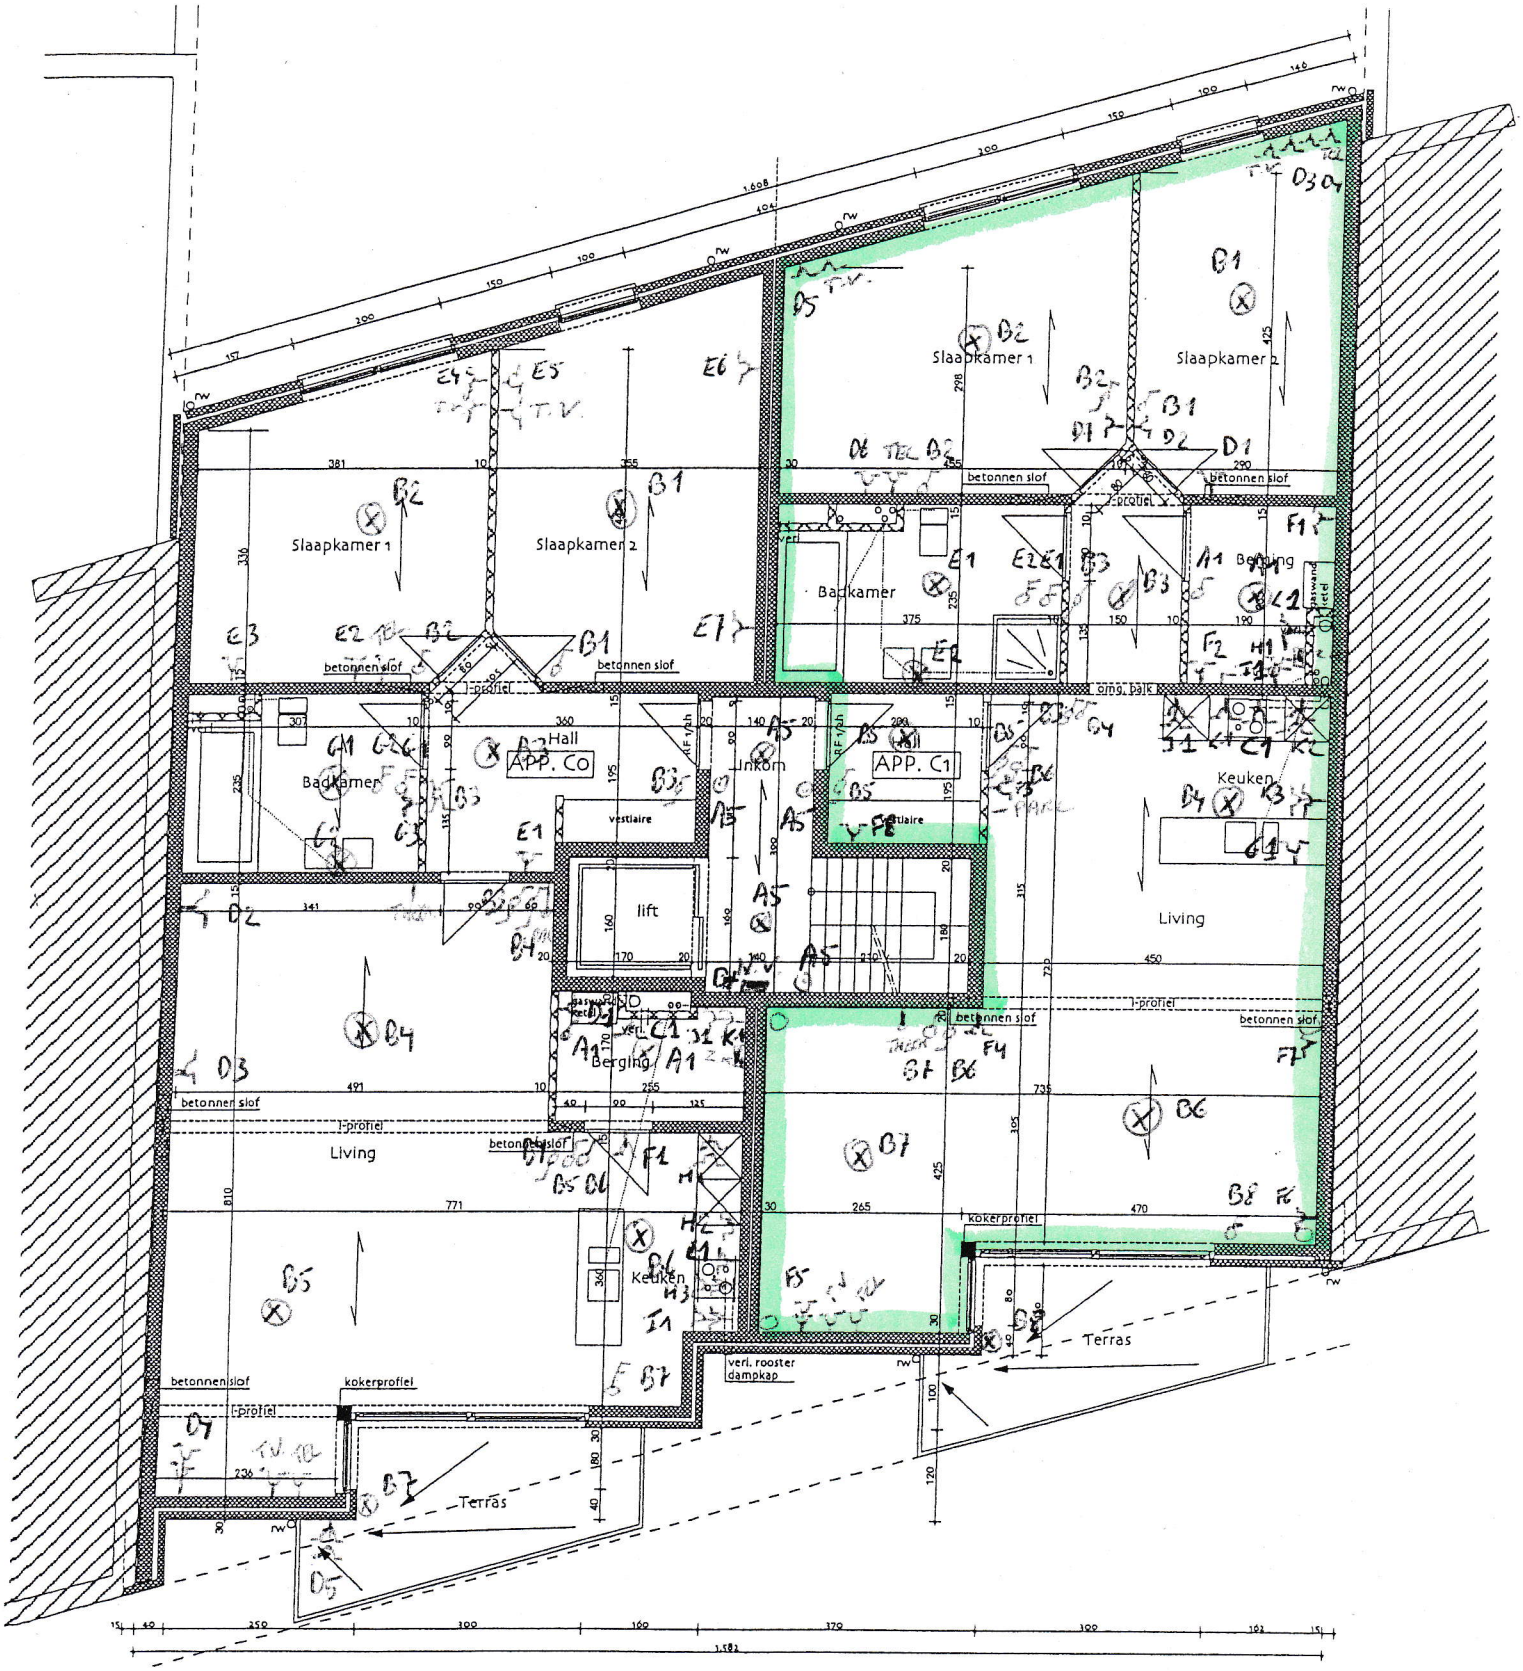

2° VERDIEPING

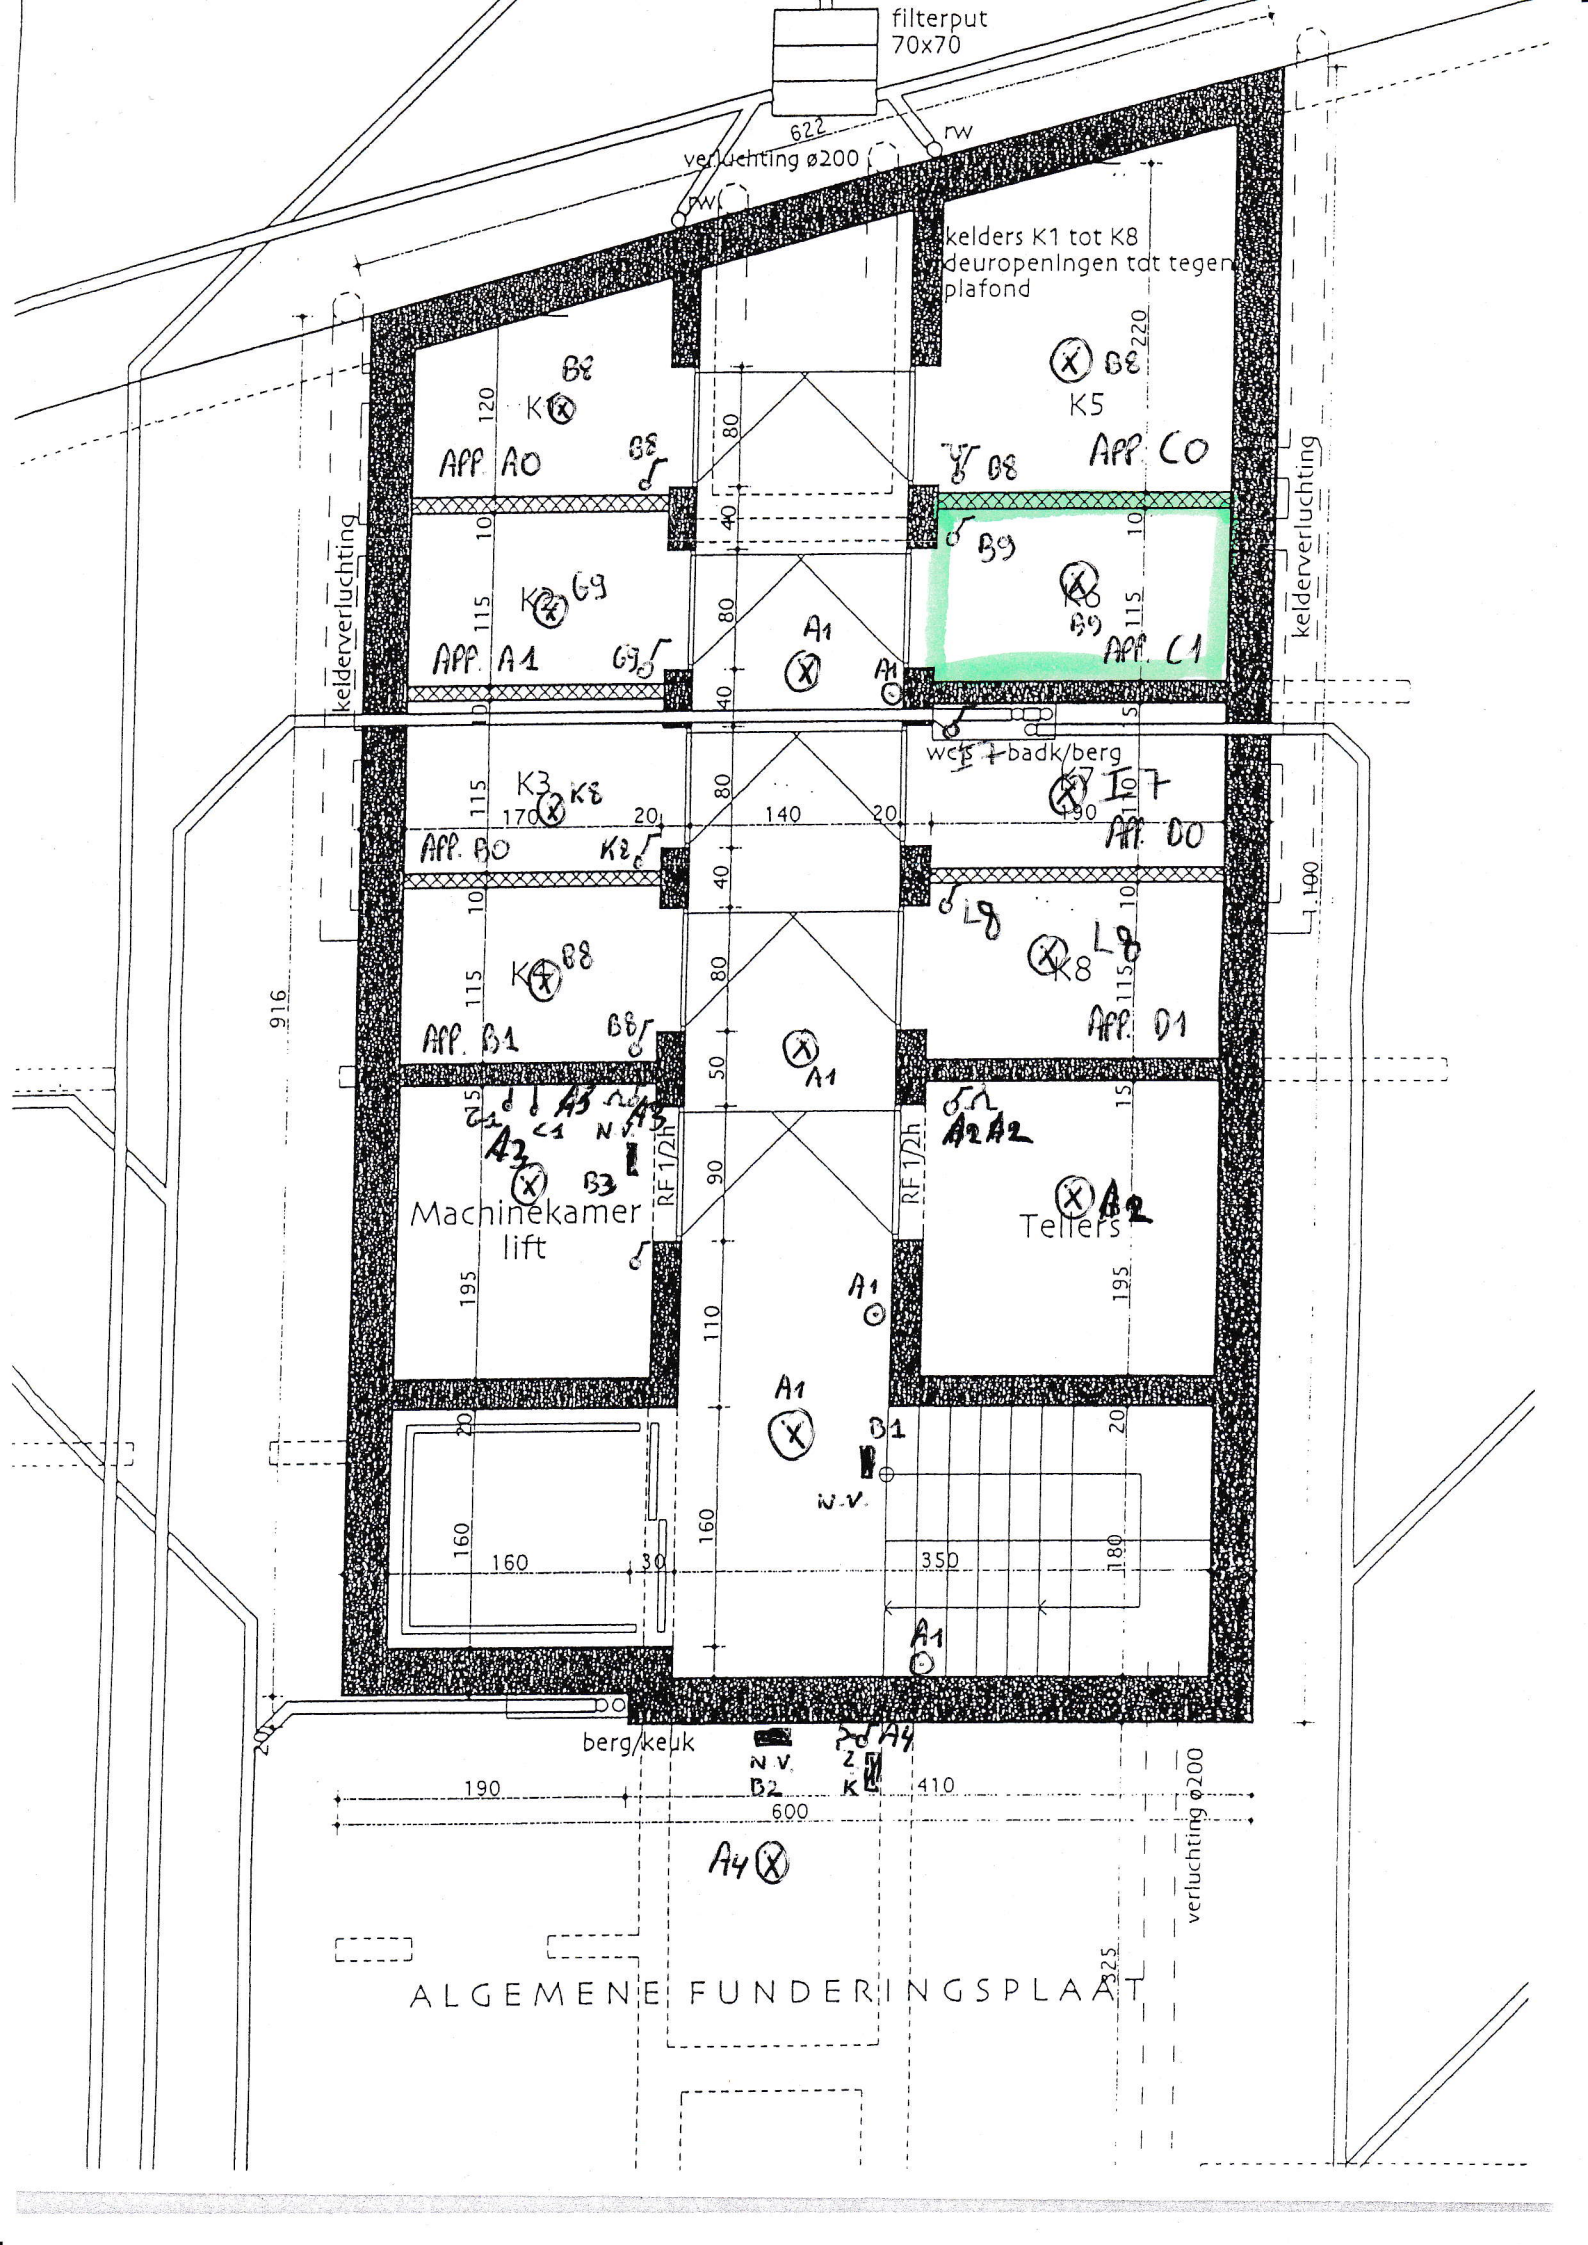
filterput
70x70
622
verluchting ø200
rw
rw
kelders K1 tot K8
deuropeningen tot tegen
plafond
K5
App C0
App A0
App A1
App C1
App B0
App B1
App D0
App D1
kelderverluchting
kelderverluchting
wc's + badk/berg
Machinekamer
lift
RF 1/2h
RF 1/2h
Tellers
berg/keuk
N.V.
verluchting ø200
ALGEMENE FUNDERINGSPLAAT
