364/111124/06

EAN nr. : .....
Teller nr. : .....
Stand I : ..... II : .....

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	

O.C.B.
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / ~~AREI art. 276~~ / .....
Aanvulling verslag nr. .....
Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Overdracht eigendom~~
Type der lokalen : Appartement B.O
Plaats van onderzoek : Calabrialaan St-Lambrechts-Woluwe Bureel
Eigendom van : Vandenbroeke
Opdrachtgever : Main Technics Fochtmanweg 122 2550 Kontich
Installateur : Main Technics
BTW : ..... ID-kaart : ..... Uitgereikt te : ..... Datum : .....
Onderzoeker : Cordens Datum van onderzoek : 24/11/2011

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ ~~2 x 380 V + N~~ Max. Beveiliging : 60 Omschakelaar: stand : .....
Hoofdbeveiliging : Zek. : 60 Schak. : .....
Meter-bordverbinding : kabeltype : XVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 16 mm²
Voedingsbekabeling : kabeltype : ..... aantal geleiders : ..... doorsnede : ..... mm²
~~Bovengronds net/ondergronds net~~/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/~~niet geplaatst~~ - Isolatieplaat : aanwezig/~~niet aanwezig~~
Aardelektrode : Type : lus / ~~staven / pennen / horizontale~~ geleiders Sectie : 35 mm² Spreidingswaarde : 0,23 Ω
Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 13 Algemene isolatieweerstand : > 10 MΩ
Diff. schak. : algemene : 2p 40 A / 300 mA bijkomende : 2p 40 A / 30 mA
werking testknop : ~~in orde - niet in orde~~ controle foutlus : in orde - niet in orde
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~neen~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - ~~niet in orde~~
Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~
Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - ~~niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde
Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :

zie bijhorende schemas

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I)

N	Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.
N	Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Geen

BESLUIT

voor de directeur,
de onderzoeker

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24/11/2036, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden / ~~blijven indien zonder vertraging werd voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.~~

NOTA ONDERNEMINGEN : krachtens art. 838 1b v/h ARAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.
NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht : 1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie. 2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier. rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en

EENDRAADSSCHEMA 1

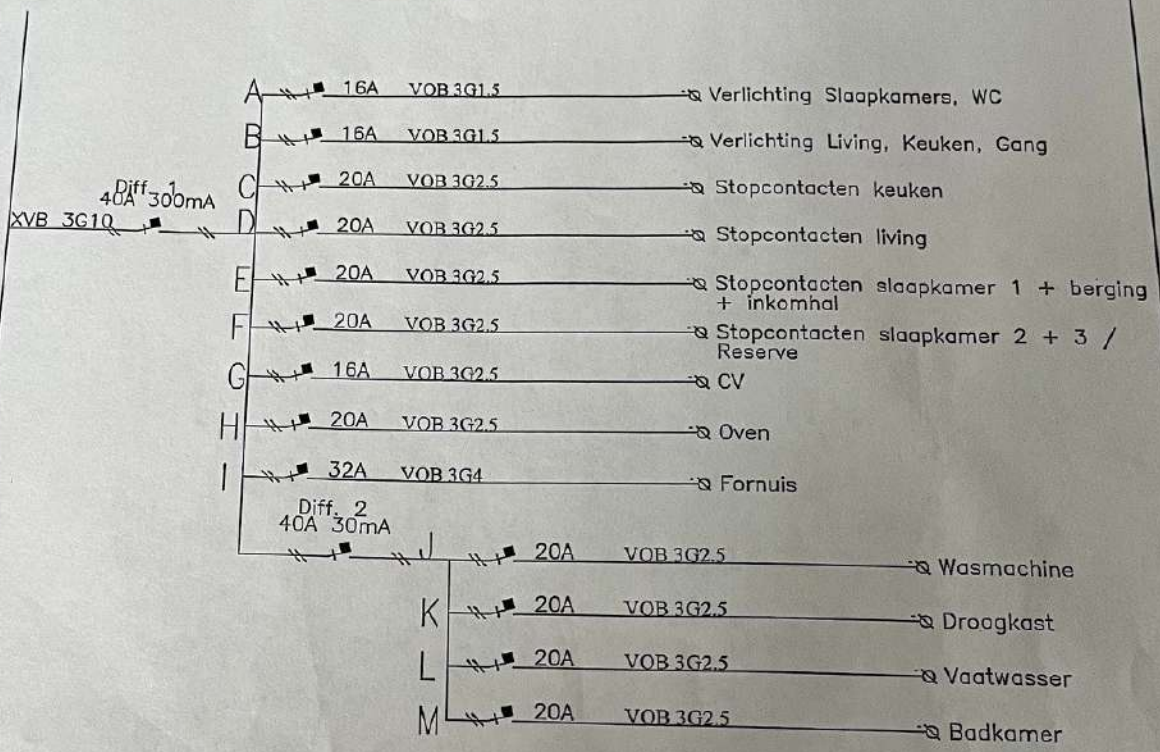

MARIS

Lochtemanweg 122
3550 HEUSDEN-ZOLDER
Tel.:(+32)011/432240
Fax:(+32)011/436830
www.marisgroup.eu

Calabria BO

Datum : 05/05/2009
