081/244240

AIB-VINÇOTTE Belgium, association sans but lucratif
ORGANISME DE CONTROLE AGREE - SERVICE EXTERNE POUR LES CONTROLES SUR LE LIEU DE TRAVAIL
Siège social: Diamant Building, Boulevard A. Reyers, 80, 1030 Bruxelles
Tél.: 02 674 57 11 - Fax: 02 674 59 59 - Télex: 23166

AIB VINÇOTTE BELGIUM

☐ AV Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11
☐ AV Brabant : Tél.: 02 674 57 11
☐ AV Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11
☒ AV Wallonie : Tél.: 081 432 611

Code PC Résí. ☐
☐

Personnes responsables de l'exécution du travail:
Nom, Prénom: .....
N° de TVA: .....
ou n° de la carte d'identité: .....
Distributeur: .....

Compteur: n°: ..... index: .....
Type de comptage: ☐ jour - ☐ bihoraire - ☐ nuit - .....

RAPPORT n .....
Membre n°: .....
Installation .....
Adresse: .....
Date de visite: 03-12-04
Propriétaire ou Mandataire: Tél.: .....
Nom, Prénom: .....
Adresse: .....
Demandeur: .....

Type de visite: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 RGIE Nature de l'installation: ☒ Nouvelle ☐ Extension ☐ Modifi. ☐ Existante ☐ Temporaire
Contrôle sur base des prescriptions du: ☒ RGIE: art. ~~☒ 86~~ ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ RGPT ☐ .....
Installation conçue pour la tension de 230 V, AC, Protection branchement: ..... A Type: .....
Description du branchement: ..... Type câble: ..... Section: ..... x ..... mm²
Alimentation tableau principal: ..... x ..... mm² Nbre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 38
Type de prise de terre: Boucle Résistance de dispersion: 10,2 Ohms Isolement général: 10 M Ohms

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport

Voir Schema		

INFRACTIONS (voir la signification des numéros au verso):

Néant

Le différentiel général était - a été - plombé
L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 12-2029 ainsi qu'avant la mise en service de modifications ou extensions importantes telles que l'ajout d'un circuit.

Conclusion:
LA NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE - EST - ~~N'EST PAS~~ - CONFORME AUX PRESCRIPTIONS REPRISES CI-DESSUS.
L'INSTALLATION - ~~ETAIT~~ - PEUT ETRE - ~~NE PEUT PAS ETRE~~ - MISE SOUS TENSION

PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

INFRACTIONS sur la partie existante (voir la signification des numéros au verso):

Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le .....
Conformément à l'art. 274 de RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service

Annexes: .....
VISA DU DISTRIBUTEUR:

Pour le Directeur général
Nom, N° Agent, Signature
A Hansoul 054

15 001 0 1 15

INFRACTIONS CODIFIEES

A. ISOLATION

☐ 1. L'isolement de chaque circuit, exprimé en ohms, est à porter à une valeur supérieure à 1.000 fois la tension nominale entre conducteurs actifs exprimés en volts (sauf pour les circuits alimentant des lieux humides ou avec vapeurs corrosives).
☐ 2. L'isolement général inférieur à 0,025 Mohms est à ramener à une valeur supérieure à cette valeur.

B. PRISE DE TERRE [(*) J/V = couleur de l'isolation de l'âme jaune/vert]

☐ 3. La résistance de dispersion de la prise de terre et à ramener à max. 30 ohms.
☐ 4. La résistance de terre est supérieure à 10 ohms et il n'y a ni, au min., deux piquets en parallèle, ni différentiel de sensibilité adaptée.
☐ 5. La résistance de dispersion de la prise de terre est trop élevée par rapport à la sensibilité du différentiel installé (installation non domestique).
☐ 6. Absence de boucle de terre à fond de fouille. Une dérogation est à demander au Ministère des Affaires Economiques, Administration de l'Energie, Division des Equipements et des Produits Energétiques, North Gate III, Bd E. Jacqmain 154, 1000 Bruxelles.
☐ 7. Absence de prise de terre.
☐ 8. Mise à la terre réalisée au moyen des canalisations d'eau et/ou de gaz: prévoir un ou des piquets de terre.
☐ 9. Entre piquet(s) et coupe-terre, la section du conducteur de terre n'est pas en 16 mm² J/V.(*)
☐ 10. Les conducteurs de protection, et/ou d'équipotentialité, ne sont pas soudés ou assujettis par vis de pression.
☐ 11. Placer, côté amont de la barrette de sectionnement, le conducteur de terre et, côté aval, les conducteurs de protection des récepteurs.
☐ 12. Absence de barrette de sectionnement.
☐ 13. Barrette de sectionnement non aisément accessible.

C. LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

☐ 14. Absence de liaison équipotentielle principale (eau-gaz-chauffage aller-retour...) ou réalisation de façon incomplète.
☐ 15. La section du (des) conducteur(s) d'équipotentialité principal(aux) n'est pas au min. de 6 mm² J/V.(*)
☐ 16. Absence de liaison équipotentielle supplémentaire en salle de bains ou réalisation incomplète.
☐ 17. La section du (des) conducteur(s) d'équipotentialité supplémentaire(s) n'est pas au min. de 4 mm² J/V(*) (ou 2,5 mm² J/V(*) sous tube).
☐ 18. Liaisons équipotentielles: sections inadaptées et/ou code de couleurs non respecté et/ou continuité non assurée.

D. DIFFERENTIEL

☐ 19. Absence de différentiel général plombable à l'origine de l'installation.
☐ 20. Le différentiel général doit avoir un courant nominal (In) de 40 A min.
☐ 21. Différentiel d'intensité nominale non adaptée au courant d'emploi.
☐ 22. Absence de différentiel(s) distinct(s) de max. 30 mA pour salle de bains et/ou salle de douches et/ou machine à laver et/ou lave-vaisselle et/ou séchoir.
☐ 23. Le différentiel général est à placer à l'origine de l'installation afin de protéger les canalisations de classe I (XFVB/VFVB/EVAVB).
☐ 24. La liaison entre le différentiel et les disjoncteurs ou fusibles en aval est à réaliser par conducteurs rigides.

E. SCHEMAS

☐ 25. Schéma unifilaire et/ou de position non présenté(s) et/ou ne correspondant pas à la réalité et/ou incomplet(s).
☐ 26. Renseigner sur les plans et schémas de position les coordonnées de l'électricien, du propriétaire ainsi que l'adresse de l'installation.

F. TABLEAU ELECTRIQUE

☐ 27. Repérage des circuits: inexistant, incomplet ou incorrect.
☐ 28. Le(s) repérage(s) chiffre(s)/lettre(s) ne correspond(ent) pas/plus à la réalité à celui (ceux) du (des) schéma(s)/plan(s).
☐ 29. Absence d'indication(s) - "Tension(s) de service", etc.
☐ 30. Le tableau n'est pas placé à environ 1,50 m au-dessus du sol.
☐ 31. Tableau non facilement accessible.
☐ 32. Tableau n'offrant pas un degré de protection suffisant contre le contact direct.
☐ 33. Le tableau n'est pas équipé d'une paroi arrière.
☐ 34. Les pièces nues sous tension ne sont pas protégées.
☐ 35. Les ouvertures non utilisées situées au niveau tableau et/ou coffret et/ou boîte sont à obturer.
☐ 36. Il n'y a pas de dispositif de coupure générale multipolaire.
☐ 37. Les bases des fusibles ou disjoncteurs ne sont pas équipées d'éléments de calibrage.
☐ 38. Le code de couleurs des éléments de calibrage n'est pas respecté.
☐ 39. Fusible(s) et/ou disjoncteur(s) fraudé(s) et/ou d'intensité nominale non adaptée à la section des canalisations protégées.
☐ 40. Les canalisations électriques dont la section des conducteurs est inférieure à 1 mm² sont à éliminer ou à remplacer.
☐ 41. Les canalisations électriques dont la section des conducteurs est de 1 mm² sont à protéger par des fusibles de 6 A ou des automates de 10 A max.
☐ 42. Départ(s) repiqué(s) sur plusieurs circuits.
☐ 43. Sur les circuits triphasés, éliminer le fusible ou disjoncteur unipolaire placé sur le neutre.
☐ 44. Pour le raccordement de cuisinières électriques, machines à laver, etc., prévoir soit:
- du 6 mm² en mono ou du 4 mm² en tri en encastré;
- du 2,5 mm² sous tube d'1 pouce en encastré;
- un tube de réserve qui jouxte le tube d'alimentation;
- soit du 2,5 mm² si le circuit est réalisé en montage apparent sur toute sa longueur.

☐ 45. Il n'y a pas au min. 2 circuits d'éclairage.
☐ 46. Le matériel (disjoncteurs, contacteurs...) n'est pas mis en œuvre suivant les impositions du fabricant.
☐ 47. Circuit(s) prise(s) non réalisé(s) en 2,5 mm².
☐ 48. Circuit(s) mixte(s) éclairage - prise(s) non réalisé(s) en 2,5 mm².
☐ 49. Présence d'un différentiel de 30 mA alimentant deux ou plusieurs circuits comportant ensemble plus de 16 socles de prises.

G. CONDUCTEUR DE PROTECTION

☐ 50. Le conducteur de protection n'est pas distribué dans toute l'installation.
☐ 51. La section du (des) conducteur(s) "apparent(s)" de protection n'est pas au min. de 4 mm² J/V(*) (ou 2,5 mm² J/V(*) sous tube).
☐ 52. La continuité de la mise à la terre du (des) conducteur(s) de protection n'est pas assurée.
☐ 53. Les appareils mobiles et/ou portatifs à enveloppe conductrice (classe I) sont à raccorder sur une prise avec contact de terre.
☐ 54. Le contact de terre de la prise n'est pas raccordé.

H. CODE COULEURS ET CANALISATIONS

☐ 55. Le code de couleurs n'est pas respecté.
☐ 56. Le conducteur isolé jaune/vert est utilisé comme conducteur actif.
☐ 57. Lorsque le conducteur bleu est distribué, il y a lieu de réserver celui-ci exclusivement au neutre.
☐ 58. Les canalisations ne sont pas fixées au moyen d'attaches adaptées et/ou correctement protégées aux endroits exposés à des dégradations mécaniques.
☐ 59. Le câble VVB/CGVB/XVB et/ou le tube PVC n'est (ne sont) pas protégé(s) aux endroits exposés, jusqu'à 10 cm au dessus du niveau du sol.
☐ 60.
☐ 61. Les parcours privilégiés pour VVB noyés dans les murs des locaux ne sont pas respectés.
☐ 62. Il est fait usage de fiche(s) sur câble(s) rigide(s).
☐ 63. Il est fait usage de conducteurs type VOB dans des tubes TAL.
☐ 64.
☐ 65. Les canalisations non utilisées ne sont pas éliminées ou isolées à leurs extrémités.
☐ 66. Les canalisations hors d'usage sont à supprimer.
☐ 67. Les canalisations électriques sont placées à moins de 3 cm d'autres canalisations.

I. APPAREILLAGE

☐ 68. Boîte(s) de dérivation à fermer et/ou à refermer.
☐ 69. Supprimer tous les raccords volants.
☐ 70. Les interrupteurs placés dans les salles de bains ou de douches doivent être bipolaires.
☐ 71. L'interrupteur doit couper la phase et non le neutre.
☐ 72. Tout interrupteur commandant une prise de courant doit être bipolaire.
☐ 73. Les interrupteurs et socles de prises encastrés dans des parois sont à loger sous boîte ou blochet.
☐ 74. Les prises de courant doivent être CEBEC, du type sécurité enfant et avec contact de terre.
☐ 75. Le matériel utilisé doit porter le label de conformité d'un laboratoire européen agréé.
☐ 76. Les prises fixées aux parois ne sont pas placées à une hauteur suffisante vis-à-vis du sol (axe des alvéoles à 25 cm de hauteur dans les locaux humides, 15 cm en locaux secs).
☐ 77. Interrupteur, prise de courant ou boîte de dérivation à reconditionner et/ou refixer.
☐ 78. Le matériel placé n'est pas choisi en fonction des influences externes.
☐ 79. Le degré de protection du matériel installé n'est pas IPX4.
☐ 80. Le degré de protection du matériel électrique placé dans la/les salle(s) de bains n'est pas adapté au volume dans lequel il est installé.
☐ 81. Emploi d'appareils de classe 0.
☐ 82. Les appareils de chauffage électrique à poste fixe ne sont pas installés.
☐ 83. Les caractéristiques essentielles et/ou la marque ne figure(nt) pas sur l'appareil ou ne nous sont pas communiquées.
☐ 84. Les transfos ne sont pas certifiés être du type transfos de sécurité, les règles visant la B.T. sont donc applicables à l'installation située sur le secondaire du transfo.

J. PROTECTION INCENDIE

☐ 85. Prévoir une protection ou solution équivalente contre les surcharges au secondaire des transfos.
☐ 86. Les transfos sont placés dans un environnement où la température ambiante dépasse la température maximale autorisée.
☐ 87. Risque d'incendie, appareil placé à proximité de matériaux inflammables.

63A

A — Δ300mA

L1-N-PE

230V+PE

20A	A	H, 5 points — Eclairage et prises grenier + sonnette
20A	B	7 points — Eclairage et prises chambre 1
20A	C	8 points — Eclairage et prises chambre 2
20A	D	6 points — Eclairage et prises chambre 3
20A	E	8 points — Eclairage et prises chambre 4
20A	F	7 points (4x) — Eclairage et prises hall de nuit
20A	G	8 points — Eclairage et prises vestiaire, éclairage WC et prises buanderie
16A	I	11 points (4x, 4x, 8x, 8x, 7x) — Eclairage hall, bureau, repas, salon, cuisine, buanderie et extérieurs
20A	J	3 points — Prises hall d'entrée
20A	K	7 points — Prises bureau
20A	L	5 points — Prises bureau
20A	M	5 points — Prises repas
20A	N	6 points — Prises extérieures
20A	O	7 points — Eclairage et prises plan de travail cuisine
20A	P	1 point — Four
20A	Q	1 point — M.O.

Feuille 2

Disjoncteur
Interrupteur
C Ampli TV Contacteur
JL Télérupteur
sim. 2D bip. inv. prise

AIB-VINCOTTE BELGIUM
Albert HANSOUL
0547

Tension de service 230V+N

Coffret Habitation

3640/GC

Balleau i.e. s.a.
rue Hector Denis, 33
4420 MONTEGNEE
Tél: 04 239 68 90
Fax: 04 263 19 73

Dessiné:M.DIDDEN | Date: 01-12-04

Feuille 1 de 3 | Plan 5.09.057

Feuille 1

L1-N-PE

230V+PE

- A — 32A — R — Cuisinière
- A — 20A — S — Alimentation cassette salon
- A — 16A — T — Alimentation alarme
- A — 20A — U — Pompe en cave 6
- A — 20A — V — Dégraisseur en cave 6
- A — 20A — W — Groupe hydro en chaufferie
- A — 6A — X — Alimentation chaudière
- A — 20A — Y — Eclairage et prises chaufferie (1 2 3 4 5 6)
- A — 20A — Z — Eclairage et prises cave 1 (1 2 3 4 5 6 7)
- A — 20A — AA — Eclairage et prises caves 2 et 3 (1 2 3 4 5 6)
- A — 20A — AB — Eclairage et prises caves 2 et 3 (1 2 3 4)
- A — 20A — AC — Eclairage et prises cave 5 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)
- A — 20A — AD — Eclairage et prises cave 6 (1 2 3 4 5 6)
- A — 20A — AE — Eclairage jardin + abri de jardin (1 2 3 4 5 6)

Feuille 3

Disjoncteur
Interrupteur
C Ampli TV
C Contacteur
JL Télérupteur
sim. 2D bip. inv. prise

Tension de service 230V+N

Coffret Habititation

3640/GC

Balteau i.e. s.a.
rue Hector Denis, 33
4420 MONTEGNEE
Tél: 04 239 68 90
Fax: 04 263 19 73

Dessiné:M.DIDDEN | Date: 01-12-04

Feuille 2 de 3 | Plan 5.09.057

Feuille 2

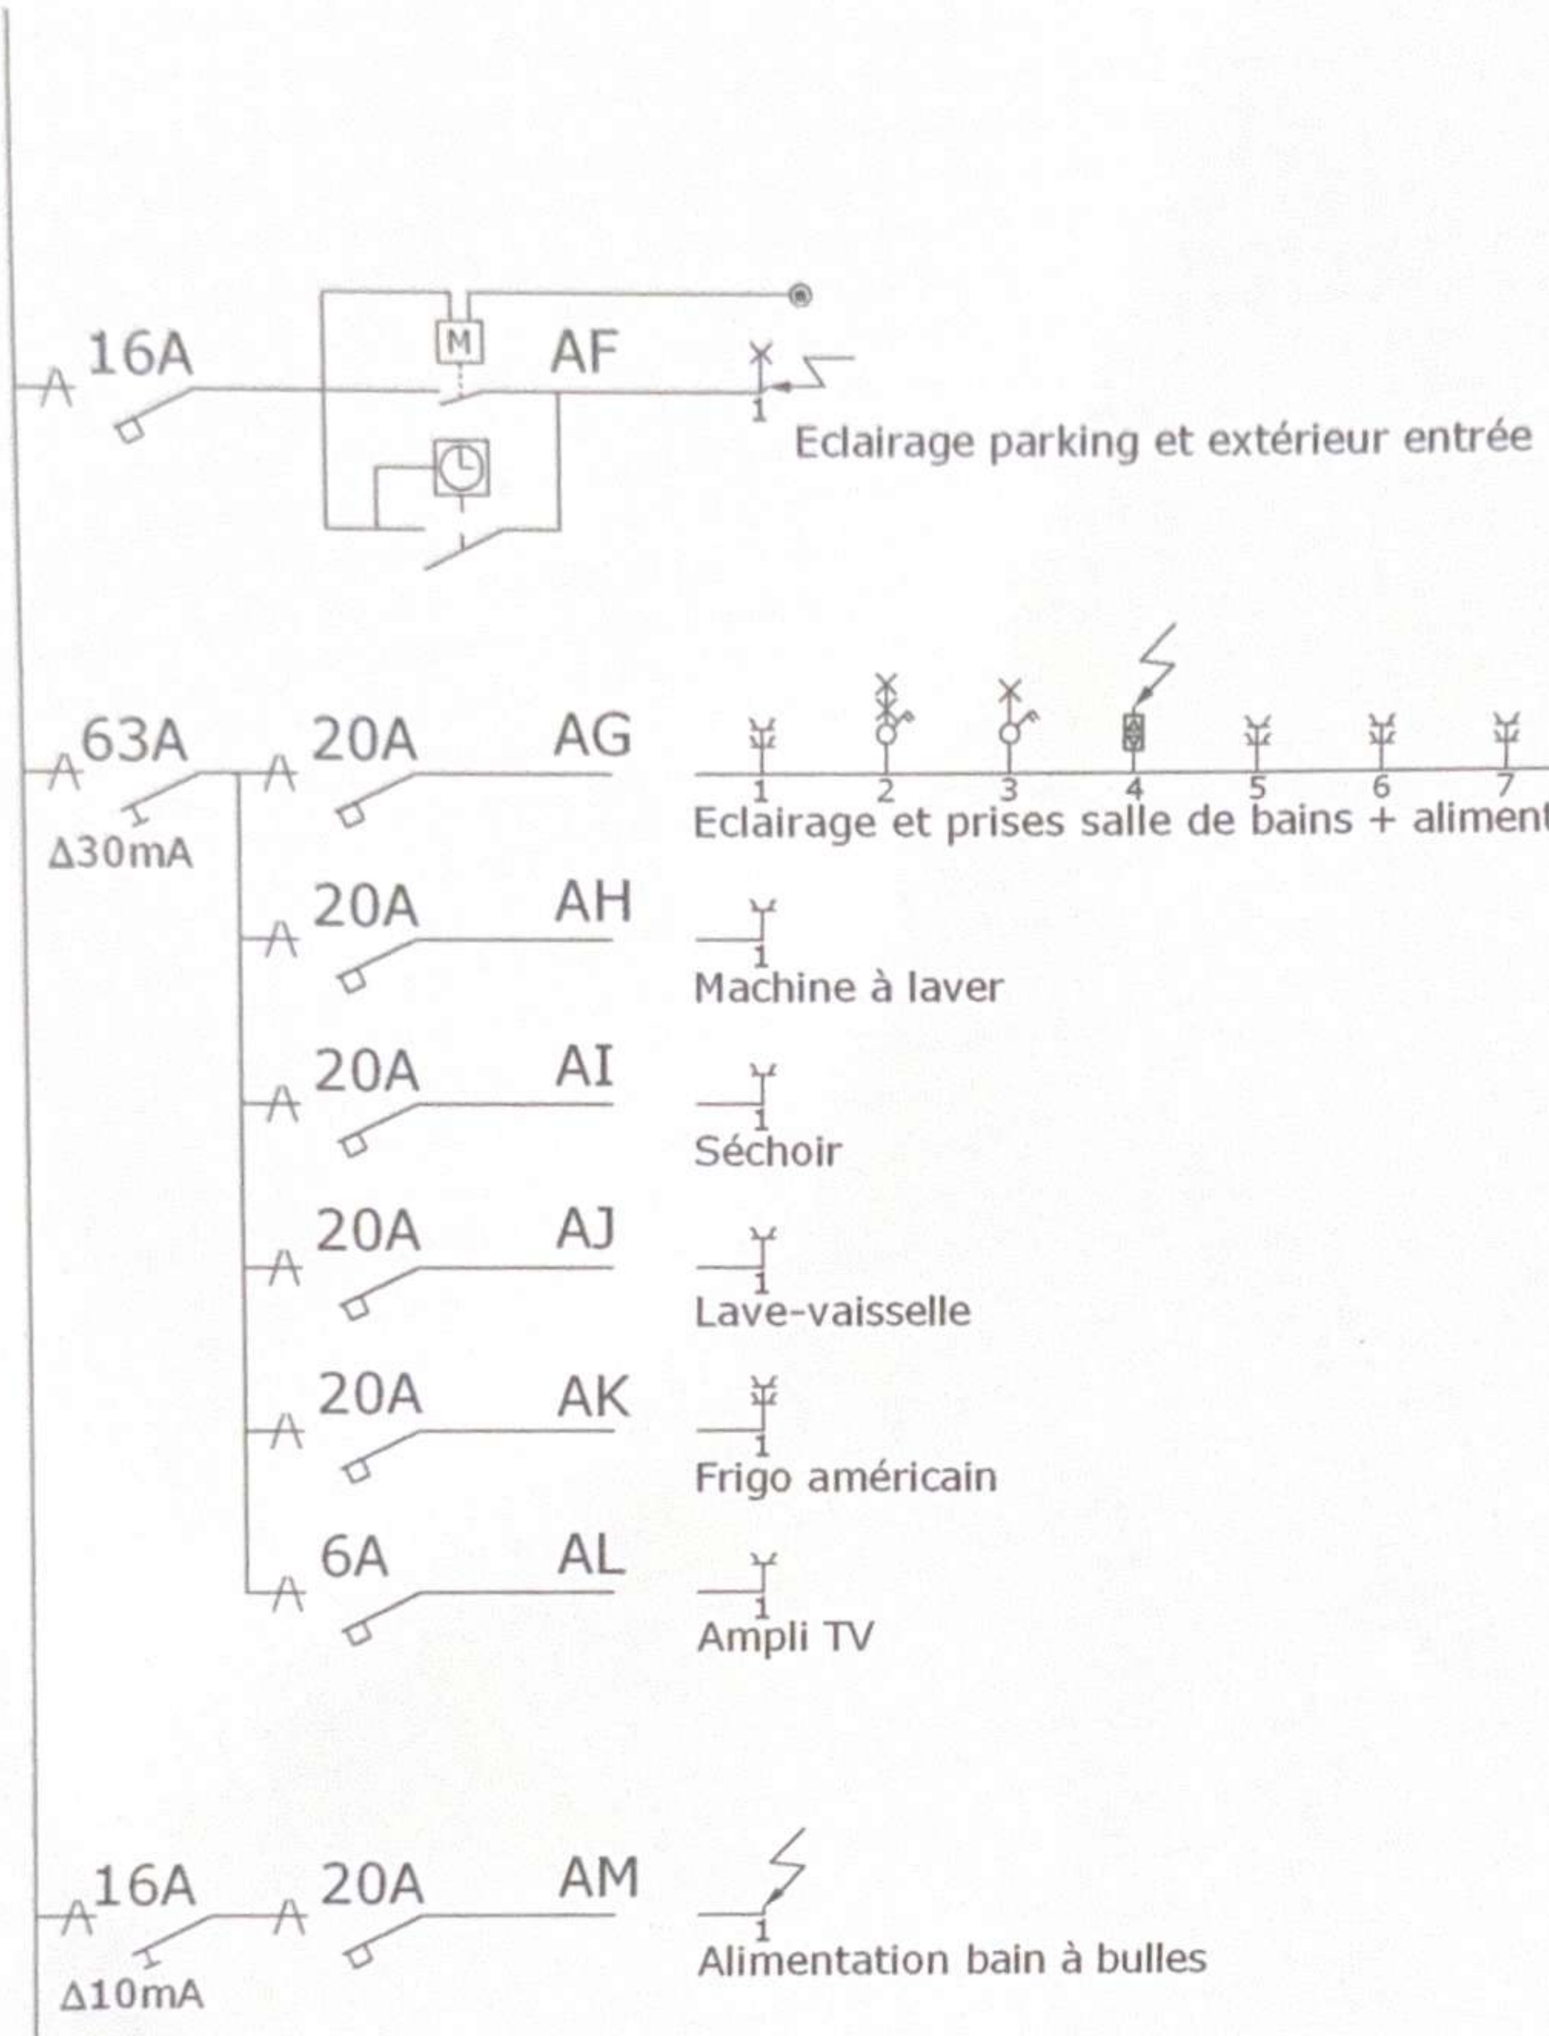

Disjoncteur
Interrupteur
C Ampli TV Contacteur
JL Télérupteur
sim. 2D bip. inv. prise

Tension de service 230V+N

Coffret Habitation

3640/GC

Balleau i.e. s.a.
rue Hector Denis, 33
4420 MONTEGNEE
Tél: 04 239 68 90
Fax: 04 263 19 73

Dessiné:M.DIDDEN | Date: 01-12-04

Feuille 3 de 3 | Plan 5.09.057

63A

A — Δ300mA

L1-N-PE

- A — 20A — A — H — 1 2 3 4 5 — Eclairage et prises grenier + sonnette
- A — 20A — B — 1 2 3 4 5 6 7 — Eclairage et prises chambre 1
- A — 20A — C — 1 2 3 4 5 6 7 8 — Eclairage et prises chambre 2
- A — 20A — D — 1 2 3 4 5 6 — Eclairage et prises chambre 3
- A — 20A — E — 1 2 3 4 5 6 7 8 — Eclairage et prises chambre 4
- A — 20A — F — 1 2 3 (4x) 4 5 6 7 — Eclairage et prises hall de nuit

230V+PE

- A — 20A — G — 1 2 3 4 5 6 7 8 — Eclairage et prises vestiaire, éclairage WC et prises buanderie
- A — 16A — I — 1 2 (4x) 3 (4x) 4 (6x) 5 6 7 (8x) 8 (7x) 9 10 11 — Eclairage hall, bureau, repas, salon, cuisine, buanderie et extérieurs
- A — 20A — J — 1 2 3 — Prises hall d'entrée
- A — 20A — K — 1 2 3 4 5 6 7 — Prises bureau
- A — 20A — L — 1 2 3 4 5 — Prises bureau
- A — 20A — M — 1 2 3 4 5 — Prises repas
- A — 20A — N — 1 2 3 4 5 6 — Prises extérieures
- A — 20A — O — 1 2 3 4 5 6 7 — Eclairage et prises plan de travail cuisine
- A — 20A — P — Four
- A — 20A — Q — M.O.

Feuille 2

Disjoncteur — Interrupteur — Ampli TV — Contacteur — Télérupteur — sim. — 2D — bip. — inv. — prise

Tension de service 230V+N

Coffret Habitation

3640/GC

Balleau i.e. s.a.
rue Hector Denis, 33
4420 MONTEGNEE
Tél: 04 239 68 90
Fax: 04 263 19 73

Dessiné: M.DIDDEN | Date: 01-12-04

Feuille 1 de 3 | Plan 5.09.057

Feuille 1

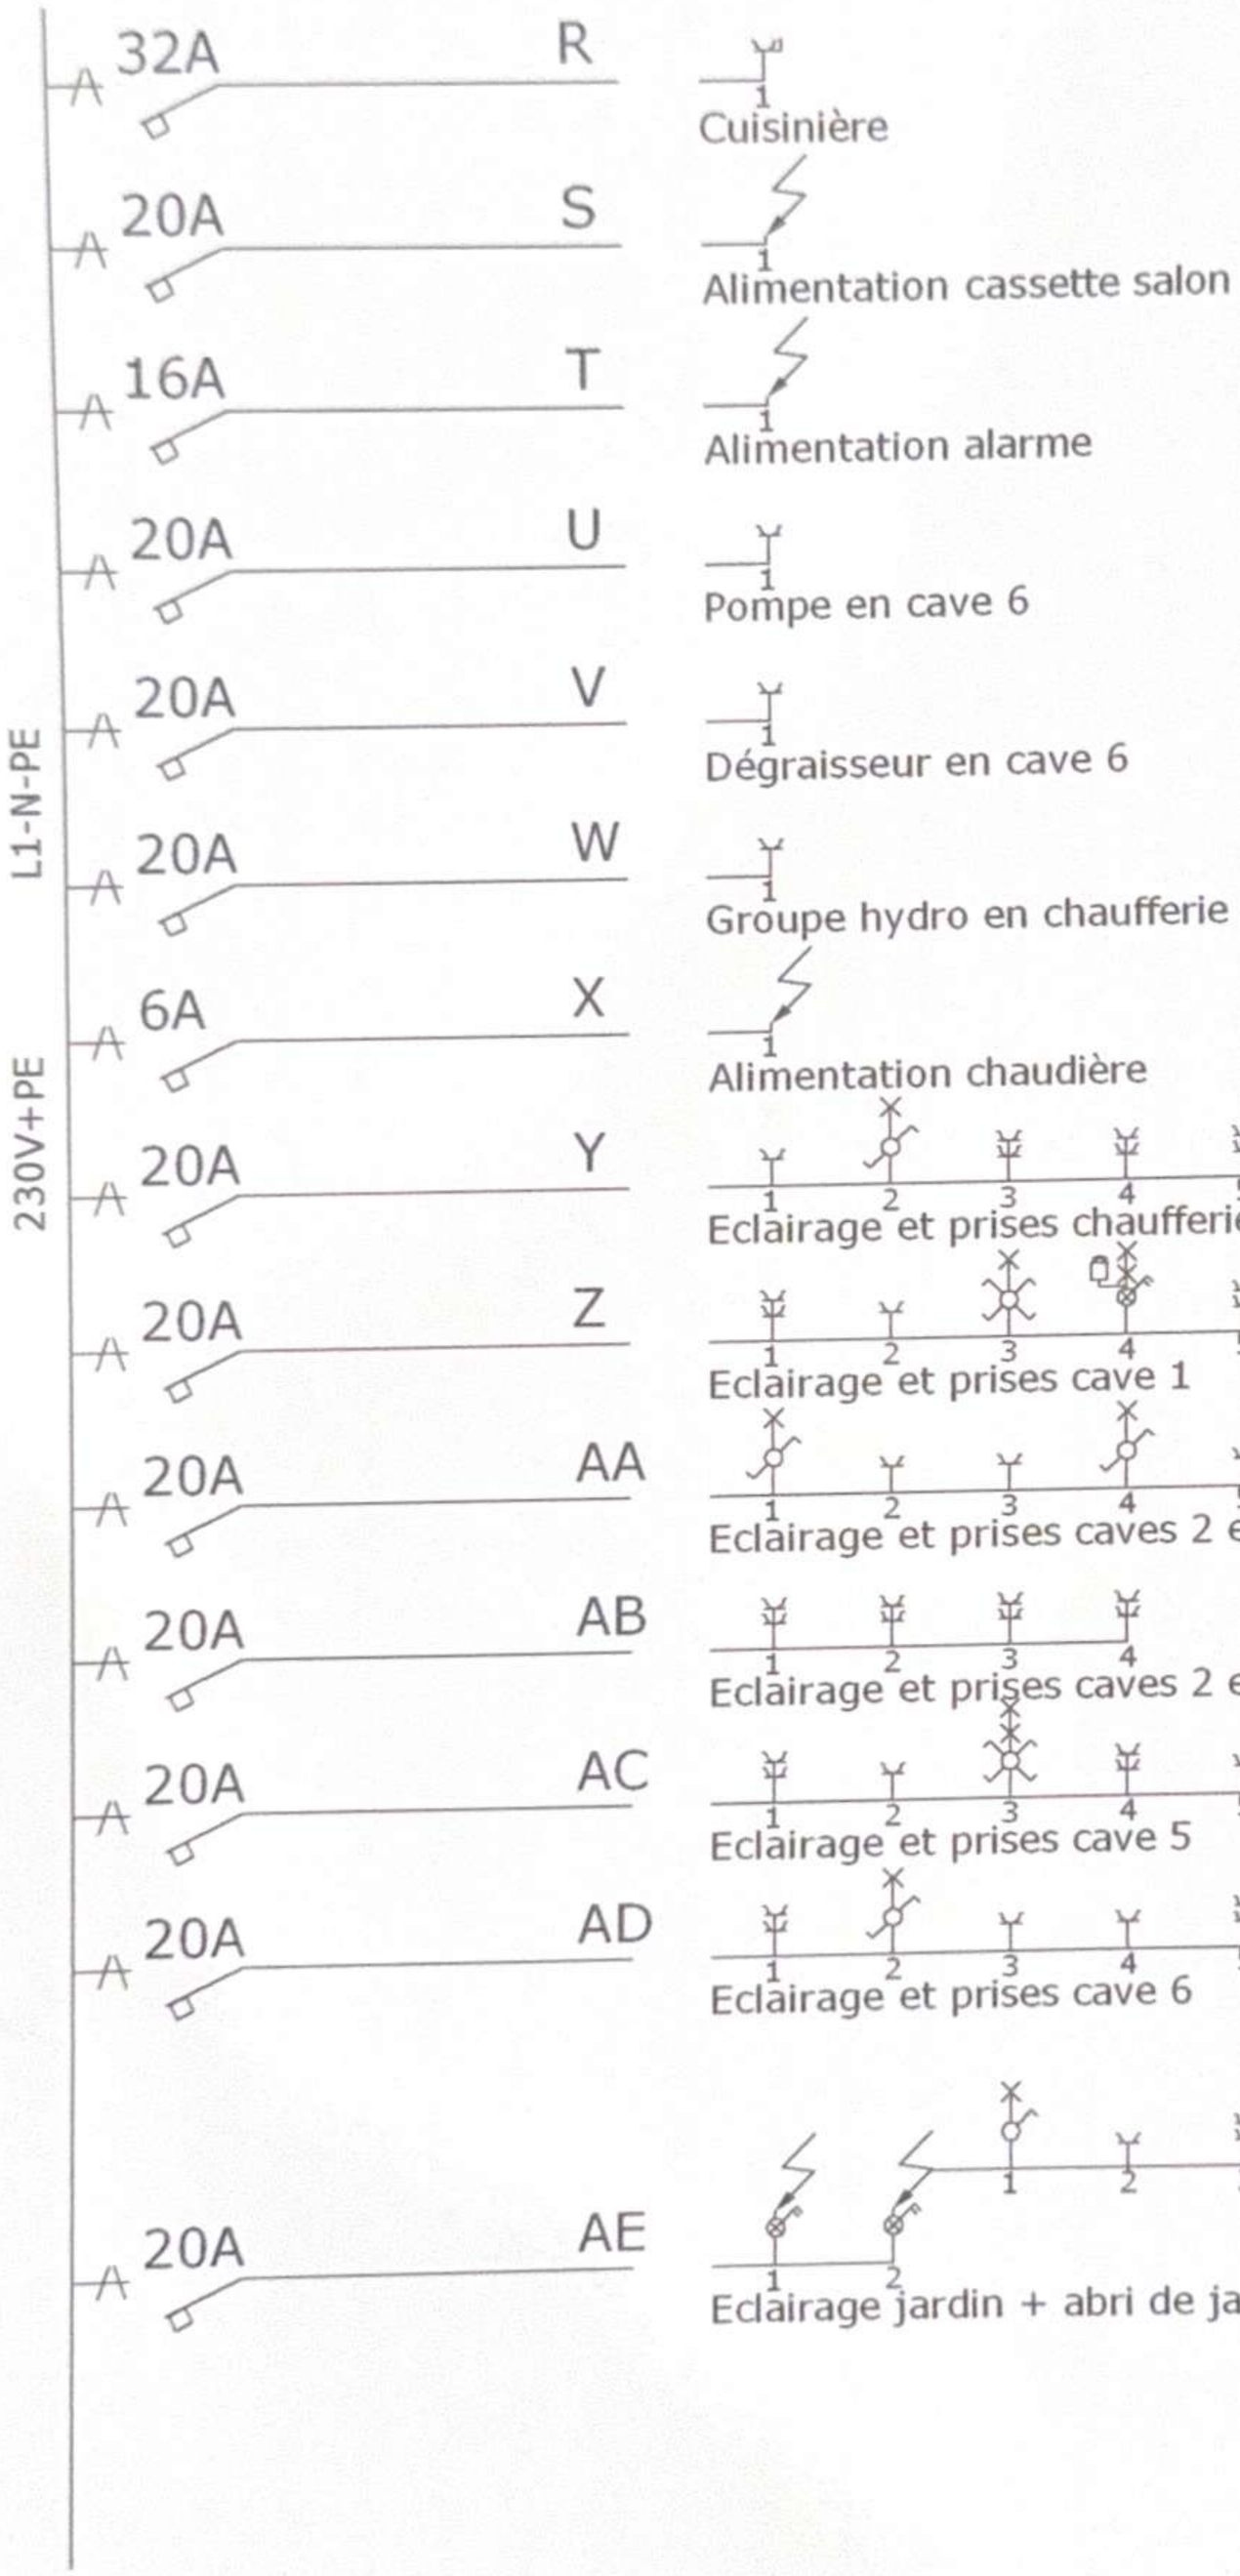

Feuille 3

Disjoncteur
Interrupteur
Ampli TV
Contacteur
Télérupteur
sim. 2D bip. inv. prise

Tension de service 230V+N

Coffret Habitation

3640/GC

Balleau i.e. s.a.
rue Hector Denis, 33
4420 MONTEGNEE
Tél: 04 239 68 90
Fax: 04 263 19 73

Dessiné:M.DIDDEN

Date: 01-12-04

Feuille 2 de 3 | Plan 5.09.057

Feuille 2

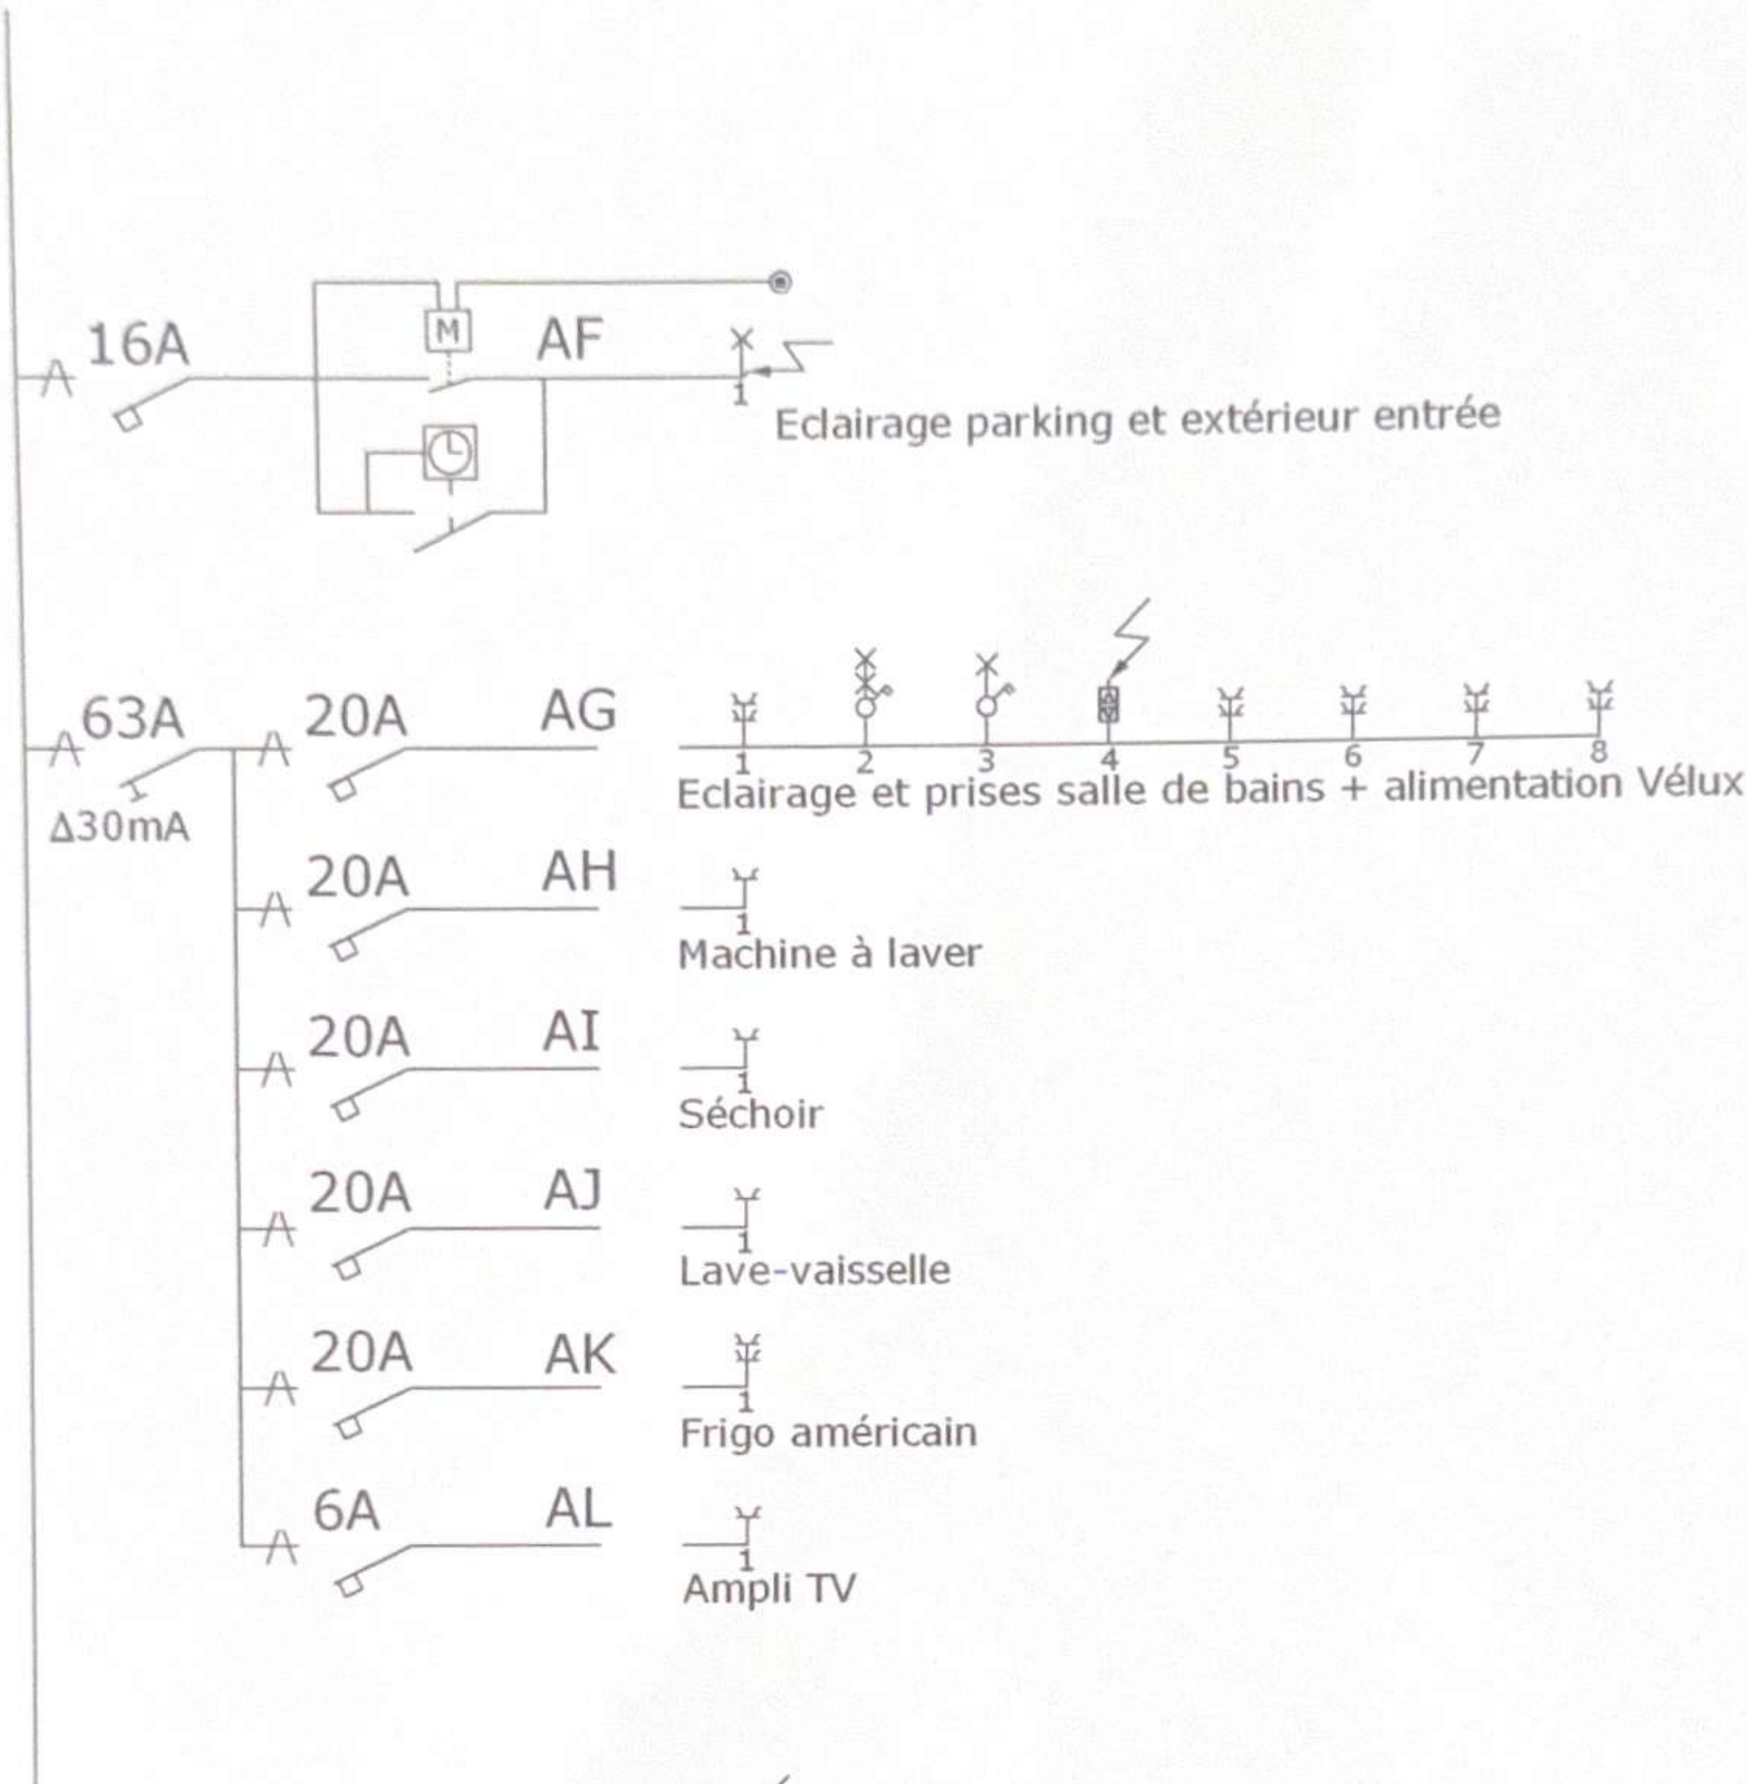

Tension de service 230V+N

Coffret Habititation

Disjoncteur
Interrupteur
C Contacteur
JL Télérupteur
Ampli TV
sim. 2D bip. inv. prise

Balteau i.e. s.a.
rue Hector Denis, 33
4420 MONTEGNEE
Tél: 04 239 68 90
Fax: 04 263 19 73

3640/GC

Dessiné:M.DIDDEN | Date: 01-12-04

Feuille 3 de 3 | Plan 5.09.057
